

监 理 通 知 单

工程名称：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-FRTZ-001

致：浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目 总包施工项目部

事由：关于施工现场安全文明施工的问题

内容：现场巡视发现如下施工问题：

- 1、富日轴承新建厂房屋顶施工通道简易，存在严重安全隐患。
- 2、富日轴承新建厂房未搭设吊装平台，且整箱组件直接放置屋面，组件拆箱后未固定。
- 3、上人爬梯未设置防坠器。
- 4、下班后组件未固定，个别组件表面放置工器具。
- 5、女儿墙较低的部位、采光带、未施工区域未进行围护警示。

针对以上问题请总包方收到通知后暂停问题所涉及的工序施工，即刻组织人员整改，三日内整改完毕报监理、业主方复检，复检合格后方可继续施工。未经监理、业主验收合格或拒不整改，我方将签发所有工序工程暂停令。望总包方重视给予配合。

附件：监理通知单问题清单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2022年9月5日


注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件：

监理通知单问题清单

主 送	浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目总包 施工项目部
工 程 名 称	浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目
检 查 日 期	2020 年 08 月 21 日

1、富日轴承新建厂房屋顶施工通道简易，存在安全隐患。

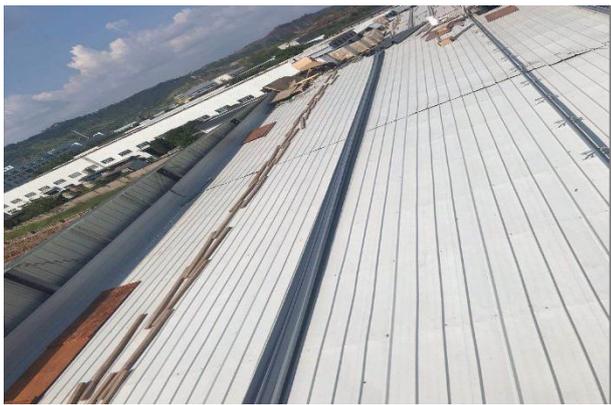

2、富日轴承新建厂房未搭设吊装平台，组件拆箱后未固定。



3、上人爬梯未设置防坠器



4、下班后组件未固定，个别组件表面放置工器具



5、女儿墙较低的部位、采光带、未施工区域未进行围护警示。



针对以上问题请施工项目部接到通知后及时整改，安全问题立即整改。

浙江富日泰轴承有限公司 11.5MWp 分布式光伏发电项目

2020年08月21日
