

监理工程师通知回复单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目编号: SKQN-SKMYGF-TZDHF-01

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 SKQN-SKMYGF-JLTZD-01 的监理工程师通知后, 已按要求完成了
总进度计划和仓库加固工程施工进度计划的编制 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 2 页。

承包单位(章): 
项目经理: 张理松
日期: 2020.9.29

项目监理机构复查意见:

经审查: 所报施工进度计划符合要求, 同意实施。

项目监理机构(章): 
专业/总监理工程师: 王立东
日期: 2020.9.29

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。

苏垦麦芽1.56MW工商业屋顶分布式光伏电站项目仓库加固进度计划

标识号	任务名称	工期	开始时间	完成时间	上旬						
					20 / 9 / 二	09 / 03 / 六	2020 / 09 / 04 / 一	2020 / 10 / 05 / 二	20 / 10 / 06 / 三	20 / 10 / 07 / 四	20 / 11 / 08 / 一
1	仓库加固	27 工作日	2020年9月27日	2020年10月23日							
2	一、开工（业主需协调将仓库内设备、大麦及时清运）	1 工作日	2020年10月18日	2020年10月18日							
3	1.1 加固人员、机械进场	2 工作日	2020年9月27日	2020年9月28日							
4	1.2 A区320根檩条（仓库西南）	7 工作日	2020年9月29日	2020年10月5日							
5	1.3 B区320根檩条（仓库西北）（麦芽厂设备需提前2天清理）	7 工作日	2020年10月6日	2020年10月12日							
6	1.4 C区320根檩条（仓库东北）（仓库内大麦需提前2天清理）	5 工作日	2020年10月13日	2020年10月17日							
7	1.4 D区320根檩条（仓库东南）	6 工作日	2020年10月18日	2020年10月23日							



项目：麦芽1.56MW项目

日期：2020/9/30

任务拆分
摘要
项目摘要
外部任务
外部里程碑
进度
期限

监理工程师通知单


项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目 编号：SKQN-SKMYGF-JLTZD-02

致：协鑫能源工程有限公司苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目部

事由：关于屋面防护栏材料质量事宜

内容：

经检查，屋面防护栏进场材料角钢尺寸规格符合设计要求，但部分材料镀锌层厚度不符合要求，存在透底现象。要求你单位项目部进行更换或补漆措施。不满足要求的材料不得使用。

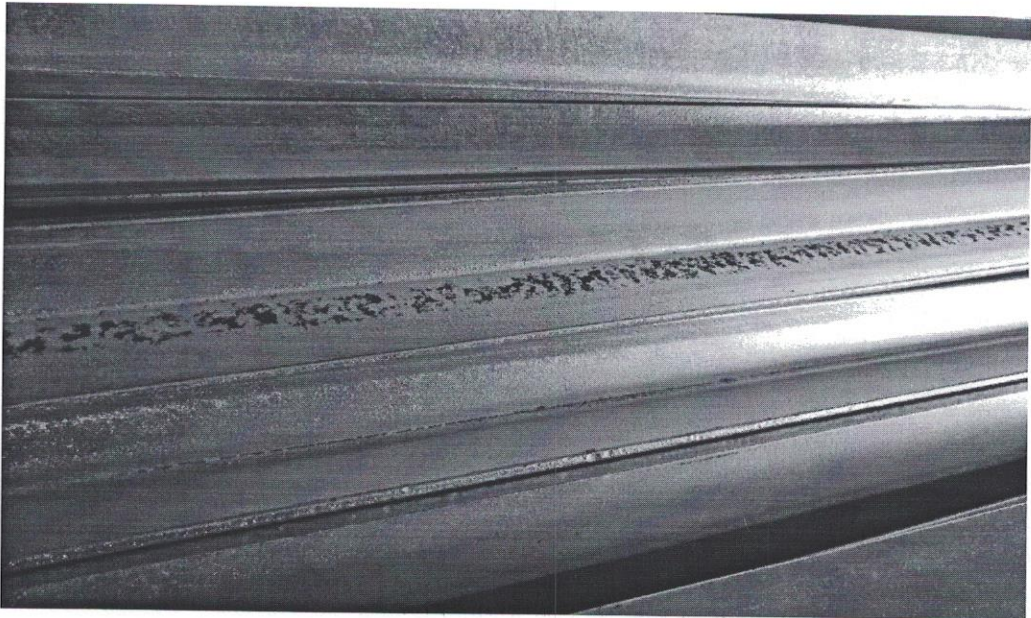

要求 3 日内回复。

项目监理机构（章）：

总 / 专业监理工程师： 王立杰

日 期： 2020.10.08

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份、承包单位存 1 份。

监理工程师通知回复单

项目名称：苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目编号：SKQN-SKMYGF-TZDHF-02

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构：

我方接到编号为 SKQN-SKMYGF-JLTZD-02 的监理工程师通知后，已按要求完成了
对部分镀锌层厚度不满足要求的角钢进行补漆的工作，现报上相关资料，请予以复查。

附：1、回复材料 1 页。



承包单位（章）：
项目经理： 张明
日 期： 2020.10.08


项目监理机构复查意见：

经查：施工单位按要求整改，符合要求，同意使用。



项目监理机构（章）：
专业/总监理工程师： 王立杰
日 期： 2020.10.09

本表一式 3 份，由承包单位填报，建设管理单位存 1 份，项目监理机构存 1 份，承包单位存 1 份。

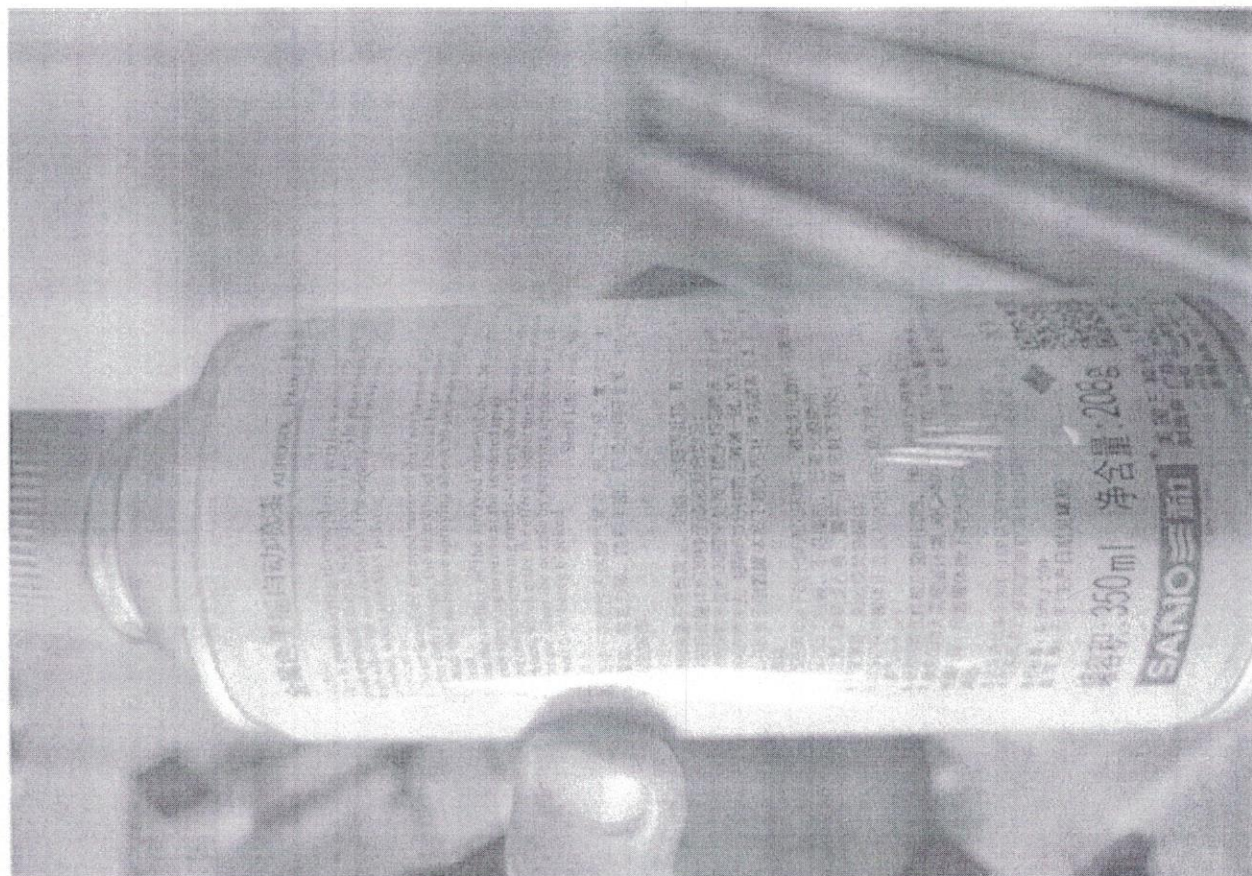


监理工程师通知回复单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目编号: SKQN-SKMYGF-TZDHF-03

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 SKQN-SKMYGF-JLTZD-03 的监理工程师通知后, 已按要求完成了对现场屋面油漆找补的工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 / 页。

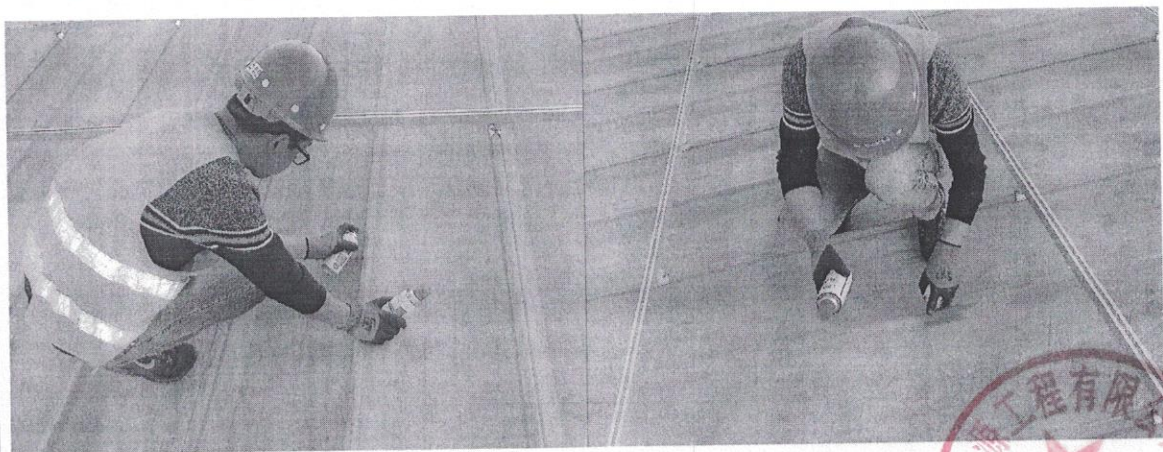

承包单位(章):
项目经理: 张明松
日期: 2020.10.22

项目监理机构复查意见:

经查: 屋面油漆找补工作, 同意下道工序施工

项目监理机构(章):
专业/总监理工程师: 王杰
日期: 2020.10.22

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。

监理工程师通知回复单

项目名称: 苏垦麦芽 1.56MW 工商业屋顶分布式光伏发电项目编号: SKQN-SKMYGF-TZDHF-04

致 常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构:

我方接到编号为 SKQN-SKMYGF-JLTZD-04 的监理工程师通知后, 已按要求完成了重新对施工班组的技术交底, 在现场将加强过程质量检查, 杜绝再出现类似问题 工作, 现报上相关资料, 请予以复查。

附: 1、回复材料 / 页。

承包单位(章):
项目经理: 
日期: 2020.10.24

项目监理机构复查意见:

复查: 施工单位整改后 22 号已整改到位, 现场
管理人员在场监督。

项目监理机构(章):
专业/总监理工程师: 
日期: 2020.10.24

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设管理单位存 1 份, 项目监理机构存 1 份, 承包单位存 1 份。
