

监理通知单

工程名称：振发太阳能科技滨海有限公司增容技改项目

编号：ZFBH-JL-TZD-002

致：上海上电电力工程有限公司（项目部）

事由：

16#区组件成品保护工作不到位

内容：

经现场检查发现，由于今日大风及安装原因导致 16#区北侧第二排西边部分组件边框螺栓孔撕坏，需要重新安装，但现场施工人员将拆下的组件随意胡乱堆放，并用扳手敲击边框，极易引起组件隐裂而影响发电。此野蛮施工及成品保护工作不到位的行为反映出你单位项目部现场管理缺失和交底未落实到现场中。

现要求你单位项目部将该部分受损组件运回站内按要求进行保存，在未经检测合格的情况下不得安装，现场使用新组件进行安装。



监理项目部（章）：_____

总/专业监理工程师：_____

日期：2020年12月13日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理工程师回复单

工程名称: 滨海光伏电站容配比优化改造工程

编号: 002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理单位)

我方接到编号为 ZFBH-JL-TZD-002 的监理工程师通知单后, 已按要求完成了工作, 现报上, 请予以复查。

附件: ☐ 文字回复材料

☒ 照片

☐ 复测数据

☐ 其他资料

承包单位 (章):

技术负责人



日期: 2020.12.14

项目监理单位核验意见:

经查, 电压测试正常, 要求施工单位项目部加强现场管理, 杜绝再出现类似现象。

项目监理单位 (章):


专业监理工程师



日期: 2020.12.15

本表一式 3 份, 由承包单位填报, 建设单位、项目监理单位、承包单位各一份。

未损坏的组件电压:

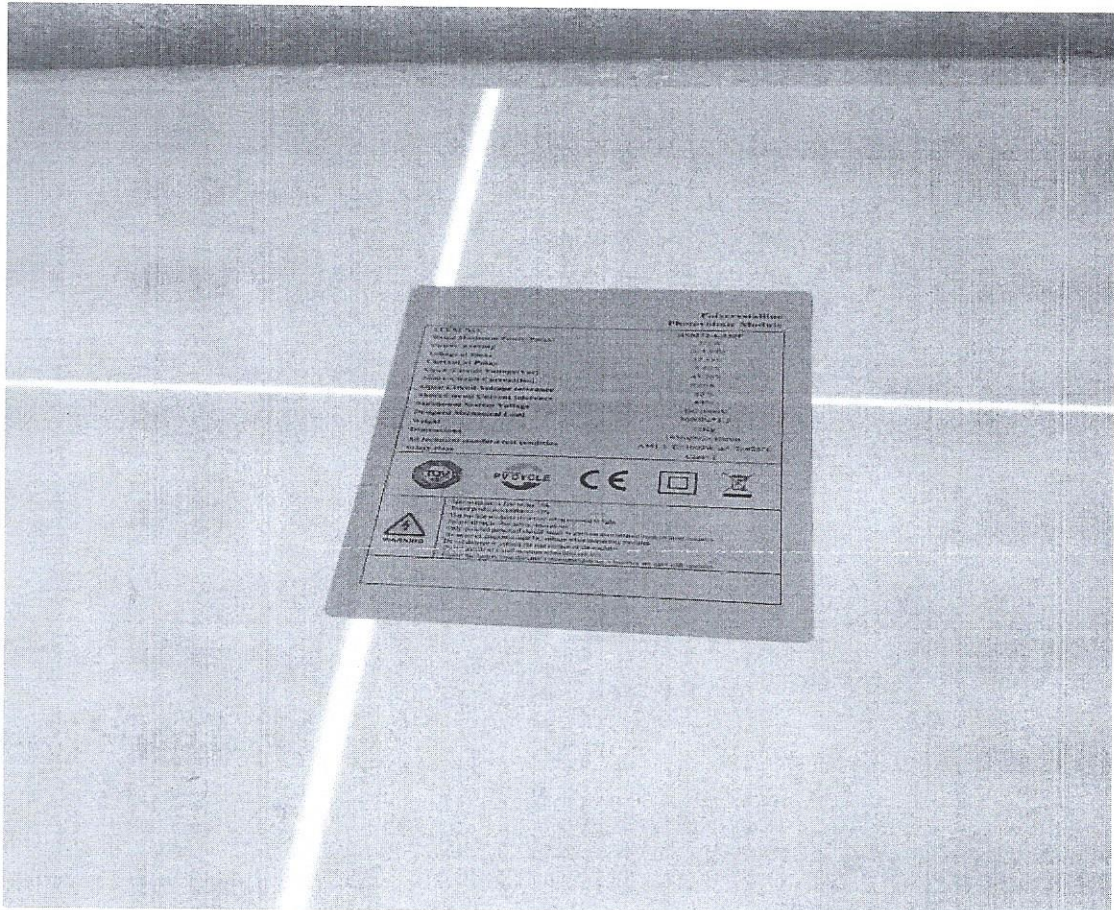

边框受损组件的电压：



