

监 理 通 知 单


工程名称：浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SP-B1-001

致：浙江群朗电力工程有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目》：今日对光伏支架安装进行检查，发现支架有个别螺丝未紧固现象以及水泥墩下的防水卷材未放置到位；

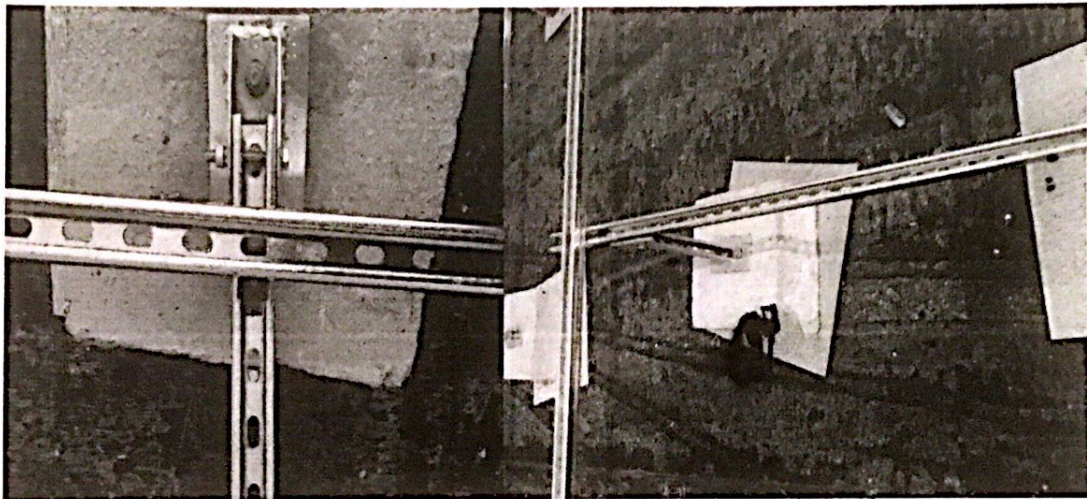

以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2020年12月19日



监 理 通 知 单


工程名称：浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SP-B1-002

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目》：今日对光伏组件安装及电缆桥架安装进行检查，发现逆变器交流电缆桥架转角为连续直角，导致电缆转弯半径不足，光伏组件安装后个别阵列呈波浪形；

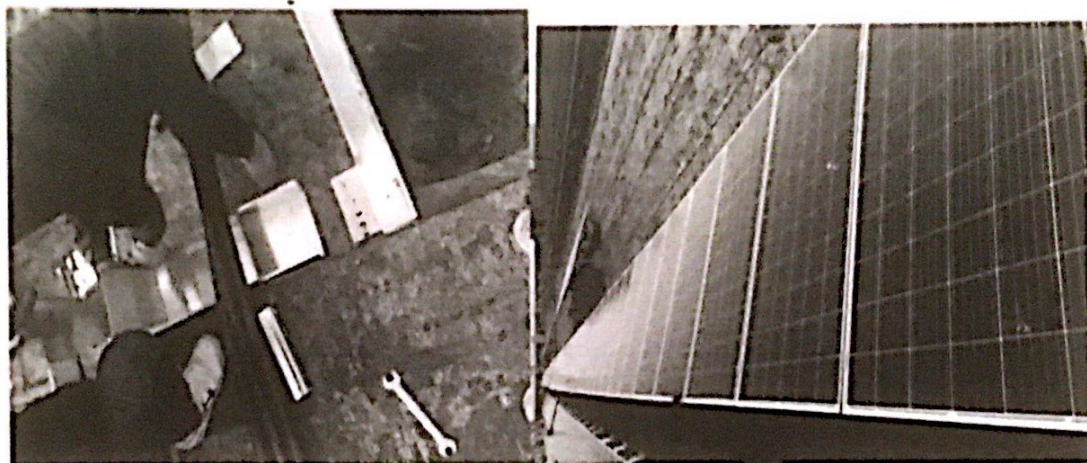

以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2020年12月21日

监 理 通 知 单


工程名称：浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SP-B1-003

致：浙江群朗电力工程技术有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目》：今日对现场电缆进行检查，发现以下问题，1、逆变器交流侧电缆剥线过长，且接地编带未使用冷压鼻子进行固定；2、电缆桥架内 4 平方线未做防护

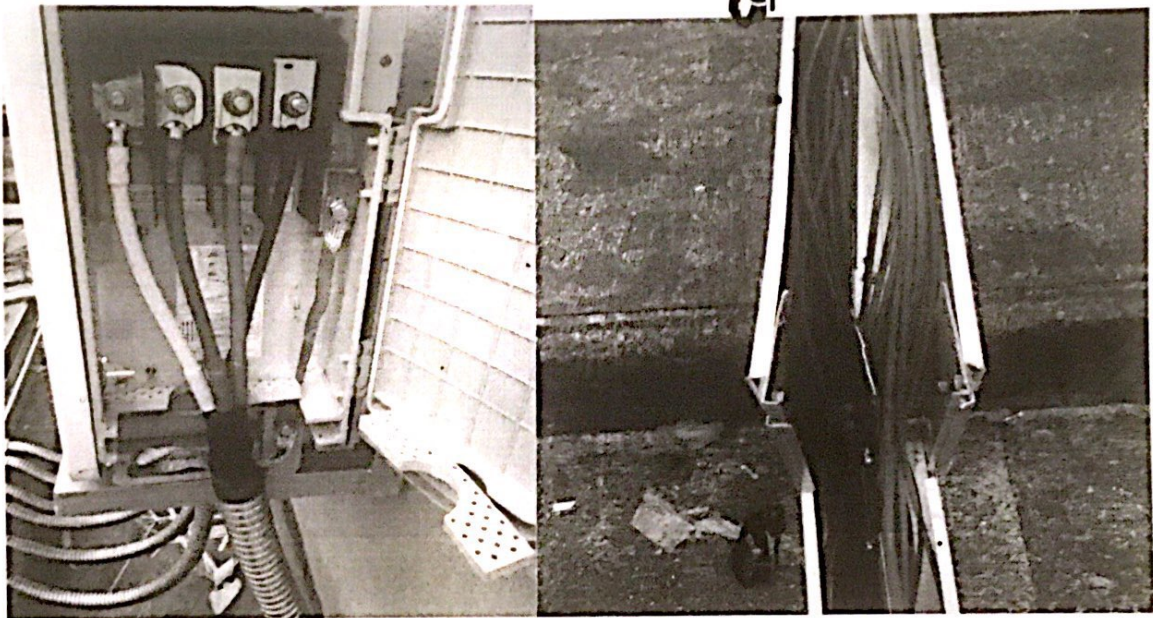

以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2020 年 12 月 23 日

监 理 通 知 单


工程名称：浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SJ-B1-004

致：浙江群朗电力技术有限公司

事由：施工存在问题相关事宜

内容：你单位所承建的《浙江吉美食品科技有限公司 0.6MW 屋顶分布式光伏发电项目》：今日对现场接地焊接进行检查，发现以下问题，1、支架与接地焊接时，未对 4 平方线保护管进行防护，造成损伤；2、扁铁与圆钢连接方式错误，不满足设计要求；

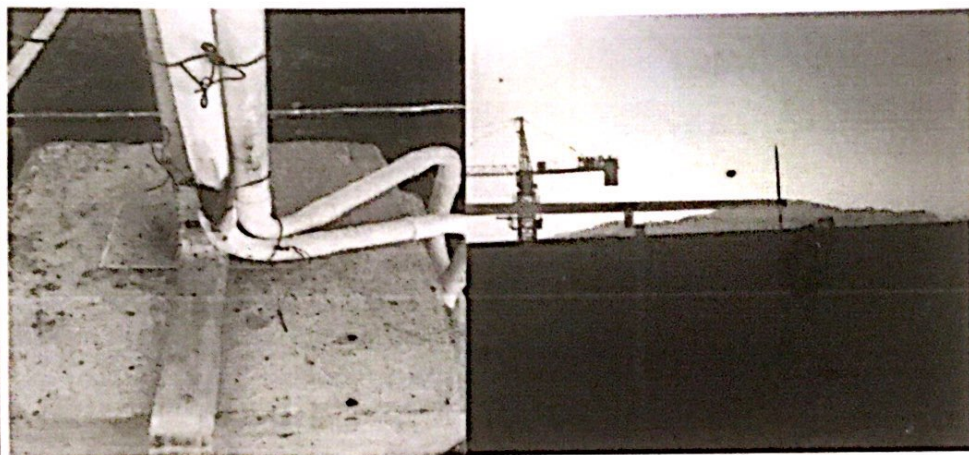

以上现象要求你方立即整改并回复，并严格按照图纸设计进行施工

抄送：安吉嘉晖新能源科技有限公司

监理项目部

总/专业监理工程师：

日期：2020 年 12 月 21 日

