

监理通知单

工程名称: 申宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-YCGF-TZD-004

主送: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送: 宣城市申宜新能源有限公司

主题: 关于 110KV 输出线路施工相关事宜

内容: 监理对 N23-N36 输出线路检查发现, 现场存在以下问题:

- 1、对于组塔完成后的铁塔未完成自检、消缺; 存在较多问题。
- 2、未经验收合格, 就转入下一道工序(架线)施工。
- 3、对于架线穿越、钻越施工未架设安全警示标识牌。
- 4、未见施工单位报审资料、过程资料、及各项专项方案。
- 5、尽快提供所有规格型号钢筋、混凝土试块等原材料送检试验报告。

施工单位需加强现场安全、质量管理, 对于不符合要求的塔进行自检、消缺整改工作, 对于分部、分项工程按验收程序进行报验, 否则不允许转入下一道工序施工, 望施工单位悉知并严格执行。

后附相片


监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:


日期: 2021 年 03 月 15 日

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。

相片一：螺栓未紧固

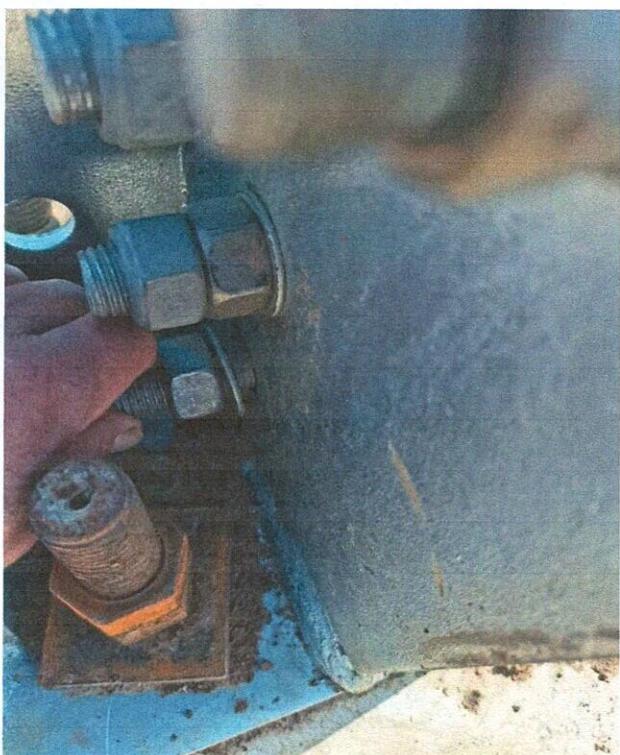

相片二：螺栓未紧固

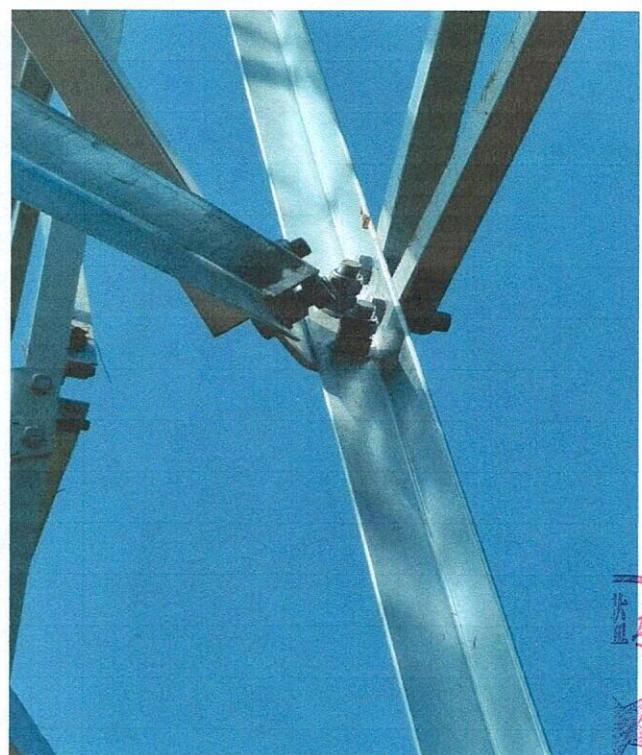

相片三：架线道路未见安全警示标识牌



相片四：地脚螺栓未拧紧



有限公司
三一
水箱100M
光伏发电项目部
管理项目部
