

监理通知单

工程名称：申宣宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-005

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

主题：关于光伏区桩基施工相关事宜

内容：监理对光伏区打桩检查发现，现场存在以下问题：

- 1、A01、A12、A13 地块桩基垂直度偏差较大，需整改。
- 2、打桩区域部分桩基入土深度不满足设计要求（设计要求入土深度不小于 2 米）。
- 3、个别区域由于地势原因，打桩人员把桩截断打入，严重影响桩基质量及桩基稳定性。

针对以上问题，施工单位需加强现场质量管理，对于不符合要求的桩基进行自检、整改工作，望施工单位悉知并严格执行，确保工程质量、安全。

后附相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021年 04月 16 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

相片一：截断后的桩长 3.1 米



相片二：桩基垂直度偏差




中电建集团有限公司
水电工程局有限公司
项目部

相片三：4.5 米预制管桩扳断



相片四：4.5 米桩入土深度不符合设计要求

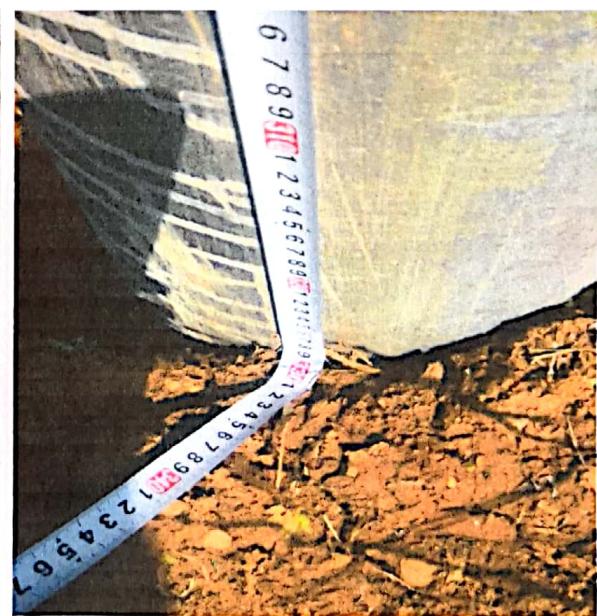

由 扫描全能王 扫描创建
