

监理通知单

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-026

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市申宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于升压站电缆敷设相关事宜

内容：

经监理升压站现场检查发现，站用变至低压开关室电缆敷设存在以下问题：

1、站用变低压开关室电缆应采用型号为：NA-YJV22/0.6/1KV 铜芯电缆，而现场电缆型号为：ZC-VLV22/0.6/1KV 铝芯电缆，不符合设计要求。

2、站用变至低压开关室应该 2 根 3*300mm+1*150mm 电缆，而现场直接采用一根 3*300mm+1*150mm 电缆，不满足总负荷容量及不符合设计要求。

3、电缆敷设未穿管或者铺砂盖砖，不符合 GB-50168-2018《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准》。

望总包单位加强现场管控，熟悉电气施工图，对于以上问题，拿出合理有效处理方案闭环此问题。

后附相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021 年 11 月 20 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。




扫描全能王 创建


一：设计电缆规格型号：

设计规格		
零序电流互感器规格		
ZC-YJV22-0.6/1-芯数(截面mm ²)	规格	ZA-YJV22-0.6/1-2(3x300+1x150)

二：现场实用电缆规格型号：

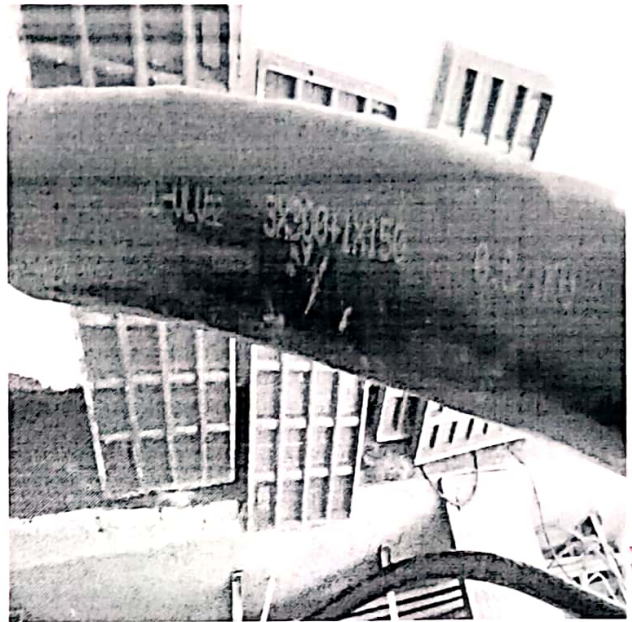

三：电缆未穿管或者铺砂盖砖

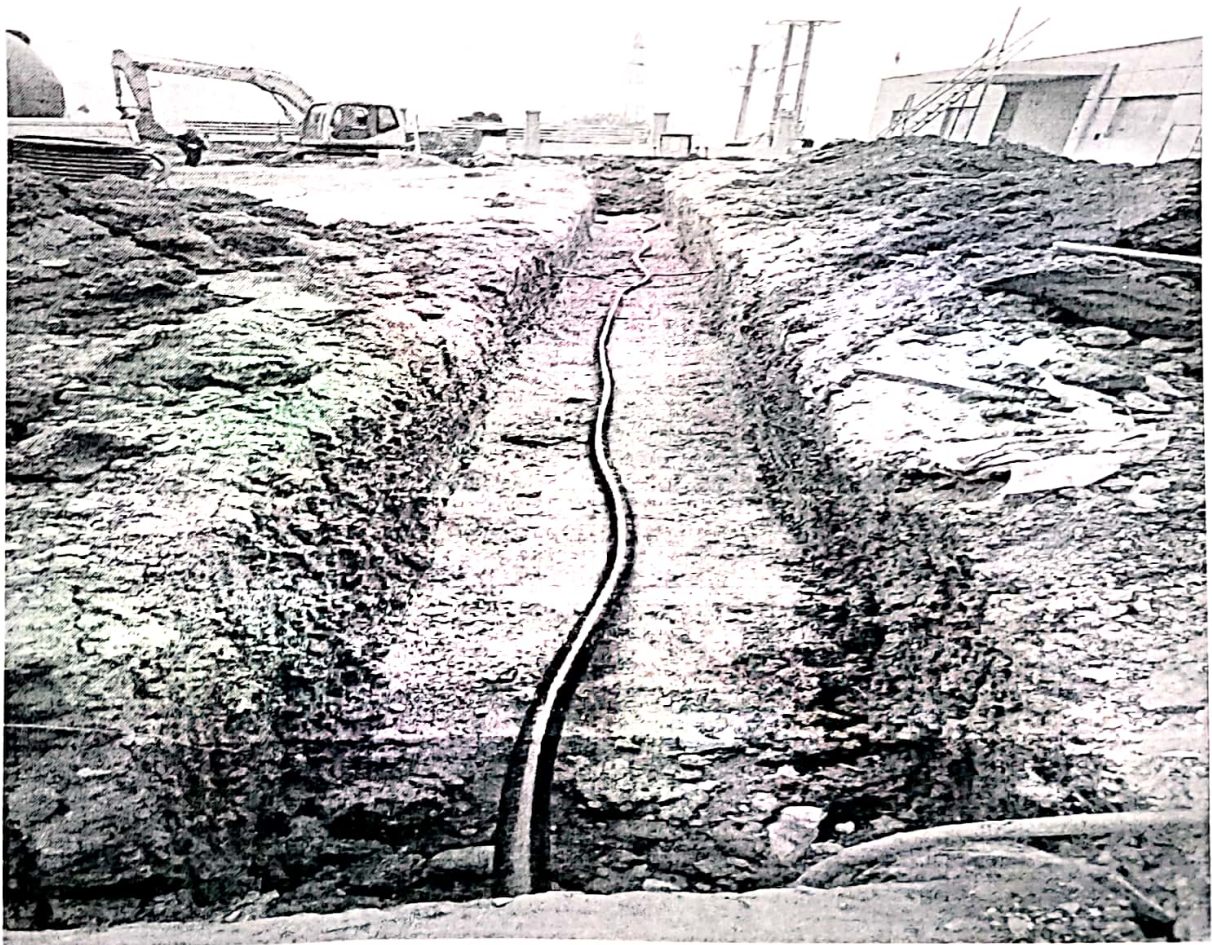

扫描全能王 创建

有限公司
水坑100M
光伏电站项目
项目部
