

监理通知单

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCGF-TZD-039

主送：中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送：宜城市中宜新能源有限公司

江苏伏峰电力科技有限公司

主题：关于光伏区施工质量相关事宜

经监理现场检查发现 B08、B09、B10、B11、B12、A01 光伏区施工存在以下问题：

- 1、A01、B12 接地扁铁敷设在电缆上面，不符合 GB/50168、GB/50169 相关规范要求。
- 2、B08、B09、B10、B11 箱逆变之间部分高压电缆沟开挖深度不满足设计要求（设计要求 1 米以下），需整改后报监理项目部复查。
- 3、B06、B07、B08、B09、B10、B11 高压电缆沟电缆敷设后必须铺砂盖砖，并报监理项目部验收合格后方可隐蔽。
- 4、被挖断的环网接地扁铁需在回填前修复完成。

针对以上问题，总包单位、施工单位加强现场管控，对不合格部分进行整改合格后，报监理项目部复查，望相关负责人重视并落实到位。

后附不合格相片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]


日期：2021年06月17日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建

相片一：接地扁铁敷设在电缆上面，不符合规范要求。 相片二：高压电缆沟开挖深度不够

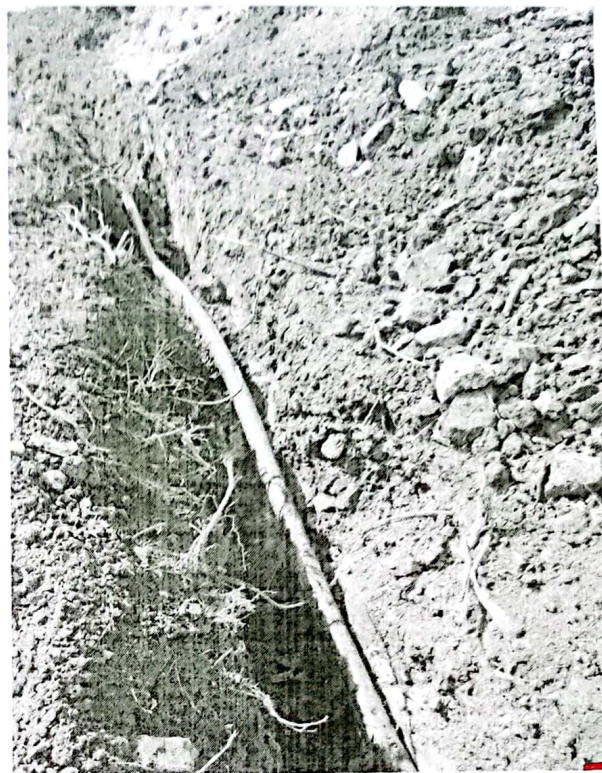

相片三： 环网接地扁铁被挖断，需修复

