

监理通知单

工程名称: 申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-YCGF-TZD-003

主送: 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司

抄送: 宜城市申宜新能源有限公司

主题: 关于光伏场区桩基施工相关事宜

内容:

经监理日常巡视施工现场发现以下问题:

- 1、B04 地块由于地势复杂, 监理对进场预制管桩进行实测为 4500mm, 不符合现场施工要求。
- 2、监理对已定型的管桩进行实测, 入土深度不足 1500mm, 外露地面部分在 3500-4000mm 左右, 已超出设计范围。
- 3、前后排高低落差较大, 组与组之间高低落差超出设计及相关规范要求。

针对以上问题, 望施工单位对不符合要求的桩基进行整改, 并采取合理有效方案进行处理, 保证施工质量满足设计及相关规范要求。总包单位需加强现场管控, 对于以上问题尽快处理。

附现场实测相片

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 

日期: 2021 年 03 月 10 日




本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。


相片一：组与组之间高低差较大



相片三：桩基外露超出设计及相关规范要求

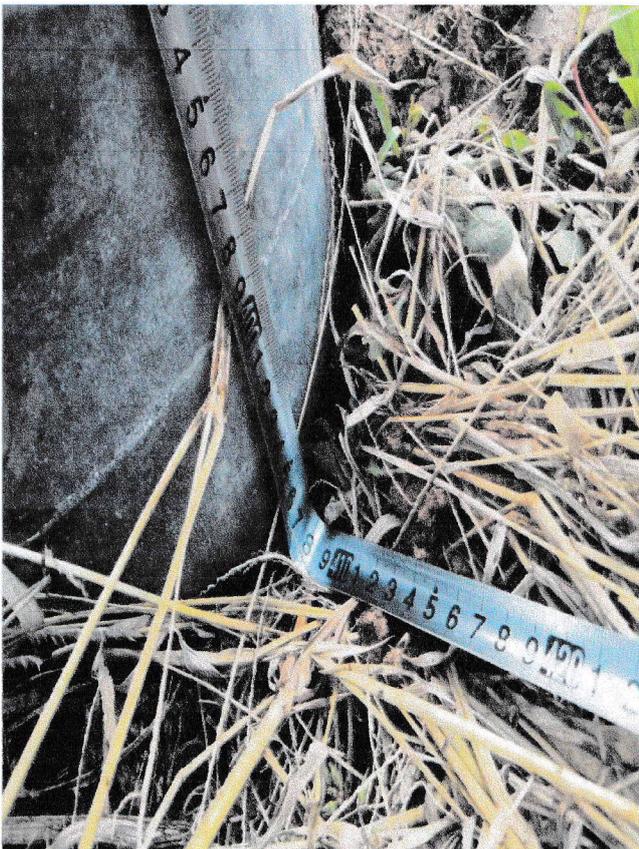

相片二：1、前后排高低差较大

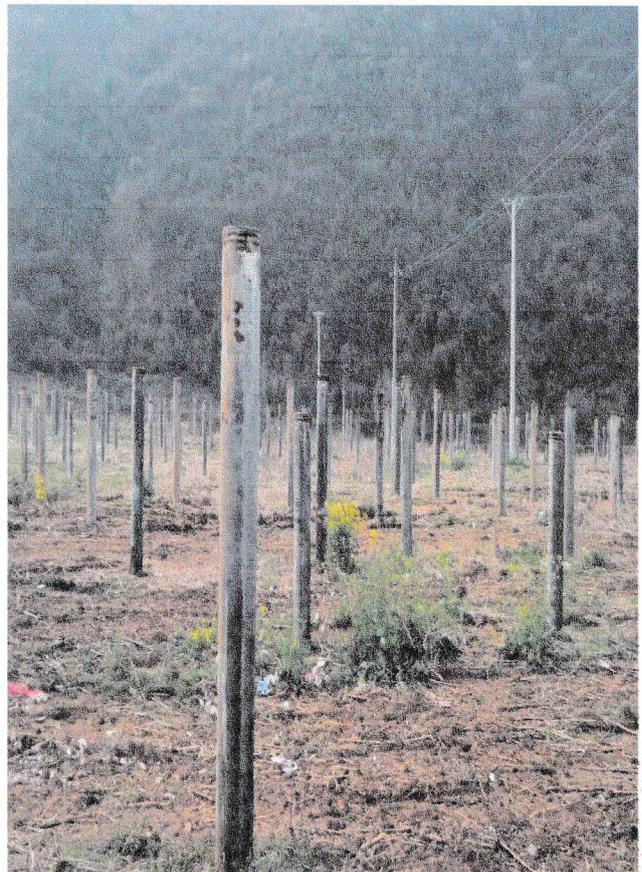

相片四：B04 地块不应采用长度 4500mm 预制管桩

