

监理工程师通知单

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JLTZ-015

致：西安西电新能源有限公司项目部

抄送：宁明县中汇新能源有限公司项目部

主题：关于 6#风机基础钢筋绑扎相关事宜

在巡视过程中发现风机基础钢筋绑扎存在如下问题：

- 1、基础⑬号钢筋未按图纸要求两两并筋。
- 2、基础钢筋⑭、⑮号钢筋现场螺旋式绑扎，未一圈一圈绑扎，且未按图纸要求采用机械连接（直径 25 及以上钢筋机械连接）。

针对以上问题，要求各级技术人员交底明确、施工过程中跟踪到位。现要求你单位按图纸要求进行整改，基础钢筋隐蔽验收前整改完成。（后附图片）

项目监理部（章）：


总 / 专业监理工程师：

日


期：

苗守明
2021.7.6

注：本表一式 3 份，由监理项目部填报，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份

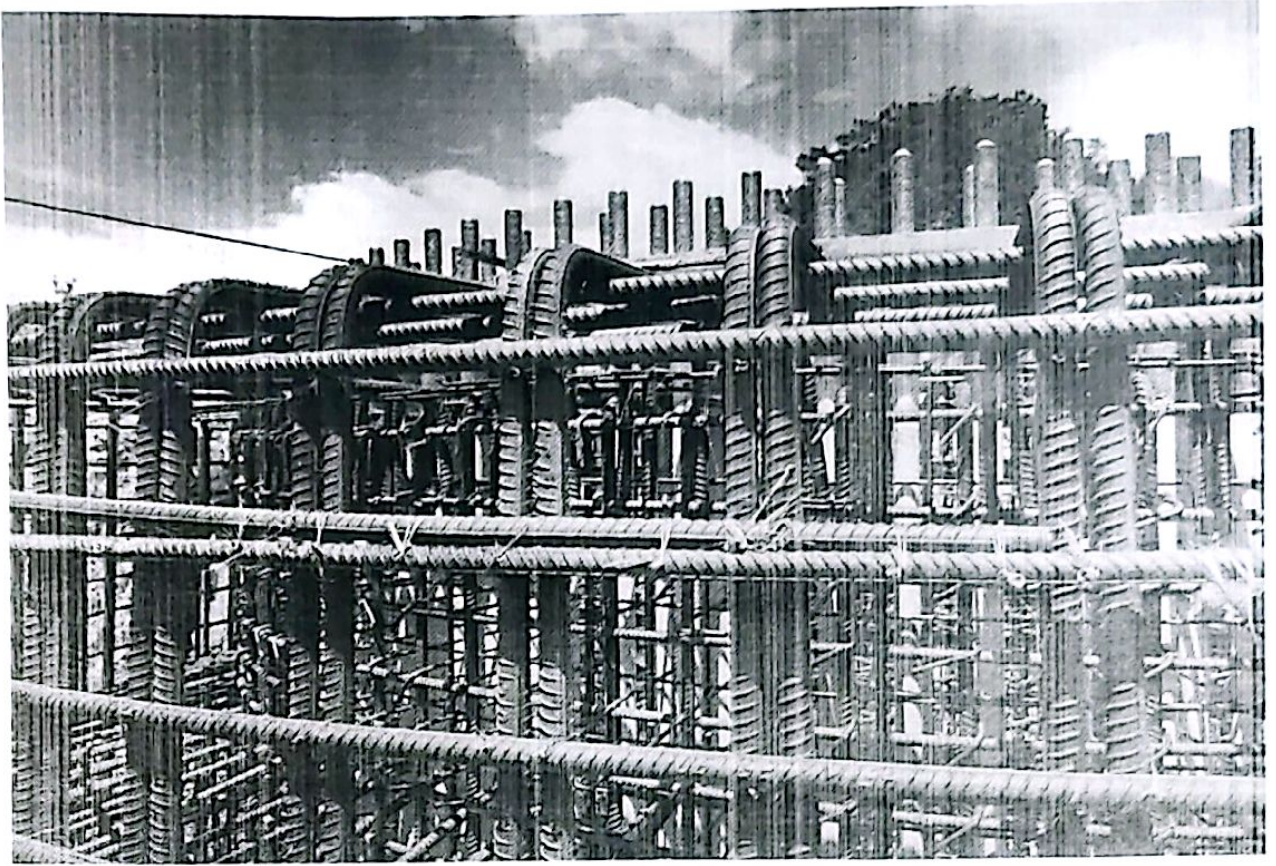

6#风机基础钢筋

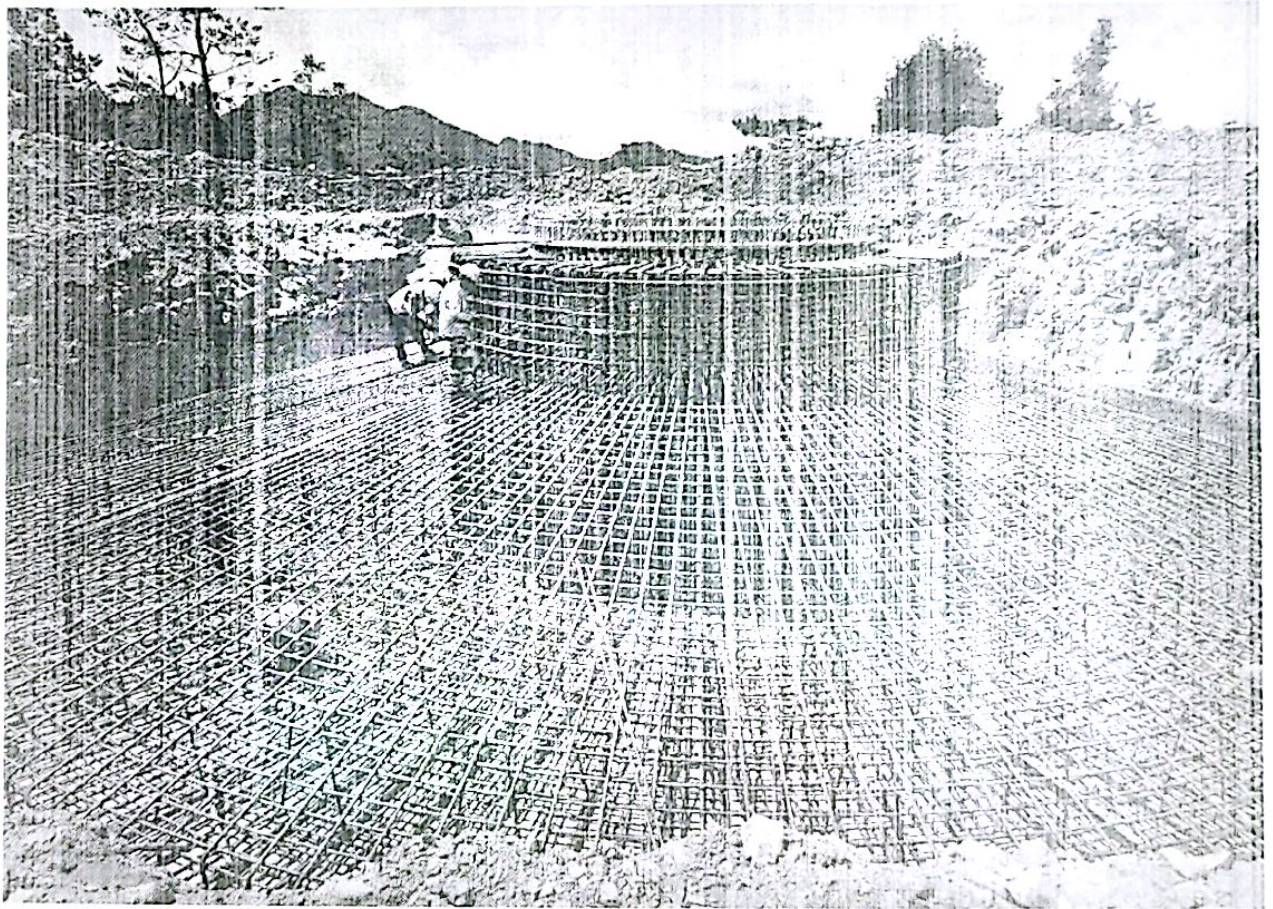

6#风机基础钢筋
