

监理通知单

工程名称:星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号:JXM7-ZHJL-004

主送:浙江西子联合工程有限公司

抄送:滁州嘉晖新能源科技有限公司

主题:关于现场检测镀锌支架无立柱底座、三角件、立柱、中后立柱底座及焊接质量相关事宜

1、经监理部现场巡视检测发现,现场镀锌支架无立柱底座、三角件、立柱、中后立柱底座镀锌层厚度未满足国标《GB/T13912-2002》及图纸相关要求,现场实际测量镀锌厚度见以下图示:

2、经检查现场支架部件焊渣未清理,导致现场支架部件已有生锈现象。

鉴于上述情况要求你单位及时整改,将现场镀锌支架无立柱底座、三角件、立柱、中后立柱底座做退场处理不得使用。待采购合格的材料监理部检测合格后方可进场使用。未清理焊渣直接镀锌的支架部件返厂处理。

望贵单位重视!限二日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师:



日期: 2021 年 5 月 26 日



本表一式__份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存__份。



扫描全能王 创建

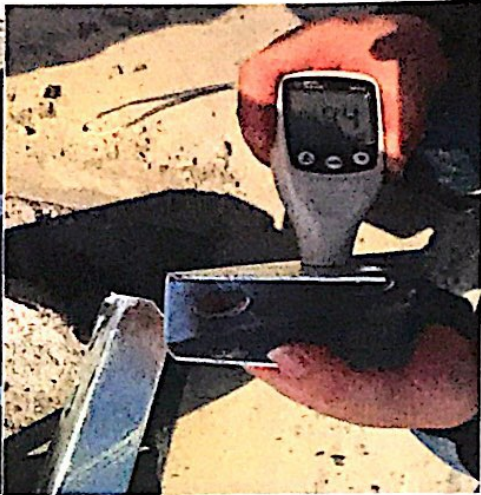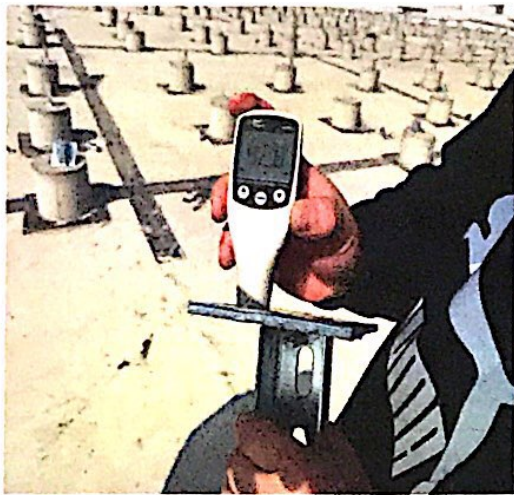

扫描全能王 创建
