

监 理 通 知 单

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JXM15-JL01-001

致：特变电工新疆新能源股份有限公司（施工项目部）：

事由：

关于铁塔基坑临边安全防护、基坑放坡事宜。

内容：

监理项目部与业主项目部于 2021 年 04 月 18 日上午对集电线路施工单位 65#、13#、50#、3#基坑进行验槽，发现安全隐患如下：

- 1、基坑临边安全防护围挡未设置、警示标牌未悬挂。
- 2、基坑未放坡。

现要求：

- 1、现监理项目部要求你单位在 48 小时之内（2021 年 04 月 20 日）完成所有已开挖的基坑临边安全防护，所有基坑施工现场要设置安全警示标牌。
- 2、基坑基础放坡限时 72 小时内（2021 年 04 月 21 日）完成。
- 3、在未放坡之前所有施工人员不得进入基坑施工。
- 4、总包单位对所有机械操作员进行安全再培训，每台机械设备配备一名安全监护人，专职安全员要对所有施工现场进行安全巡视。
- 5、以上所有要求必须在限期时间内完成，否则对各有关项目负责人以及专职安全员进行安全考核。



望你单位高度重视，按要求、按时间执行！

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王立木

日期 2021 年 04 月 18 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

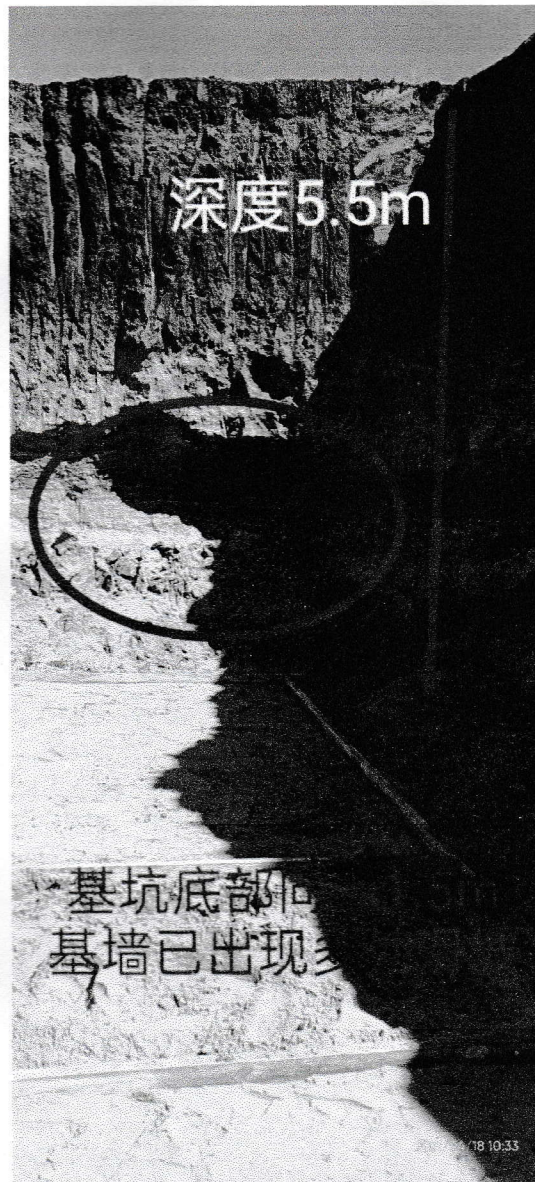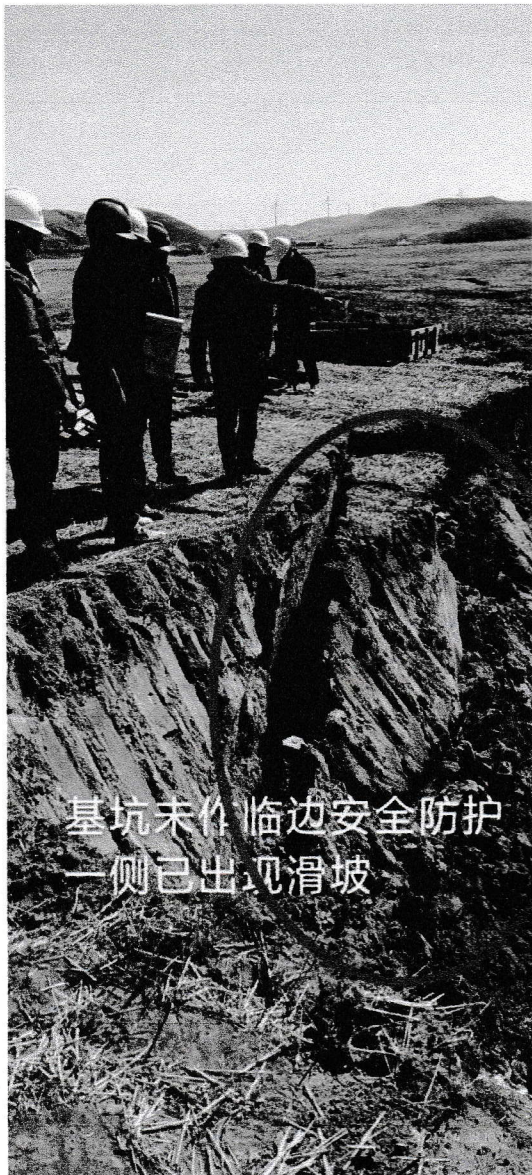

施工现场安全问题照片
