

监理通知单

工程名称: 来安县华基新能源有限公司 2.5MW 光伏发电工程项目 编号: JXM7-ZHJL—002

主送: 天津华焰科技有限公司

抄送: 华基新能源有限公司

内容: 关于现场安全文明施工及施工质量相关事宜

经监理部现场巡视发现问题:

- 1、爬梯未按要求做防护网, 存在严重安全隐患。
- 2、现场为彩钢瓦屋面, 无女儿墙, 你单位个别未做临边防护, 存在严重的安全隐患。
- 3、运维通道紧固件存在生锈现象, 不符合要求。
- 4、三角钢镀锌厚度未达到标准, 不符合要求。
- 5、三角钢打孔部分未做防腐, 不符合要求。
- 6、该项目已进场数日, 但至今监理项目部未收到任何开工资料报审及相关材料资质报审。
- 7、部分导轨紧固件未紧固及紧固件型号不同, 不符合要求。

上述问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、增加防护网 2、必须做临边防护, 杜绝安全隐患。3、对于生锈的紧固件需做除锈处理。4、对于现场不符合要求的材料进行返厂处理。5、打孔三角钢需做防腐施工 6、及时报审相关资料至监理项目部。7、要求更换同一型号紧固件。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展, 望你单位及时整改, 待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视! 限两日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 修智明

日期: 2021年 7月16日




本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。

附页
防护网不符合要求



三角钢紧固件生锈

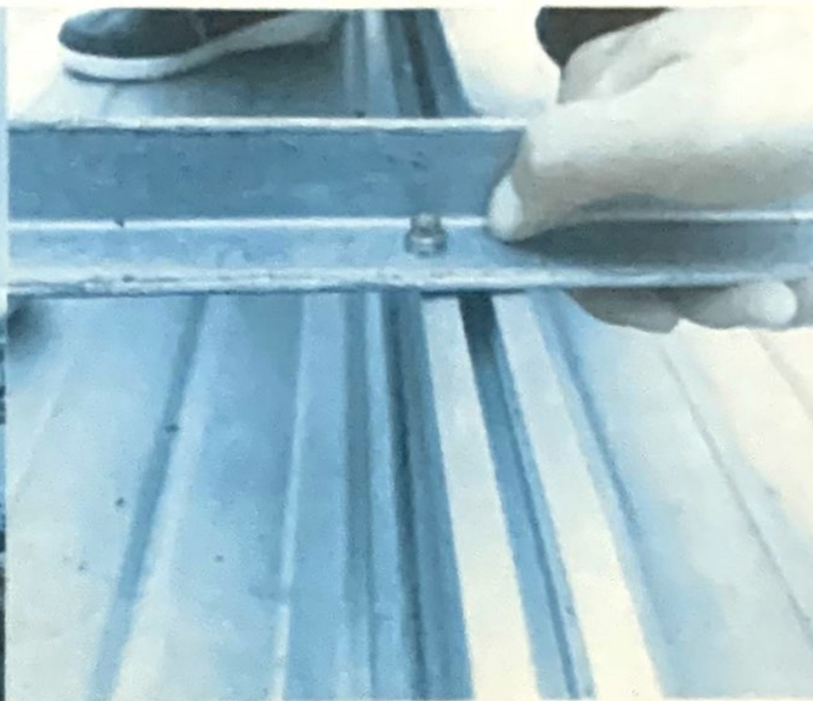

镀锌层厚度不符合要求



打孔部分未防腐



紧固件未紧固



紧固件型号不同

