

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-014

致：四川浩能新能源有限公司

江苏华源新能源科技有限公司（施工项目部）


事由：关于你单位管桩堆放的相关事宜

内容：经我监理部巡视检查发现，你单位堆放管桩不规范，管桩边缘处木楔未塞紧，未能起到有效的防护作用，并且周围未增设相关安全标识，为了避免不必要的质量安全隐患，现根据管桩堆放管理规范要求你单位做到以下几点：

- 1、场地平整坚实，不得产生不均匀下沉，必要时应对堆场进行地面硬化；
- 2、管桩堆放时，最下层必须设置垫木，垫木边缘处的管桩应用木楔塞紧，防止滚动，堆放层数不多于 4 层；
- 3、叠层堆放管桩时，应在垂直于管桩长度方向的地面上设置 2 道垫木，垫木应分别位于距桩端 0.2 倍桩长处。

如对本监理通知单内容有异议，请在 24 小时内向监理提出书面报告，请于 2021 年 7 月 21 日前填报回复单。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日

期： 2021/7/19


注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



肇源县通成100MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容: 管桩堆放不符合要求
拍摄时间: 2021.07.19 14:30

监理单位: 正衡监理

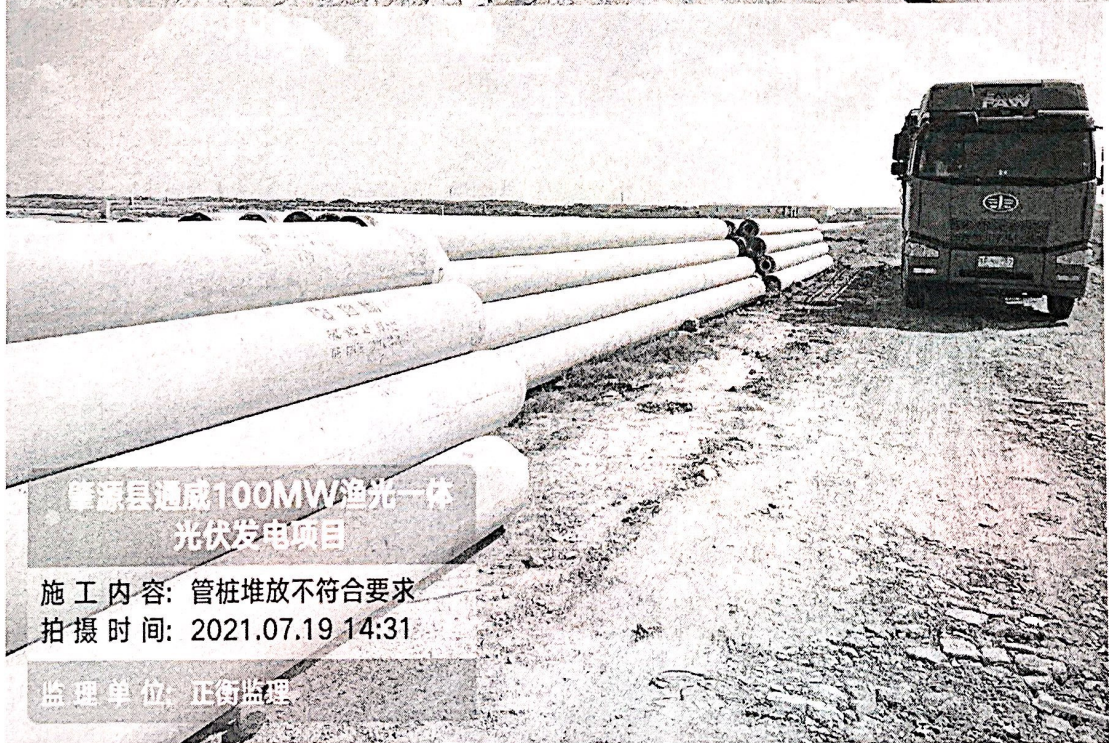

肇源县通成100MW渔光一体
光伏发电项目

施工内容: 管桩堆放不符合要求
拍摄时间: 2021.07.19 14:31

监理单位: 正衡监理
