

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-037

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

事由：关于升压站 35kV 预制舱施工事宜

内容：

经我方监理人员现场巡视现场检查发现，你方负责承建的升压站 35kV 预制舱在施工过程中存在以下两项问题：

- 1、基础混凝土两侧采用粉细砂进行了回填，不满足设计图纸要求（中、粗砂回填）；
- 2、35kV 预制舱墙体转角缺竖向钢筋，拉筋弯钩角度不符合设计要求的 135° ；

要求你方立即对以上问题进行整改，未完成整改严禁后续工序施工，施工中应严格按照设计要求的防冻胀措施进行基础回填施工；

限你单位于 2021 年 8 月 18 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日


期：2021年8月14



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

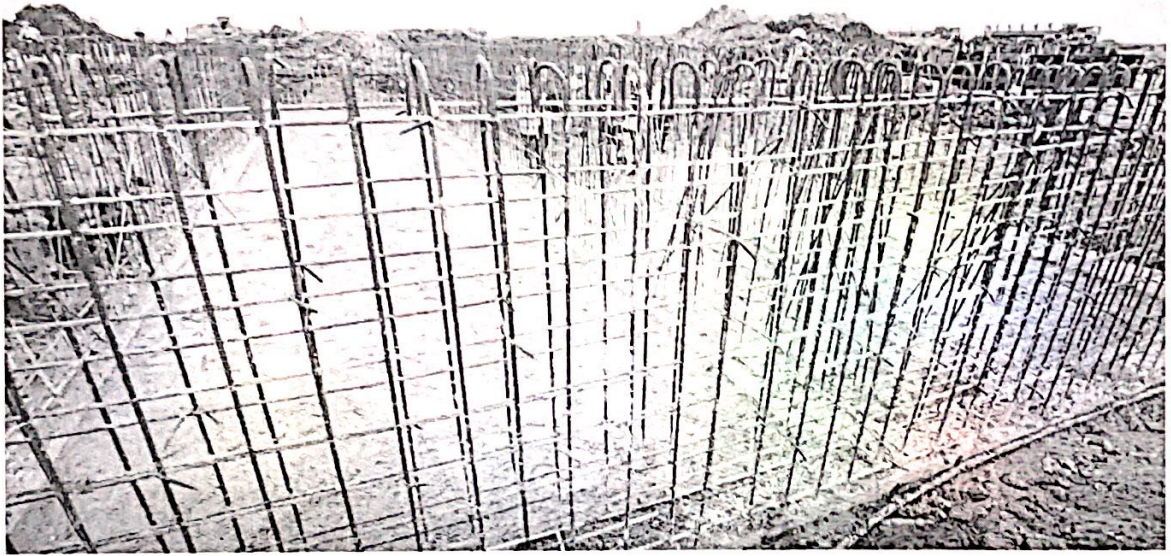

问题 1: 基础混凝土两侧采用粉细砂进行了回填

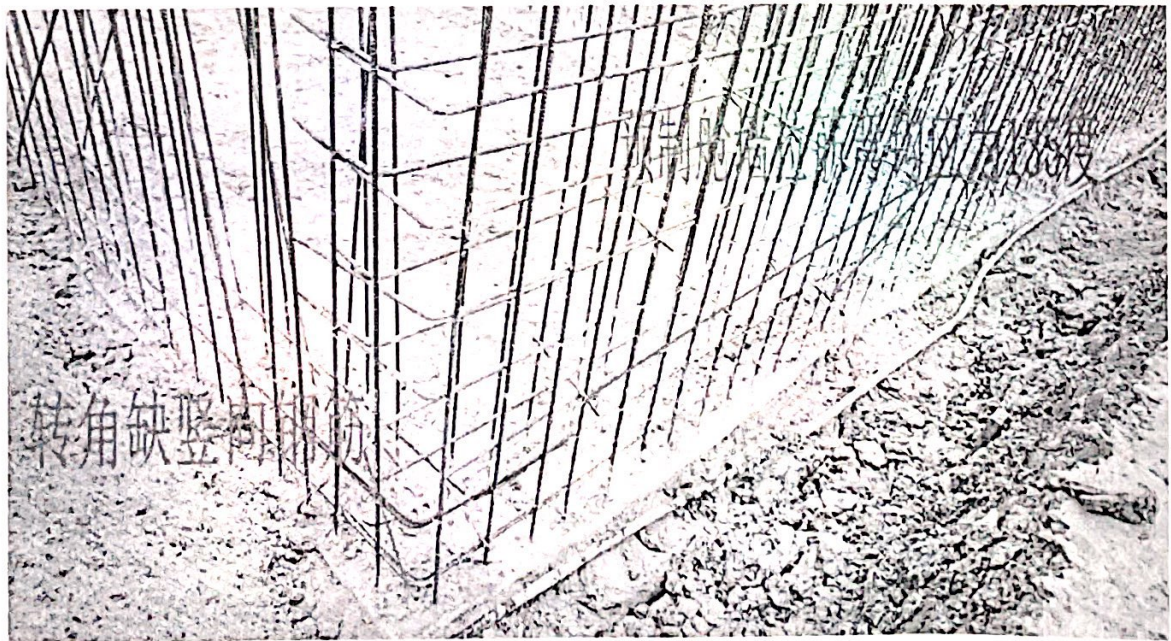

问题 2: 拉筋弯钩角度不符合设计要求的 135°
