

监 理 通 知 单

工程名称：肇源县通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

编号：ZYYG-ZHJL-852-TZD-088

致：四川省送变电建设有限责任公司（施工项目部）

抄送：肇源通威新能源科技有限公司（项目部）

事由：关于外线铁塔组立相关事宜

内容：

经我方监理及业主现场巡视检查发现，你单位 6#铁塔组立后，部分连接件未紧固，且未采用双螺母紧固，存在严重的质量安全隐患，现要求你单位对以上问题立即整改，对其它已组立铁塔进行全面排查整改，严格按照图纸设计要求施工，整改完成后通知我方监理现场验收，验收合格后方可进行下道工序施工，确保项目安全文明施工！

要求你单位于 2021 年 10 月 26 日前填报回复单。若未完成整改，将按照合同条款进行严厉处罚，望你单位重视！

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：

日

期：2021.10.24




注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

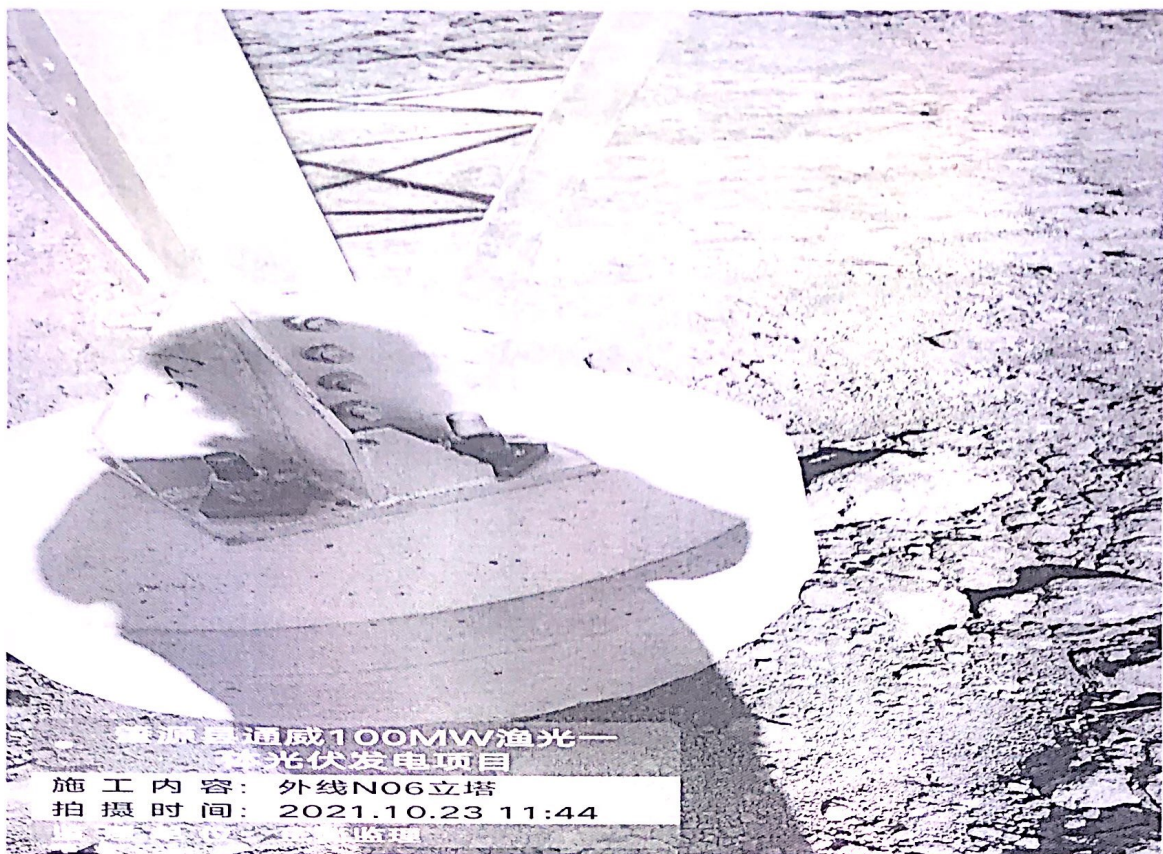

新疆通威100MW渔光互补光伏发电项目

施工内容: 外线NO6立塔

拍摄时间: 2021.10.23 11:44

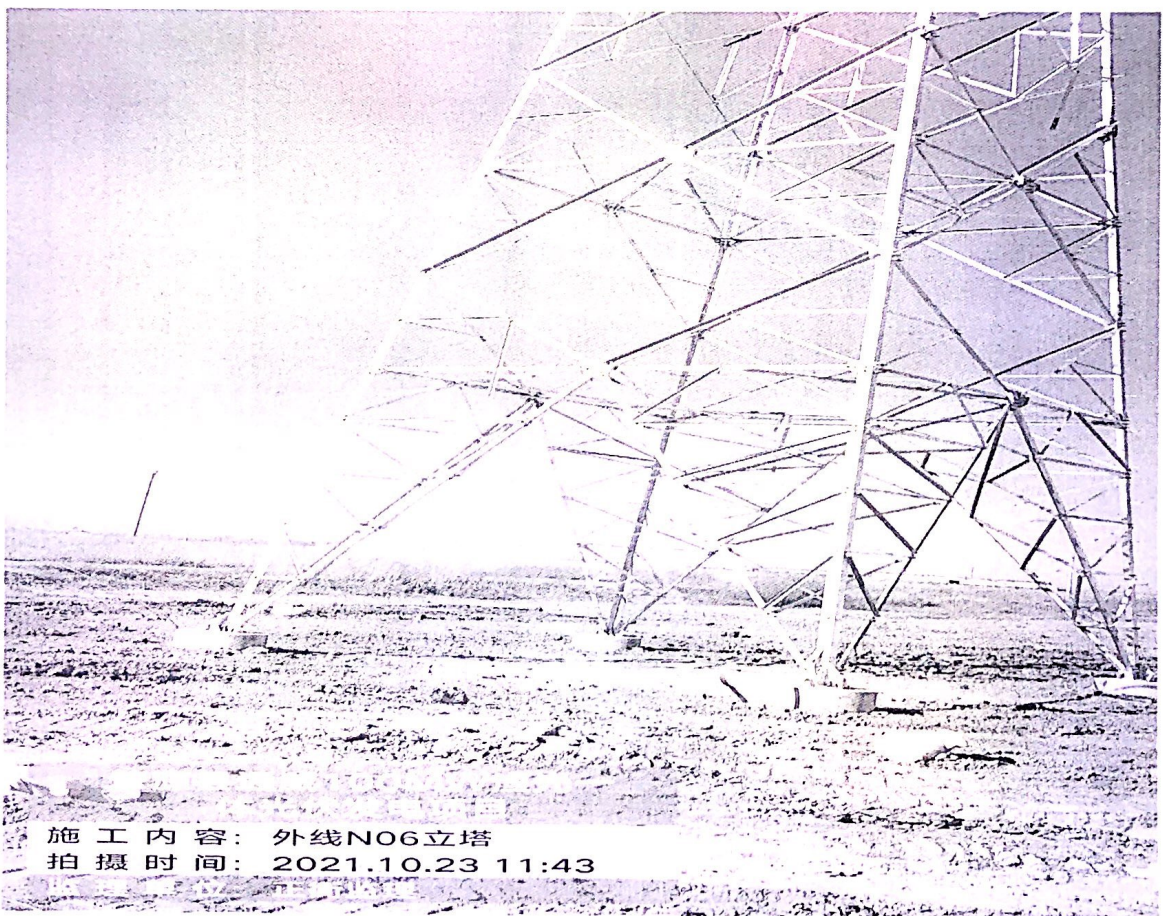

施工内容: 外线NO6立塔

拍摄时间: 2021.10.23 11:43
