

监 理 通 知 单

工程名称：常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-001



致：江苏宜安建设有限公司施工项目部

抄送：常熟新必奥光伏科技有限公司 业主项目部

事由：关于导轨安装质量事宜

内容：

贵单位承建的【常熟大陆汽车屋顶 2.123MWp 分布式光伏发电项目】工程，
监理人员在现场巡视过程中发现，1期屋面西南角区域已安装的导轨有6处连接部位有缝隙，且缝隙较大，1处夹块螺母未卡到位，现场已要求人员整改，
现监理项目部要求贵施工项目部于7月18日前，对所有已安装的支架完成自查
整改工作，并书面回复监理项目部验收，未验收前不允许进入下道工序施工。

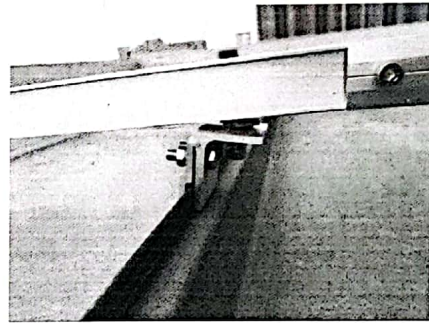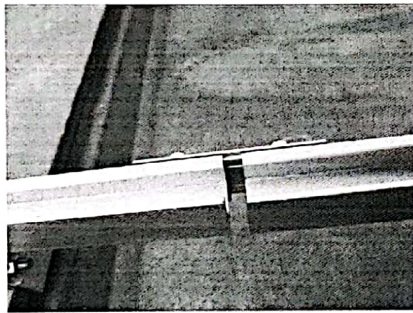

监理项目部（章）
常熟大陆汽车屋顶2.123MWp
分布式光伏发电项目
监理单位
总监理工程师：李俊平

日期：2021年7月15日

注本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份



扫描全能王 创建
