

监理通知单

工程名称：滁州和传物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

号：JXM7-ZHJL—005

主送：浙江众能工程技术有限公司

抄送：滁州市恒州新能源科技有限公司

主题：关于现场安装质量相关事宜

经监理部及业主对现场导轨及夹具验收检查发现：

- 1、个别导轨与夹具安装未固定，不符合要求。
- 2、部分导轨与导轨间缝隙较大，不符合要求。
- 3、个别导轨存在变形、扭曲情况，不符合要求。
- 4、由于运维通道角钢未到货，运维通道未分项验收。




鉴于上述情况要求你单位将现场出现的问题及时整改，待整改完成后方可进行下一道工序施工。望贵单位重视！限二日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2021年12月5日

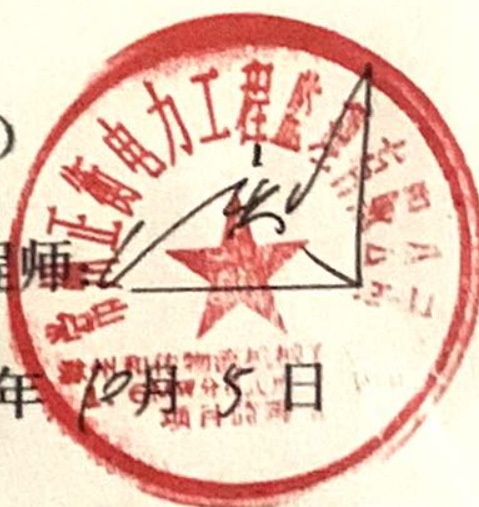

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。
