

监 理 通 知 单

工程名称：沭阳国凯新能源有限公司 10.1556MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SX-TZD-002

致：陕西辰嘉安建筑集团有限公司湖州分公司施工项目部

事由：关于施工质量及安全文明施工事宜。

内容：你单位所承建的《沭阳国凯新能源有限公司 10.1556MWp 屋顶分布式光伏发电项目》：经监理在现场巡视发现凯能 6 号屋面存在以下问题：

- 1、现场施工人员未做安全防护就临边作业，违反安全文明施工；已多次提出拉好警示标志仍未有落实。现场存在野蛮施工，存在严重的安全隐患。现要求你单位停工整改，整改完成后报监理方验收，验收合格后方可施工。
- 2、经监理在现场发现，仍有施工人员未佩戴安全帽，在会议中已多次提出就是不落实，现要求你单位立即整改，并回复；
- 3 现对你单位进行处罚。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2024年11月3日



扫描全能王 创建

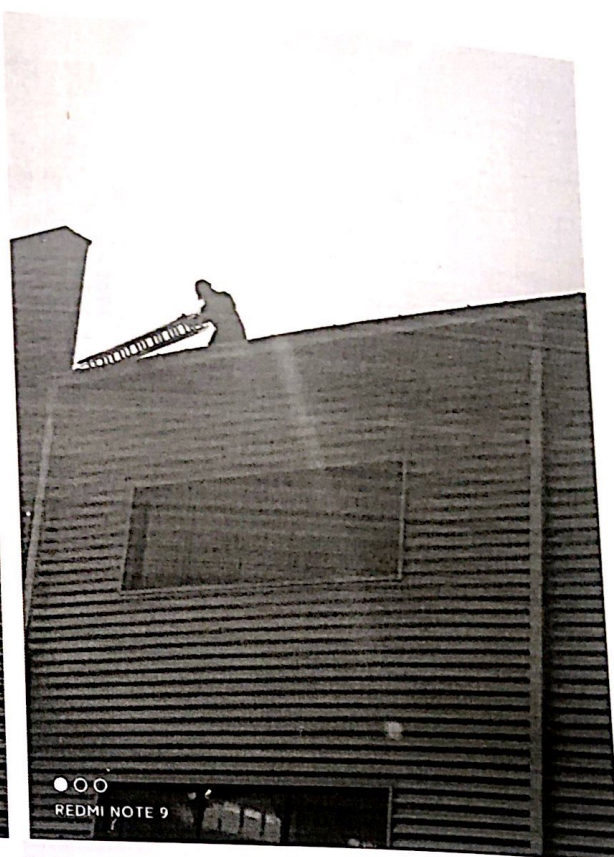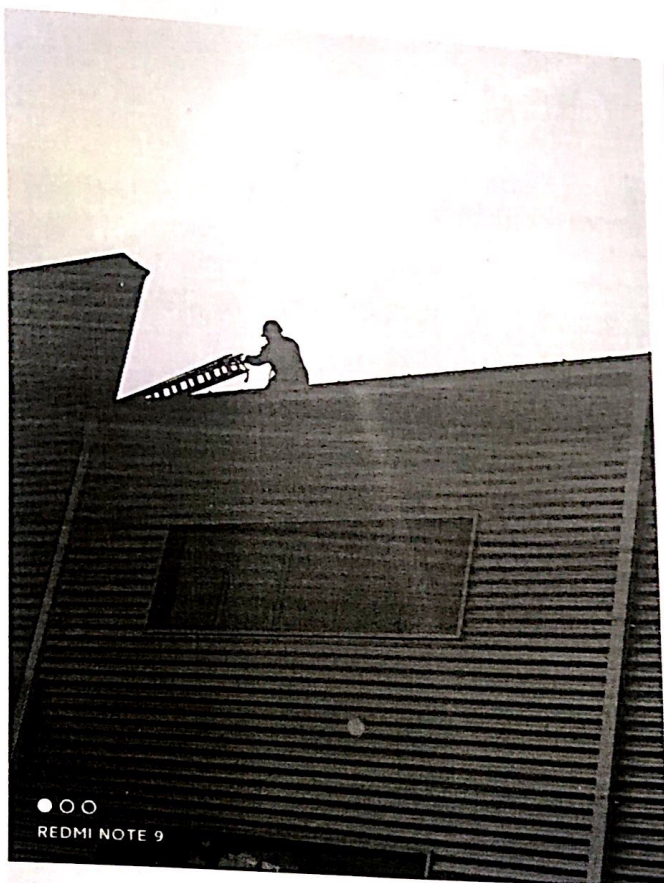

扫描全能王 创建
