

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-017

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站基础平台拆模事宜

内容：

2021 年 12 月 15 日监理部人员巡视发现：升压站基础平台底部模板已开始拆模。经核实基础平台浇筑养护期未到 28 天，施工单位未报验拆模试块强度报告，达不到拆模要求。


现要求施工单位基础平台立即停止拆模，混凝土强度达到设计及规范要求才能拆模。否则后续发生的一切质量、安全问题由施工单位自己承担。

限期 1 日内整改回复。
后附现场照片。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日 期：




责任单位签收：

责任单位（盖章）：



项目负责人（签字）：

日

期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

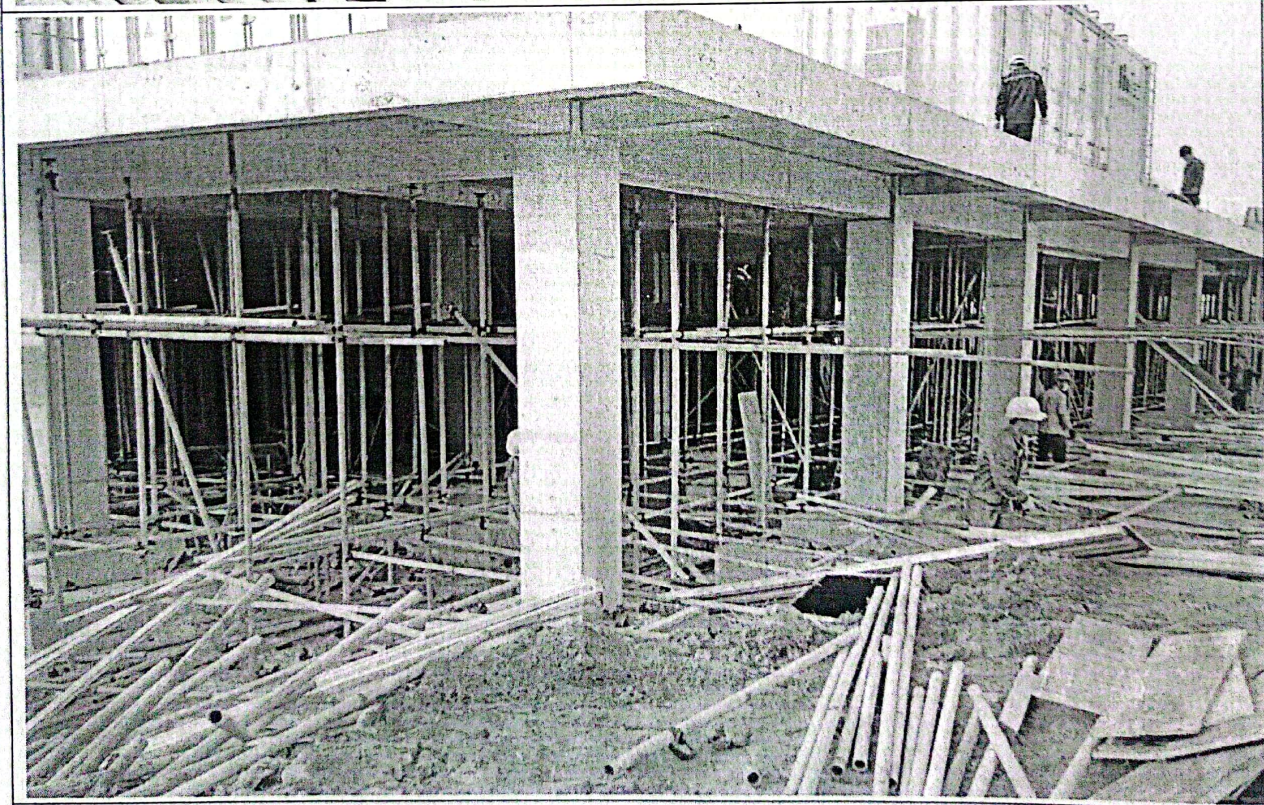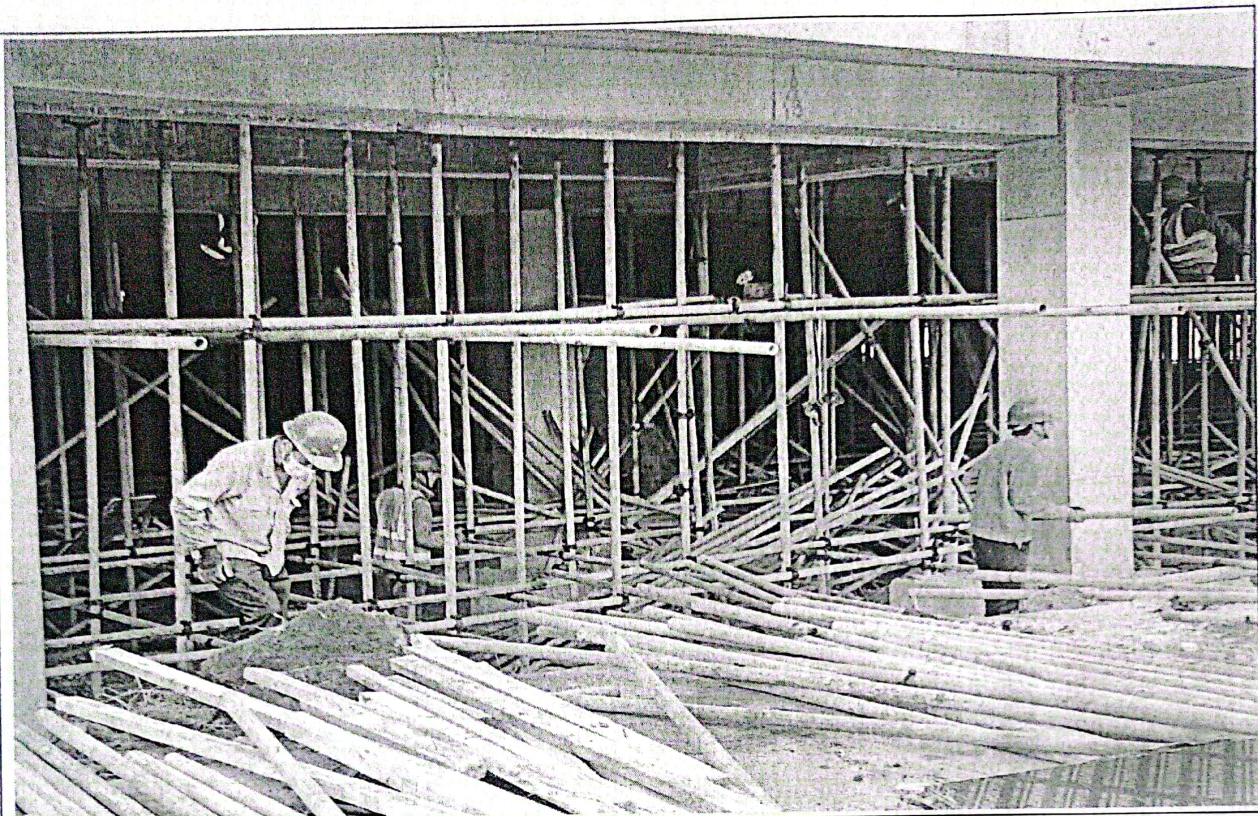

升压站基础平台已开始拆模

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-010

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）


我方接到编号为 BYXM-TZD-JC-017 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：因业主要求进行施工，我方进行了回弹测试。

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：



监理项目部复查意见：

已复查，已全部整改完成。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：



本表（含附件）一式 二 份，监理项目部存 一 份，承包单位存 一 份。
