

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-018

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站设备接地施工事宜

内容：

2021 年 12 月 15 日监理部人员对 SVG 区域内设备接地及围栏焊接进行巡视检查，发现问题如下：

1、升压站 SVG 电抗器及配套设备构架接地只有一条，不符合设计及规范要求。根据图纸设计要求电抗器设备及构架接地要与接地网 2 条不同干线连接。

2、SVG 电抗器接地搭接处未满焊，焊缝不饱满。

3、SVG 电抗器围栏焊接处焊渣未清理已进行刷漆施工。

4、SVG 箱体接地焊接时未做好保护，箱体表面油漆被破坏需要重新喷涂。

以上问题要求施工单位及时进行整改，电抗器及设备构架接地施工要符合设计及规范要求；电抗器围栏焊接后要清楚焊渣经监理人员验收合格后才能刷漆。

限期 3 日内整改回复。
后附现场照片。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：2021.12.16



责任单位签收：

责任单位（盖章）：


项目负责人（签字）：

日期：2021.12.16


本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

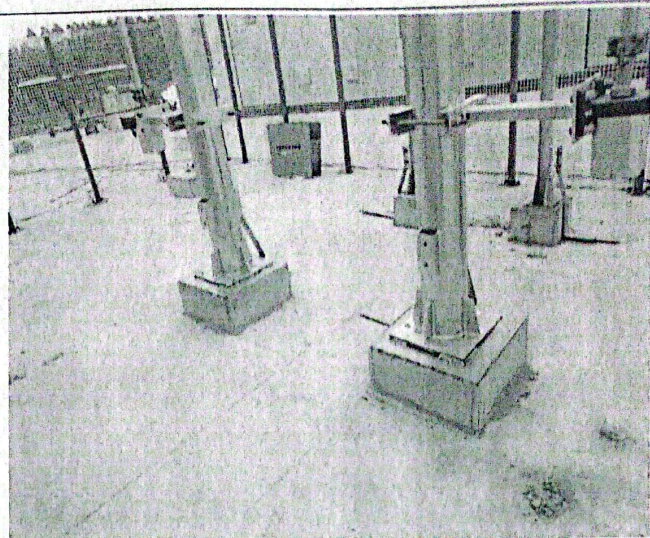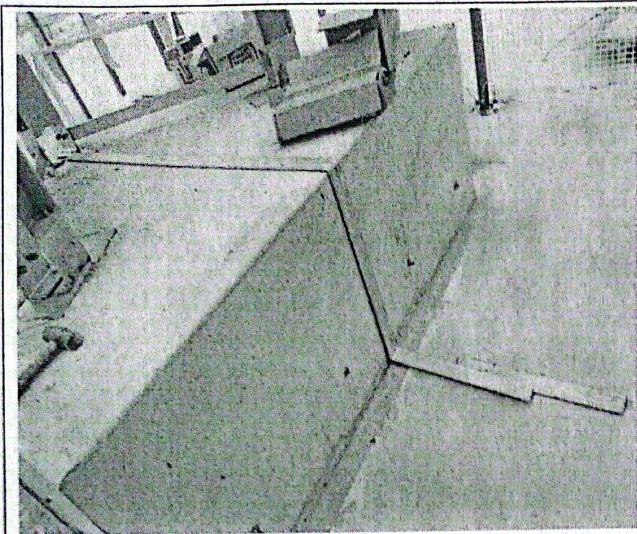


电抗器及设备构架接地不符合设计及规范要求

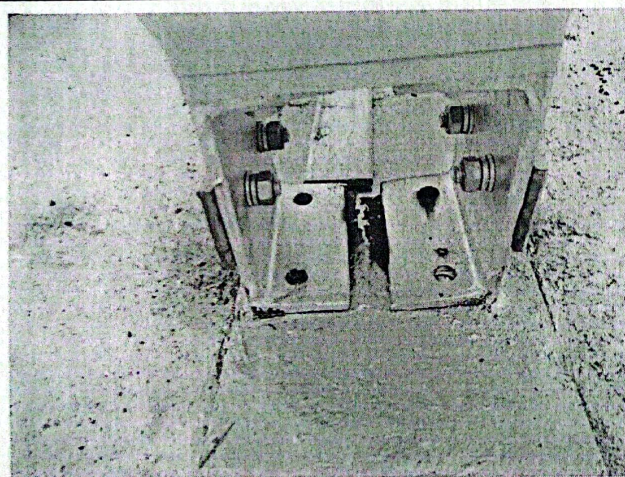

SVG 电抗器围栏焊接处焊渣未清理

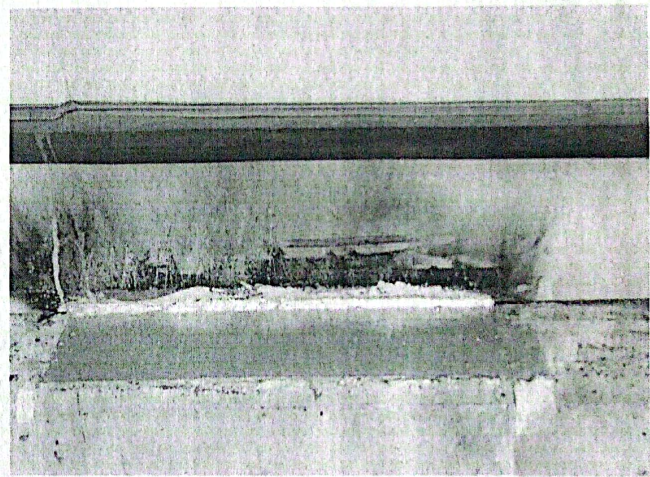

SVG 箱体油漆被破坏

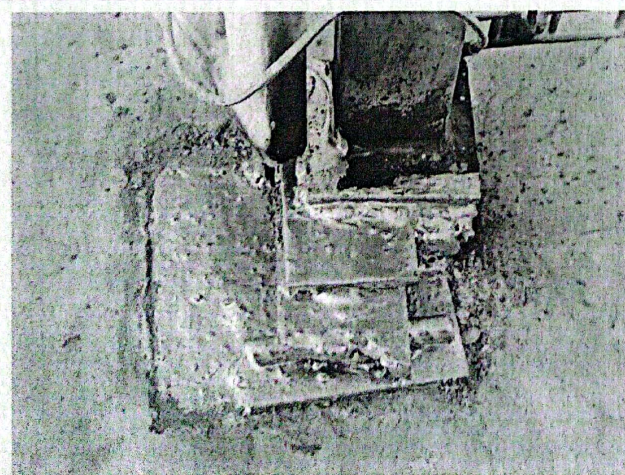

SVG 电抗器围栏焊接处焊渣未清理

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BD-B09-SG01-011

致：常州正衡电力工程监理有限公司（监理项目部）

我方接到编号为 BYXM-TZD-JC-018 的监理通知单后，已按要求完成了工作，请予以复查。

附件：已进行整改。

承包单位（盖章）：

项目经理（签字）：

日期：

2021.12.16

监理项目部复查意见：

已复查，合格，验收完成。

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：

2021.12.18

本表（含附件）一式二份，监理项目部存一份，承包单位存一份。
