

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-023

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部

事由：关于光伏区管桩基础底部孔洞灌浆施工相关通知

内容：

光伏区管桩打桩已完成部分工程量，支架及组件已开始陆续安装施工，根据设计单位及业主项目部要求支架安装前管桩底部孔洞需要灌浆，孔洞灌浆深度不少于 2 米高度，混凝土强度不低于 C25，避免管桩后期下沉及倾斜影响支架及组件的安装。


现要求施工单位在支架安装前做好灌浆工作，并报验监理方及业主方验收，验收合格后才能将进入下道工序施工。否则后续因管桩质量问题造成的一切损失由施工单位自己承担。

此通知单无需回复！

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日期：




责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日期：



本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-024

致：湘能楚天电力科技有限公司 施工项目部

事由：关于升压站基础平台吊装主变设备事宜

内容：

2021 年 12 月 25 日监理部人员检查发现，主变、SVG 设备平台东北侧部分地方临边防护做，工人临边作业存在重大安全隐患。业主及监理方经多次安全检查提醒、并 2021 年 12 月 19 日下发通知单再次提醒，你单位至今仍未进行整改。

现要求施工单位立即进行整改设置临边防护栏，否则后续发生的一切安全事故将由施工单位自己承担，并进行考核处罚。

限期 2 日内整改回复。
后附照片。

监理项目部（盖章）：
总/专业监理工程师（签字）：王东
日 期：2021.12.25

责任单位签收：

责任单位（盖章）：
项目负责人（签字）：王东
日 期：2021.12.25

本表一式____份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各____份。

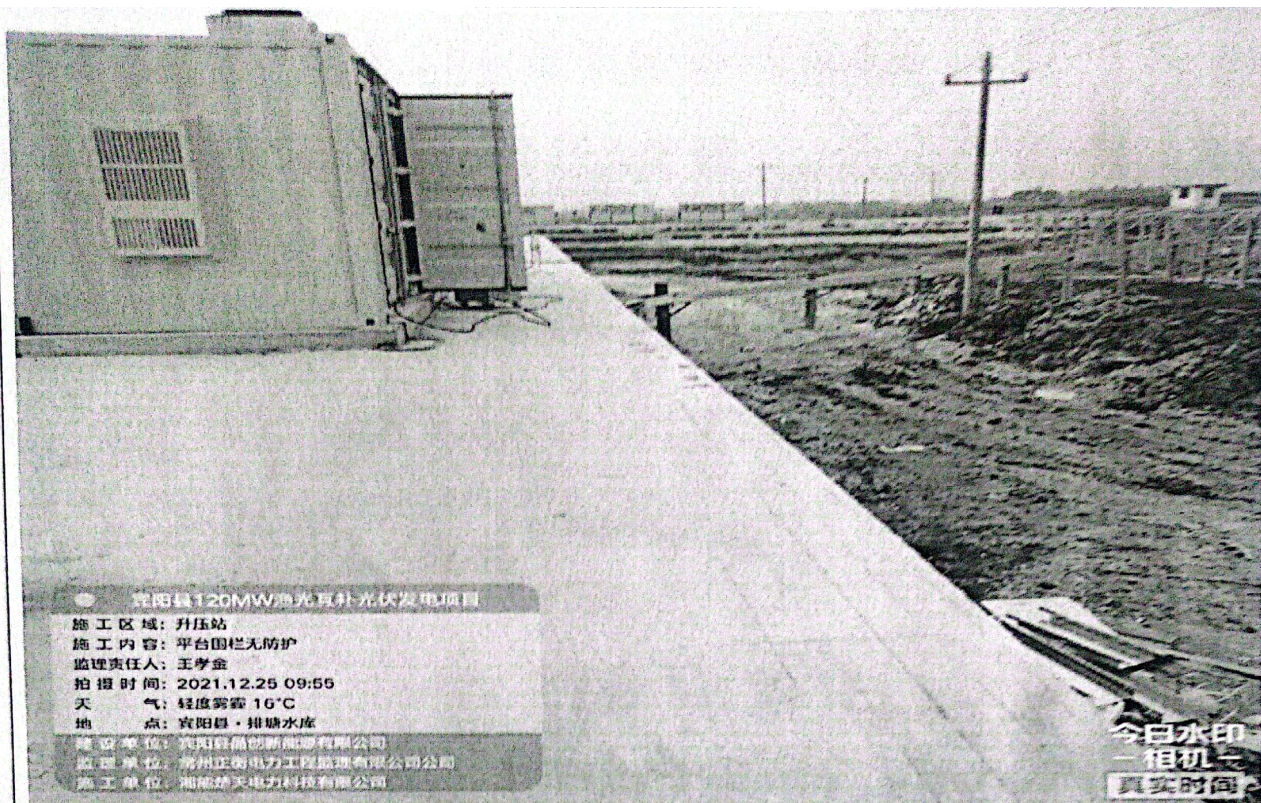


表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号: BD-B09-SG01-014

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理项目部)


我方接到编号为 BYXM-TZD-JC-024 的监理通知单后, 已按要求完成了工作, 请予以复查。

附件: 已进行整改左右。

承包单位 (盖章):

项目经理 (签字):

日期:



监理项目部复查意见:

1. 复查, 已整改完成。

监理项目部 (盖章):

总/专业监理工程师 (签字):

日期:



本表 (含附件) 一式 二 份, 监理项目部存 一 份, 承包单位存 一 份。
