

表 A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：BYXM-TZD-JC-044

致：四川仕麟建筑工程有限公司 施工项目部


事由：关于一标 13#、15# 方阵管桩桩顶防腐刷施工存在的问题通知

内容：

2022 年 03 月 15 日经监理项目部人员巡视检查发现，13#、15# 方阵预制桩桩顶防腐涂料不符合设计要求，图纸编号 TW-(BY)-(S) T0101-03 设计要求防腐底层为喷涂锌、铝金属覆盖层，再涂环氧密封底涂料、中间层涂刷环氧云铁 1 道，面层涂环氧、聚氨酯、丙烯酸环氧、丙烯酸聚氨酯等中间涂层 2 道。施工现场防腐涂料与设计图纸不符合。

要求施工单位把刷涂的不符合涂料及时打磨掉，再按照设计图纸进行防腐施工，每道刷涂经现场监理人员验收合格后方可进入下道工序施工。限期 3 日内整改完成，否则将按照业主考核制度进行罚款。

限期 3 日内整改回复！

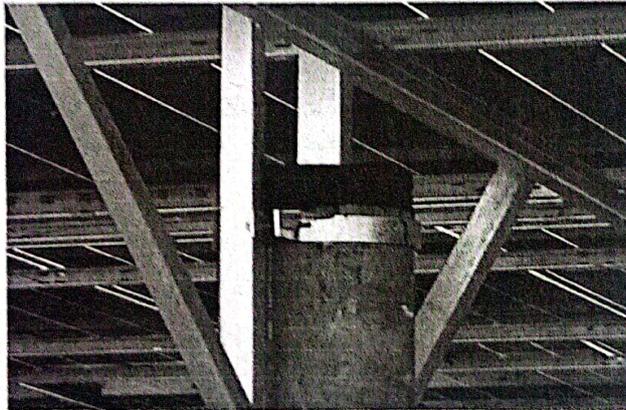

监理项目部（盖章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日 期：



责任单位签收：

责任单位（盖章）：

项目负责人（签字）：

日 期：



本表一式 份，监理项目部、建设单位（业主项目部）、承包单位各 份。

表 B.0.9 监理通知回复单 ★

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GF-SG02-022

致：常州正衡电力工程监理有限公司 项目监理机构

我方接到编号为：BYXM-TZD-JC-044 的监理工程师通知后，已按要求在规定的时间内完成了：
现场整改工作，请予以复查。

详细内容：

经监理项目部人员巡视检查发现：13#、15#方阵预制桩桩顶防腐施工不符合设计要求，施工现场防腐涂料与设计图纸不符合。

附 1：整改情况：

1、已完成 13#、15#方阵预制桩桩顶防腐施工不符合设计要求，施工现场防腐涂料与设计图纸不符合的整改工作。

承包单位（章）：四川仕麟建筑工程有限公司

项目经理：韩金星

日期：2022 年 03 月 18 日

项目监理机构复查意见：

复查合格，符合要求。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：付金堂

日期：2022.03.19

填报说明：本表一式 三 份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。
