

监理通知单

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-TZ-001

致：浙江西子联合工程有限公司施工项目部



抄送：阳西县必奥光伏发电有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

贵单位承建的【阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目】工程，11月 29 日 9 点，监理人员在现场巡视过程中发现，有个别施工人员安全帽帽带未系，临时电源私拉乱接并且没有插头，施工人员态度恶劣拒不配合整改，现场制止无果，施工人员安全意识较差。

现业主项目部及监理项目部要求贵单位停工整顿，现场项目经理给施工人员做好安全培训，安全技术交底必须要有施工人员签字，通知回复单后附安全技术交底报监理项目部，监理项目部审核后恢复施工，后期如发现类似行为，将对贵单位进行经济考核。

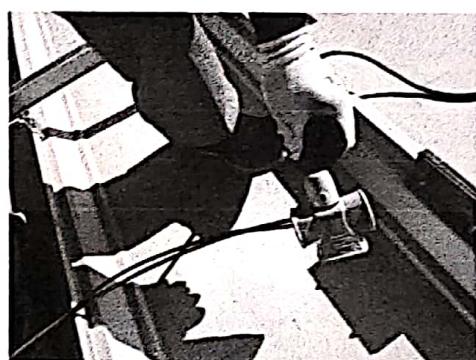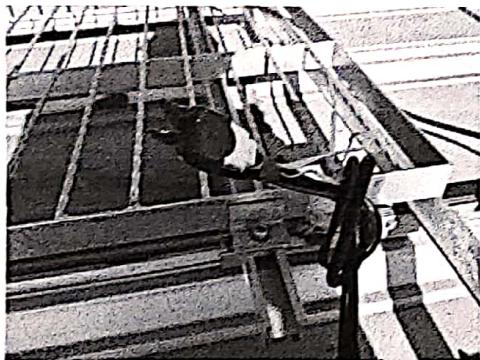

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份



扫描全能王 创建
