

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-005

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场验收质量相关事宜

经监理部现场验收支架安装发现问题：

- 1、部分支架安装螺栓未紧固，影响工程质量。
- 2、个别三角件、支架立柱、支架底座存在严重锈蚀，影响施工质量。
- 3、部分支架螺栓存在发黑、泛白、锈蚀严重，不符合要求。
- 4、个别檩条紧固垫片未按要求紧固，影响工程质量。
- 5、现场组件堆放保管不到位，存在隐裂风险，影响工程质量。

上述问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、要求对未紧固支架进行紧固。2、要求对锈蚀的支架材料进行更换。3、要求对锈蚀的紧固件进行更换。4、要求将紧固件垫片进行改正。5、加强现场管控，做好成品保护。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：刘奇奇

日期：2021年12月19日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附页:




个别三角件锈蚀严重




部分支架紧固件锈蚀



部分支架安装未紧固

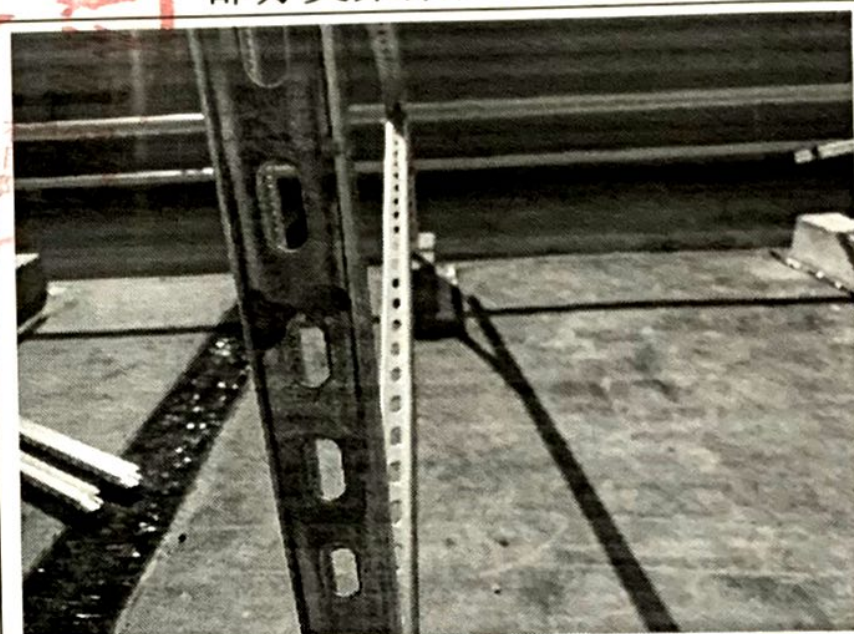

个别支架立柱锈蚀

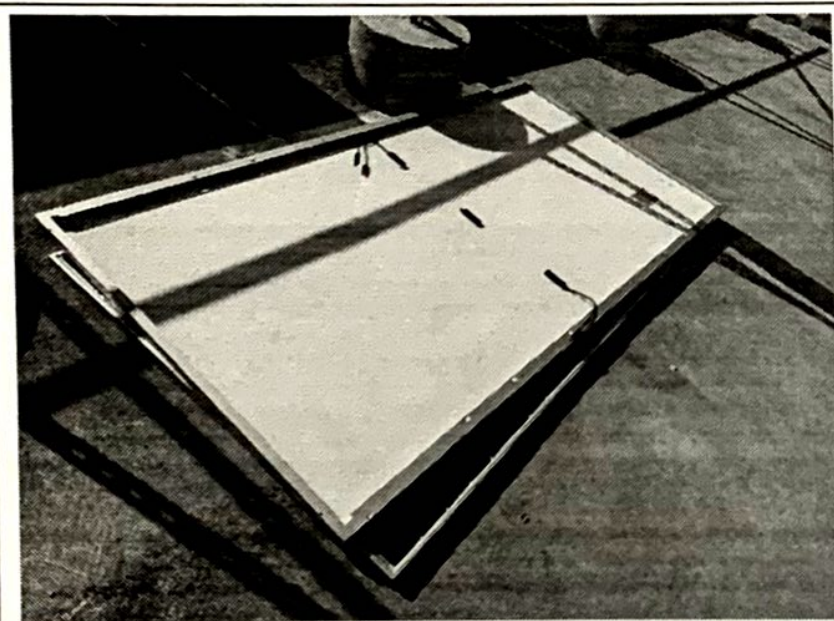

组件堆放管控不到位
