

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-008

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场质量相关事宜

经监理部现场巡视发现以下问题：

- 1、部分组件安装参差不齐，不符合设计要求。
- 2、部分桥架未验收进行私自盖板，严重影响工程质量。
- 3、电缆敷设两端未做保护，严重影响工程质量。
- 4、由于现场问题，图纸多次变更，我方未收到最终蓝图。

上述问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、要求将参差不齐的组件进行整改处理。2、要求将进行拆除，验收后安装。3、要求对电缆进行防护。4、要求两日内将变更图纸上报监理部。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。如拒不整改，我方将进行经济考核及下发工程暂停令处理。望贵单位重视！限两日内回复。

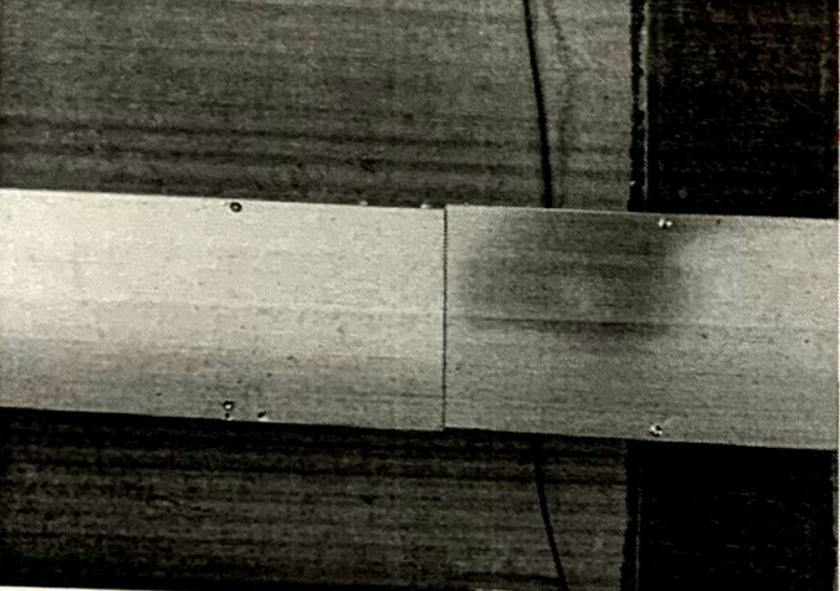
监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李俊平

日期：2022年1月2日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附页：

	
组件参差不齐	电缆两端未做保护
	技（江苏）有限公司 分布式光伏项目（一期） 工程管理部
桥架已盖板	
