

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-001

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场安全文明施工及现场材料相关事宜

经监理部现场巡视发现问题：

- 1、现场施工区域未见任何安全警示、提醒标示标语，无任何安全文明施工迹象。
- 2、部分三角件及支架出现锈蚀、镀锌层掉落，不符合设计及规范要求。
- 3、支架紧固件镀锌层氧化严重，影响施工质量。
- 4、部分水泥基础破损，影响施工质量。
- 5、至今为止已开工数日至今未见施工图纸及报审资料。

上述问题照片详见附页。鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、现场施工区域必须张贴安全警示、提醒标语。2、要求将三角件及支架进行返厂更换处理。3、要求对紧固件进行退厂处理。4、对破碎水泥基础进行更换。5、要求出具施工蓝图及报审资料。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李俊平

日期：

年

月


日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附页



紧固件镀锌层氧化严重

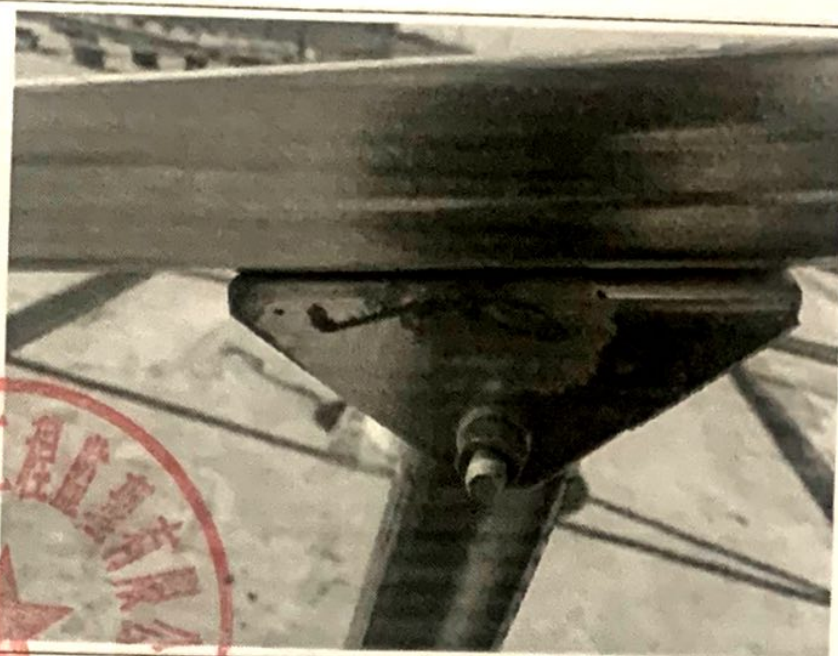


三角件锈蚀



三角件镀锌层掉落



支架镀锌层掉落

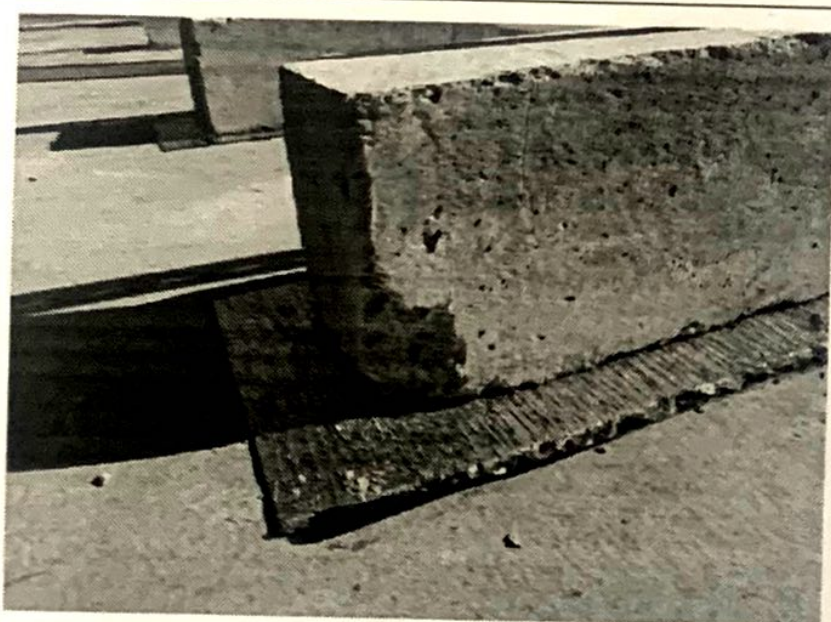

水泥基础破损
