

监理通知单

工程名称：飞荣达科技（江苏）有限公司 4.78MW 分布式光伏发电项目（一期）

编号：ZHJL-FRD-TZD-002

主送：江苏希源电力建设有限公司

抄送：国网常州综合能源服务有限公司

内容：关于现场材料及吊装安全相关事宜

经监理部现场巡视及检测材料发现以下问题：

- 1、检测发现三角件存在镀锌层不符合规范要求，影响工程质量。
- 2、吊装水泥基础所用托盘为木质并且固定不牢固，存在严重安全隐患。
- 3、支架安装存在扭曲，不符合要求。上述问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、要求将三角件进行返厂处理。2、要求更换铁质托盘并且固定水泥基础，杜绝安全隐患。3、要求对支架安装进行整改。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。如拒不整改我方将进行经济考核及下发工程暂停令处理。望贵单位重视！限两日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李俊平

日期：

年 月 日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。


附页



三角件实测数值



木质托盘并且水泥基础未牢固

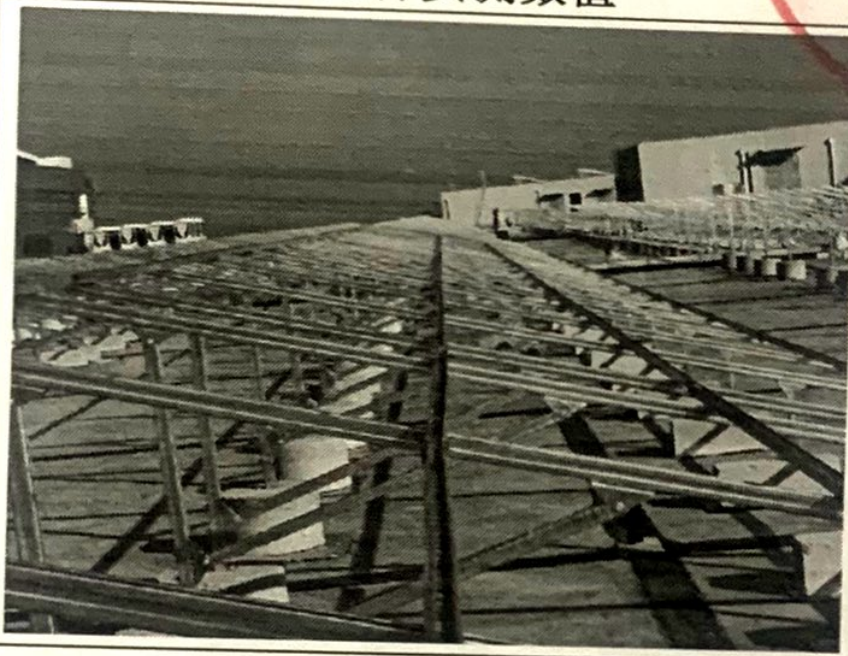

支架安装扭曲
