

监理工程师通知单

工程名称：高州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZ20-YZ/JN-TZ-032

致：山东力安电力设计咨询有限公司施工项目部，

主题：关于升压站主变区至事故池地埋管施工事宜，

内容：

贵项目部 2023 年 06 月 17 日在对升压站施工进行检查时发现，

1. 主变区至事故池地埋管材料规格与之前主变区、事故池地埋管材料规格型号不一致，经查阅图纸可以看出管径规格厚度差距过大，
2. 此批管径材料进场未通知监理单位验收，
3. 施工过程中未按照此工序管径规格型号（壁厚），
4. 主变区至事故池地埋管未按设计要求埋设，
5. 事故池至升压站主变区至事故池地埋管被截断，

特此：

施工单位与设计单位相关专业人员联系沟通，注明此工序管径规格型号，监理单位要求禁止使用该产品，待设计批复后方可进行此工序施工，否则所产生的质量问题等一切后果由施工单位承担，

附：现场照片


监理单位（章）

总/专业监理工程师：王立军


日期：2023年6月17日

附件：事故池至升压站主变区至事故池地埋管被截断，



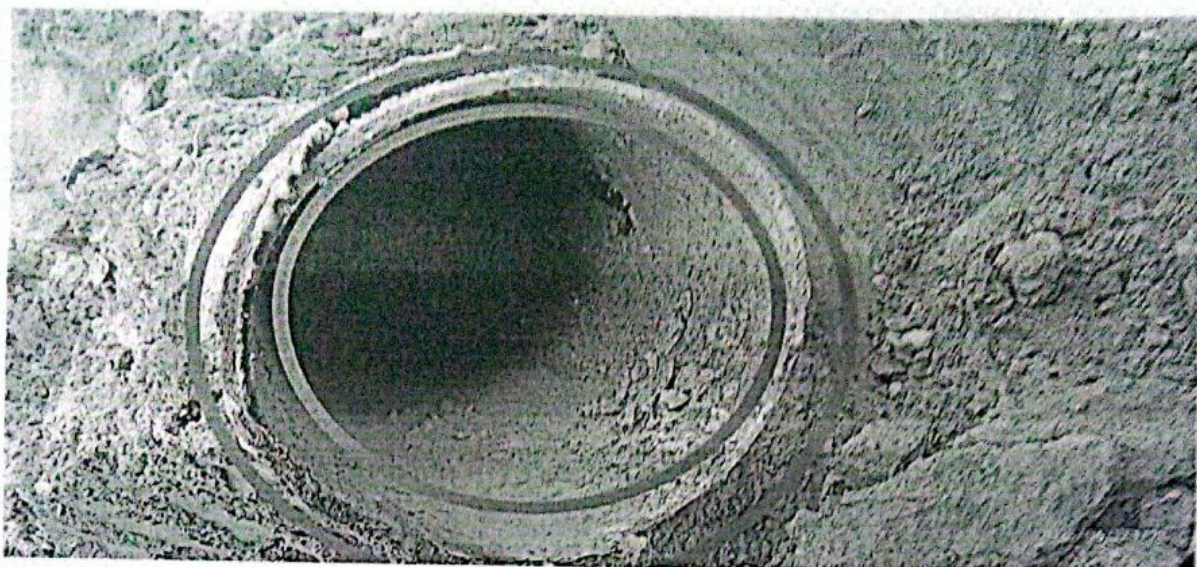

主变区预埋镀锌钢管壁厚

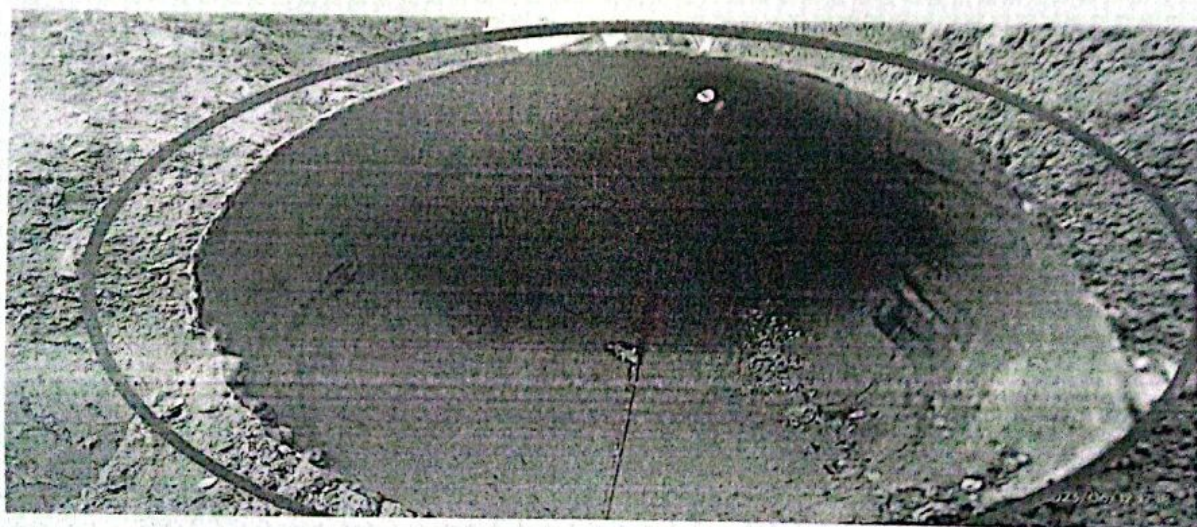

现铺设镀锌钢管壁厚




因镀锌钢管壁厚太薄，被焊机烧透





因镀锌钢管壁厚太薄，被钩机碰撞导致凹陷

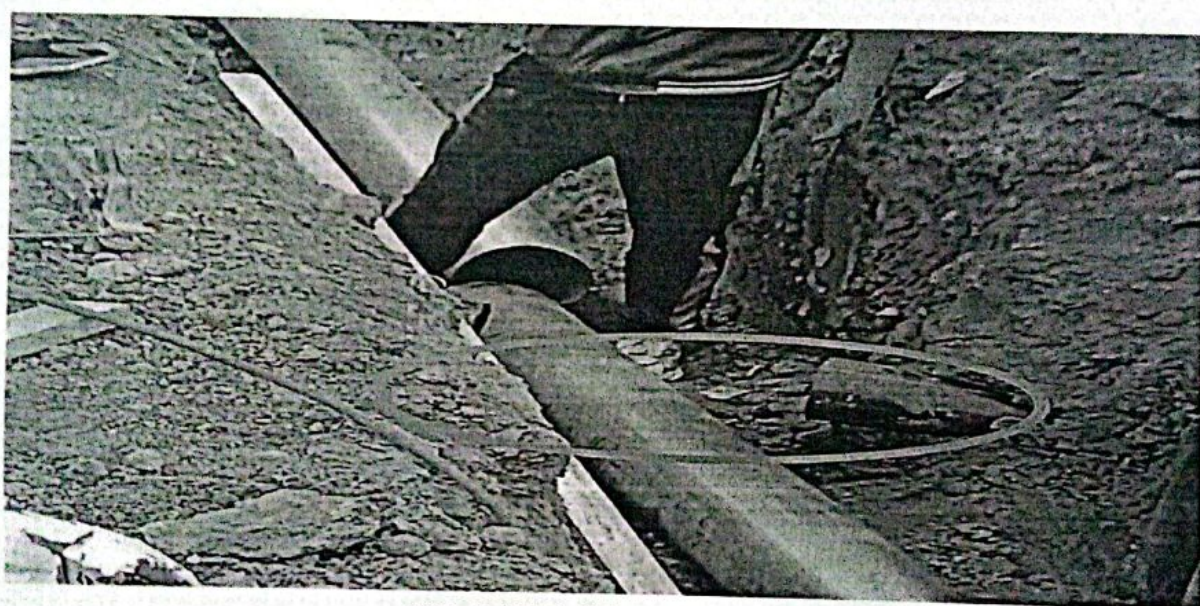

消防水管切割断开



主变区两条接地扁铁连接主接地网被钩机挖断

