

监理工程师通知单

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-037

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部：

主题：关于光伏区施工受阻及首并网区域停、发送电相关事宜；

内容：

1、自 2023 年 09 月 13 日 15.45 分首并网区域（1#-3#光伏方阵）拉闸停电（前期拖欠劳务费人员所为），截止今日（2023 年 09 月 23 日）首并网区域（1#-3#光伏方阵）仍然处于停发电状况。

2、首并网区域 2#、3#光伏方阵汇流箱箱体门自 2023 年 09 月 13 日未敞开，未按操作有关规程进行合体关闭、上锁，截止今日（2023 年 09 月 23 日）监理项目部与运维部共同对光伏区现场巡查，发现此问题依然存在，存在着重大安全隐患。

3、自 2023 年 09 月 13 日阻工至今已有 11 天，严重影响到施工进度。

要求：

1、现要求你方尽快解决阻工事宜，尽快恢复正常施工作业，确保施工进度计划有序推进，对已安装完成的光伏组件方阵要陆续并网发电。

2、首并网区域（1#-3#光伏方阵）立即恢复正常发送电状况，并对汇流箱内电气元件进行检查、测试（停发送电期间因箱体门未关，经多次雨淋）。

附：现场照片

监理项目部（章）


总监理工程师：王立杰

日期：2023 年 09 月 23 日


填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。




2023 年 09 月 13 日阻工现场

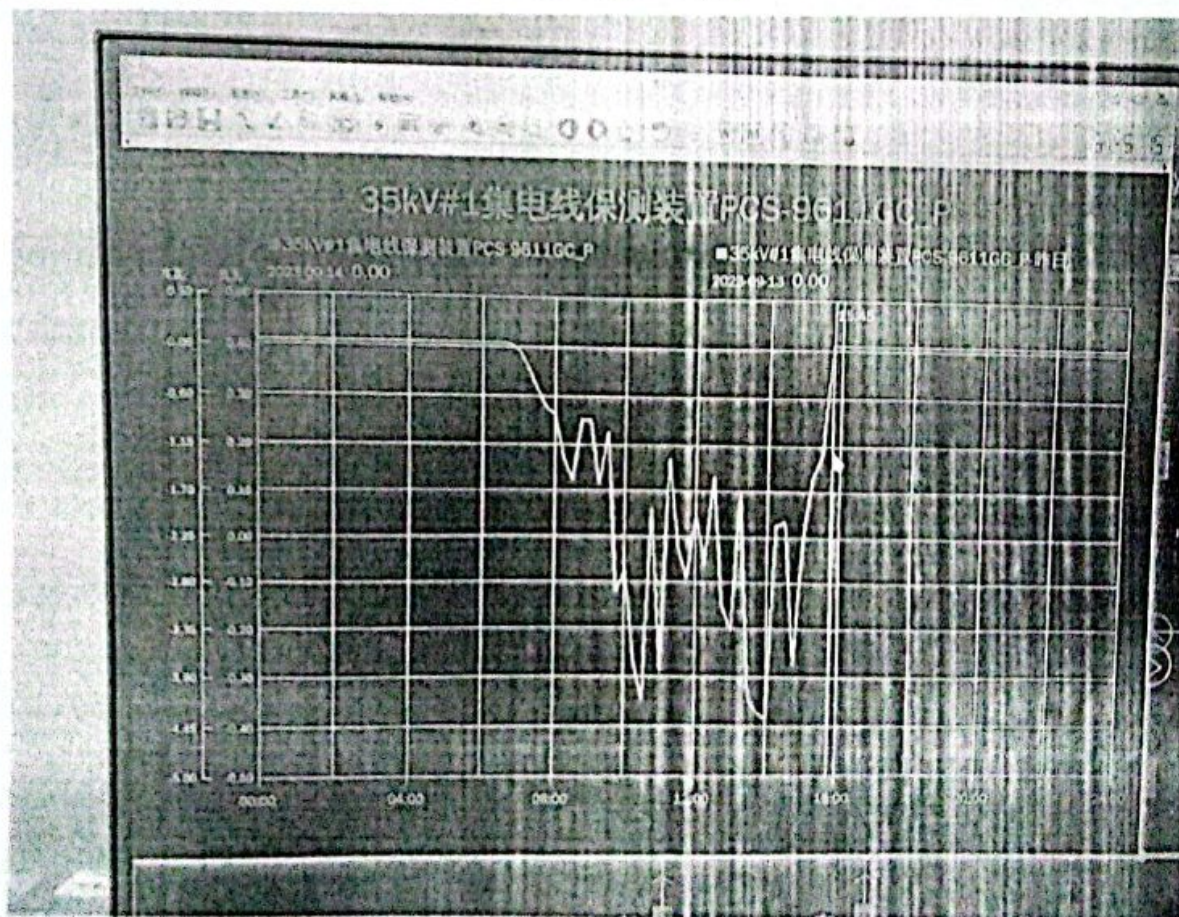

2023 年 09 月 13 日下午 3.45 分 1#-3#光伏方阵停送电

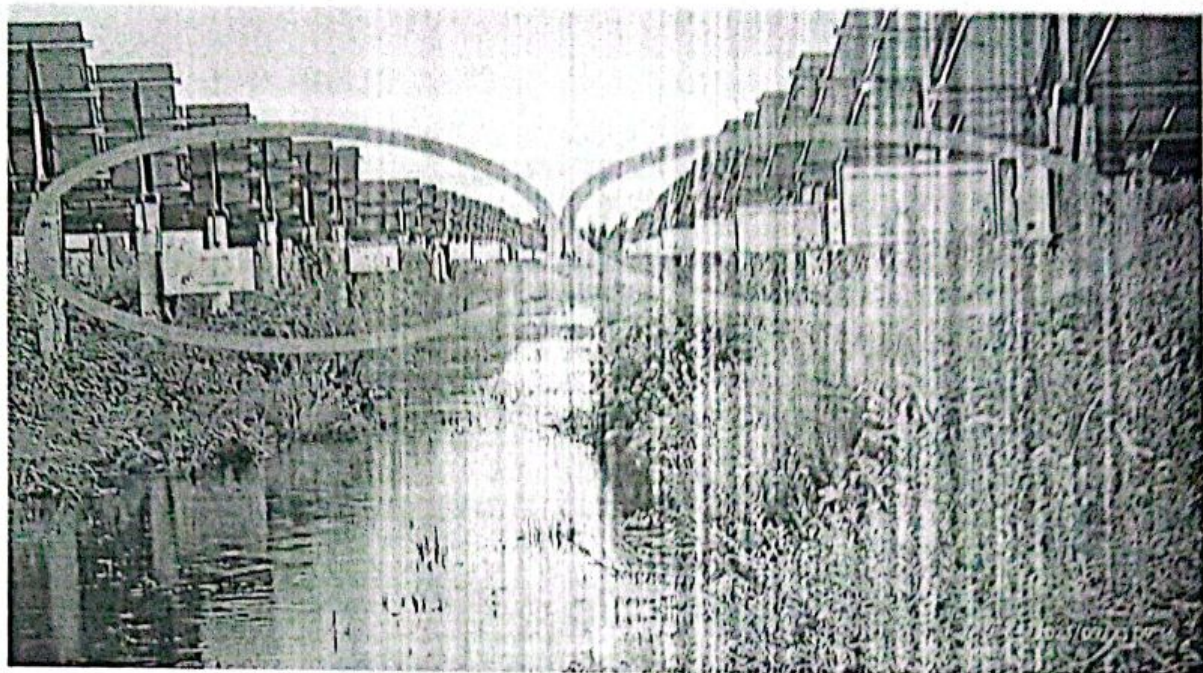

2023 年 09 月 23 日 2#、3#光伏方阵汇流箱箱体门未关闭



2023 年 09 月 23 日运维部显示处于停电状况
