

监理工程师通知单

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：CZZH-YZJN-TZ-040

致：山东力诺电力设计咨询有限公司施工项目部；

主题：关于升压站综合楼墙体内抹灰事宜；

内容：

1、根据《综合楼结构图》（结构设计总说明二）第九填充墙要求第 11 条：为防止填充墙与主体.....（若采用加气混凝土砌块填充墙体，则墙体砂浆面层均应满挂钢丝网）。

2、监理项目部在 2023 年 11 月 16 日对升压站检查时发现：综合楼内墙未挂钢丝网，外墙女儿墙未挂钢丝网，抹灰前，监理项目部人员多次提醒分包现场负责人，按设计要求进行挂钢丝网。

现监理项目部要求：已抹灰的墙面进行整改，未抹灰的墙面按设计要求进行挂钢丝网，完成后，报监理项目部验收，验收合格后，方可进行下道工序施工。否则，一切后果由你方承担。



附：现场照片

监理项目部（章）

总监理工程师：王立杰

日期：2023 年 11 月 16 日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

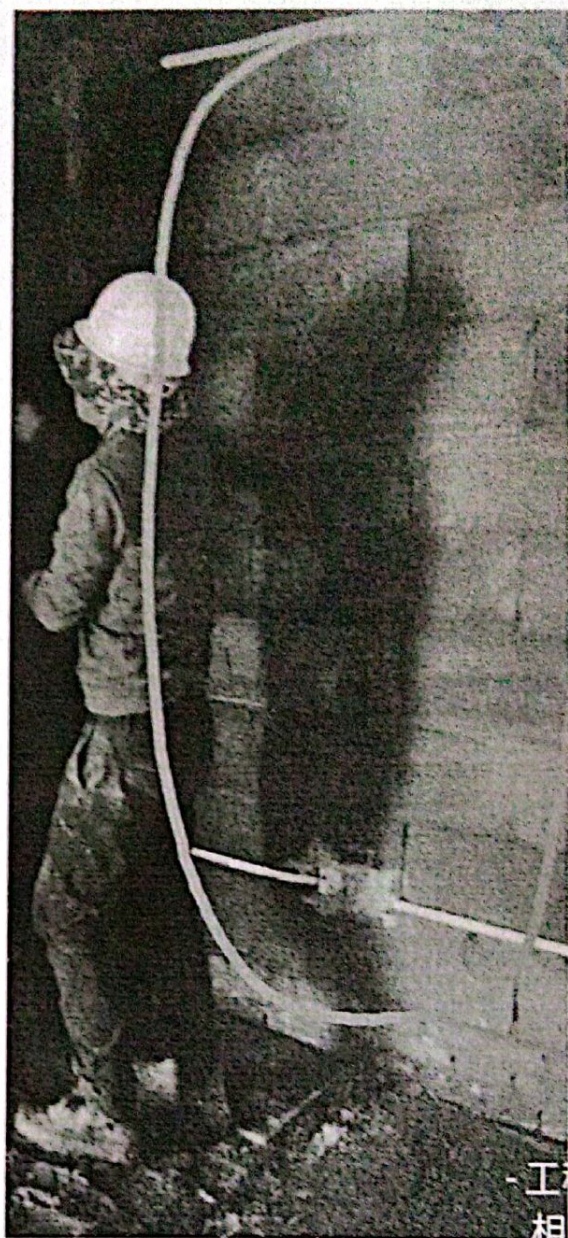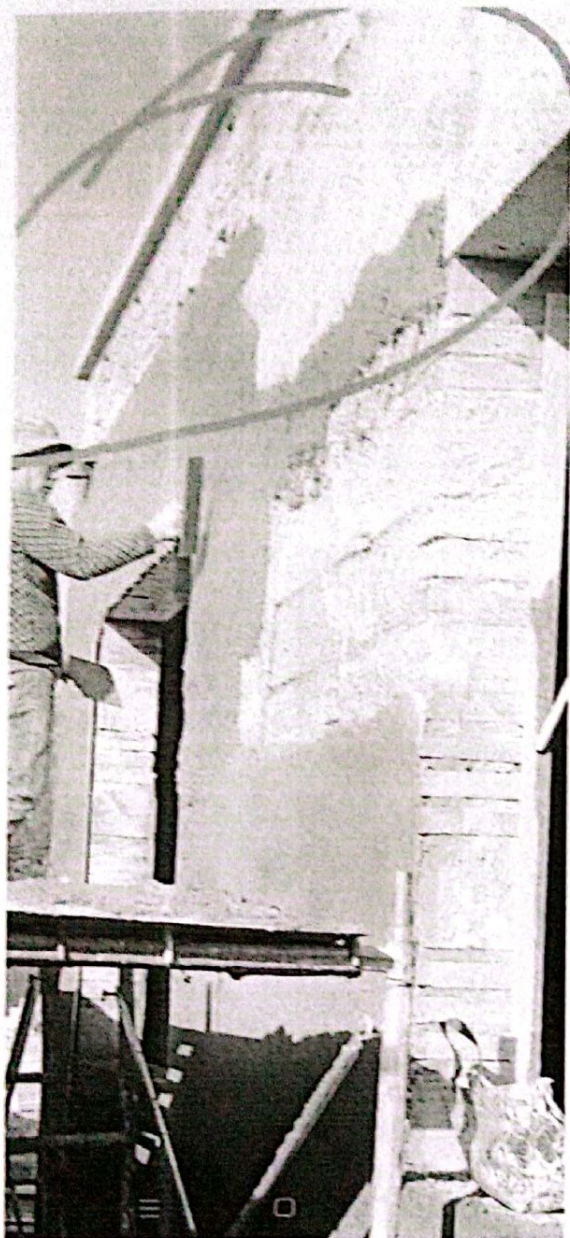


内,沿墙全长贯通,做法见图三。

10.女儿墙构造柱截面及配筋同构造柱,间距不大于3m,且端部及转角处设置,长度大于12m时增设中间柱,出入口处间距不大于2m。

11.为防止填充墙与主体连接处的墙体开裂,在砌体填充墙与柱、剪力墙、梁接缝处设钢丝网片,每边伸入填充墙与砼构件各不小于150mm,钢丝直径应不小于2mm,网眼尺寸25×25mm为宜,表面分层抹水泥砂浆。(若采用加气混凝土砌块填充墙体,则墙体砂浆面层均应满挂钢丝网。)

十、预埋件及预留孔洞



墙顶与梁
