

监理工程师通知单

工程名称：南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

编号：CZZH-NTKWX-TZ-003

致：江苏正业电力发展有限公司施工项目部：

主题：关于工程缺陷整改问题

内容：关我监理项目部对现场初检验收发现存在以下缺陷：

- 1) 屋顶防雷接地网扁铁焊接处未做除锈刷防腐漆，以及未刷黄绿漆接地标识（图 1）；
- 2) 屋顶防雷接地网扁铁锈蚀（图 2）；
- 3) 电缆桥架盖板未安装固定，且连接处缺少跨接地线（图 3）；
- 4) 并网柜基础角钢与并网柜焊接处未除锈刷防腐漆（图 4）；
- 5) 并网柜没有箱壳体做保护，不符合图纸设计（图 5）；
- 6) 光伏逆变器支架焊接处未做除锈刷防腐漆，以及逆变器雨棚未安装（图 6）；
- 7) 电缆穿管保护未做防火封堵（图 7）。

针对以上问题请贵公司施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并 2 日内进行回复。

附：图片

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王强

日期：2021 年 12 月 23 日

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备



图 1

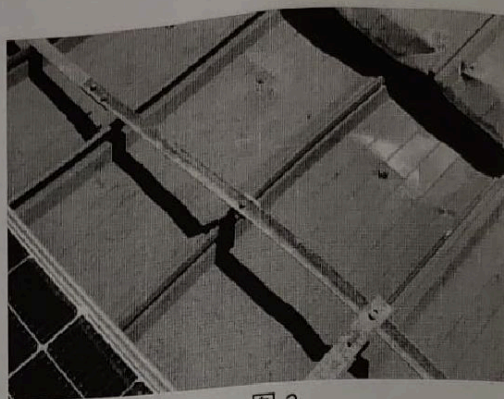


图 2

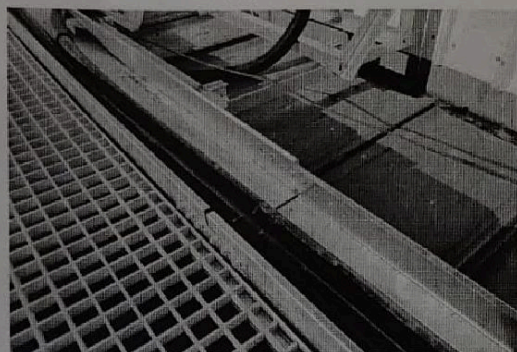


图 3

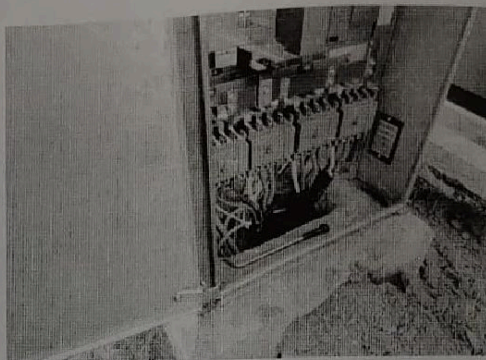


图 4

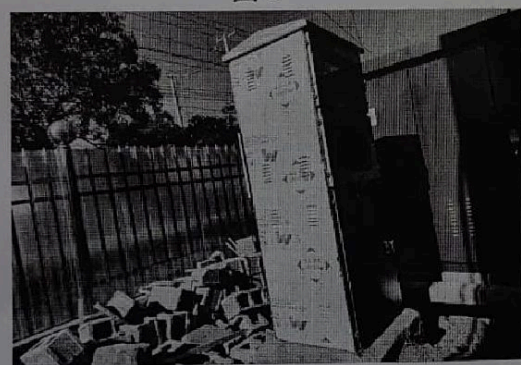


图 5

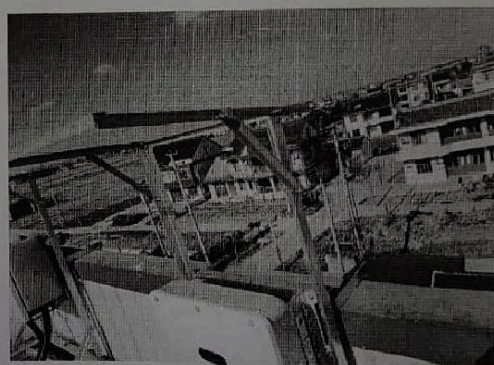


图 6

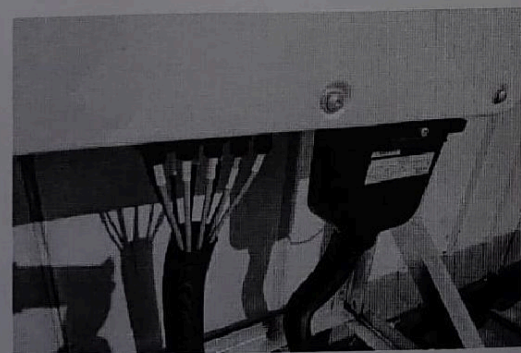


图 7

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备
