

监理工程师通知单

工程名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目（20.34MWp）

编号：JXM7-ZHJL-AQ-TZD-001

主 送：海宁科茂微电网技术有限公司

抄 送：长兴智旺新能源科技有限公司

内 容：关于厂房屋面临边无安全防护措施等存在安全隐患等相关问题

经监理部现场巡视检查发现你贵正在整改和施工的二期、三期、四期厂房施工存在相关安全隐患，施工人员生命安全得不到保障，具体如下：

1、6#屋面临边女儿墙原临边高度未达到安全规范要求 1050mm、屋脊采光房临边高度超过 2 米，施工现场无安全防护和警示标识标语，临边重点区域无安全监护人员监护。施工点较多，人员走动性大，其它厂房存在同样问题。

2、三期四期吊装作业时，现场吊装作业措施不到位，下方吊装区域周围安全警示带拉设不规范、无警示提醒标识，人员监护不到位；未做好对屋面保护措施；所有吊至屋面材料未及时分散。

3、施工现场区域存在使用拖线板现象，无漏电保护功能；加固加工区三级箱接地不规范，且箱体直接放置在地面上，应用支架固定且底部距地面不小于 60 公分高；三级电源箱无日检表，未做到每日一检；焊机未接地，现场焊工人员未见焊工证相关证件以备查；用电设备未做到“一机一闸一漏保”保护要求，无合格准入标识。

4、施工现场所有上下爬梯处未悬挂安全警示和指引标识。

5、个别脚手架连接锁销处使用焊条绑扎。

6、材料加工及堆放区域无防护围栏，安全防护不到位。

鉴于上述问题要求你单位对现场整改，杜绝安全隐患发生，严格按照相关安全规范文件和业主公司相关指导性文件要求执行，务必重视，举一反三，保证施工安全，确保工程安全推进。

以上问题限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：_____



本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份

1、临边无防护措施



2、临边无防护措施，施工人员安全意识淡薄



3、采光房临边无安全防护和警示标识



4、屋面彩钢瓦保护措施不力，彩钢瓦变形




5、电源箱使用不规范



6、电源箱接地安装不规范



7、设备用电不规范

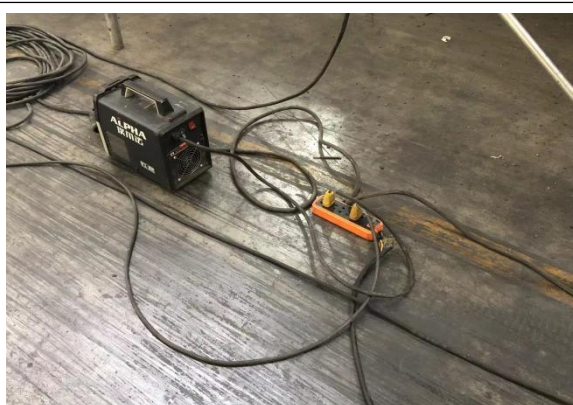

8、上下爬梯无安全警示和指引标识

