

监 理 通 知 单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用光伏项目

编号：SHHY-ZHJL-TZ-001

致：宁波联兴能源科技有限公司施工项目部

主题：

关于厂房内屋顶 C 型钢连接件加固材料及屋面除锈喷漆防腐质量的问题

内容：

- 1、用于厂房内屋顶加固所使用热镀锌 C 型钢连接件镀锌层厚度抽检均为 0.00μm，镀锌层厚度不满足设计要求厚度。
- 2、10号屋面彩钢瓦除锈喷漆后短期内仍出现生锈现象。

整改要求：

- 1、加固 C 型材料已在金兴项目出现此问题，博大项目材料进场我方已检出问题并现场提出整改通知，仍在第二天、第三天现场巡视发现继续安装不合格材料。
- 2、已加固完成的热镀锌 C 型钢全部拆除，材料清理出场。
- 3、加固 C 型钢安装中中间四孔未开未穿螺栓，要求安按照图纸开中间四孔正确安装螺栓。
- 4、对完成的 10 号屋面彩钢瓦除锈喷漆返锈做返工处理。
- 5、再次进场热镀锌 C 型钢连接件材料总包单位按程序报审，经业主、监理现场检查验收合格后方可使用。
- 6、如在发生加固类似问题我方将进行经济考核。
- 7、上述监理部提出的 5 项整改要求 2 日内整改回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：杨领锐

日 期：2022 年 6 月 15 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-NBLX-TZHF-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到贵司的监理通知单 001，已将不合格材料进行退场处理，加工合格后再入场使用；已安排人员重新对 10 号厂房彩钢瓦屋顶进行二次喷漆。

施工项目部（章）：

项目经理：王林

日期：2022.6.16



复查意见：

已整改

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：梅铁军

日期：2022.6.19



注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

监 理 通 知 单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用光伏项目

编号：SHHY-ZHJL-TZ-002

致：宁波联兴能源科技有限公司施工项目部

主题：

关于现场安全文明施工事宜

内容：

- 1、施工阶段天气炎热，现场未见任何防暑物品及措施。
- 2、爬梯口未见安全警示标识及防坠器。
- 3、现场材料周围未设置警示带等警示标识。
- 4、专职安全员未见。
- 5、加固焊接区域未见警示带及灭火器防火毯等安全标识及防火措施。
- 6、现场材料加工区域脏乱，每日下班前做好卫生整理，关闭临时用电。
- 7、尽快提交夏季安全施工专项施工方案。

以上问题（部分见附件）限你单位 24 小时内进行回复，如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：2022 年 6 月 16 日



注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

监理通知回复单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-NBLX-TZHF-002

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到贵司的监理通知单 002，已采购防暑药品及冰箱、冷饮等降温物品；爬梯口、材料堆放处已粘贴警示标识；已落实专职安全员在现场进行监督检查；加固焊接区域安排专人进行监护，并配备灭火器；已要求施工班组每日施工结束后，进行场地清理，并关闭临时电源；已安排人员进行夏季安全施工专项方案的编制，完成后进行报审。

施工项目部（章）

项目经理：杨建强

日期：2022.6.17



复查意见：

已整改

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：杨建强

日期：2022.6.20



注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

监 理 通 知 单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用光伏项目

编号：SHHY-ZHJL-TZ-003



致：宁波联兴能源科技有限公司施工项目部

主题：

关于现场 1#3#4#屋面夹具拉拔试验事宜

内容：

今日我方及业主方现场进行夹具拉拔试验发现 1#3#4#均未达到图纸设计 1.5KN 要求, 其中拉拔点 1#3#屋面在 0.5KN 左右夹具脱落, 4#屋面在 1.2KN 出现夹具脱落及夹具断裂现象。

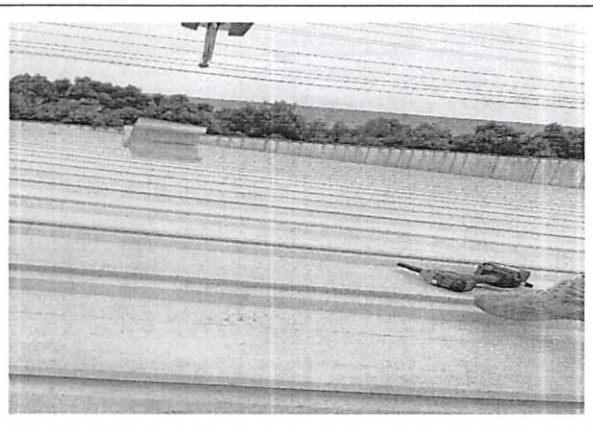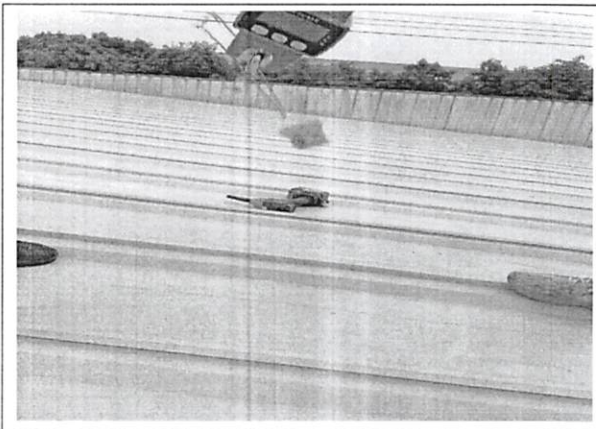

整改要求：

- 1、对已安装夹具的屋面进行复测，夹具抗拔力必须满足图纸设计要求。
- 2、对现场断裂夹具进行送检。

以上问题限你单位 24 小时内进行回复，如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日 期：2022 年 6 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-NBLX-TZHF-003

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到贵司的监理通知单 003，对部分屋顶的彩钢瓦重新进行加固，对夹具的安装重新进行检查及紧固，确保夹具的拉拔力满足要求。

施工项目部（章）：

项目经理：李松涛

日期：2022.6.27



复查意见：

已整改

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：杨钰银

日期：2022.7.1



注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

监 理 通 知 单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZ-004

致：宁波联兴能源科技有限公司施工项目部

主题：

关于现场电缆过路段未穿镀锌钢管事宜

内容：

今日我方及业主方现场巡视发现，7#厂房某处电缆过路段未按图纸设计要求穿镀锌钢管。



整改要求：

1、严格按照图纸要求，过路段电缆穿镀锌钢管施工。

以上问题限你单位 24 小时内进行回复，如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 汤铃铃

日期： 2022 年 07 月 08 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-NBLX-TZHF-004

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到贵司的监理通知单 004，由于抢工期，暂未进行整改，后期并网后，竣工验收前进行消缺整改，如未进行整改，我方无条件接受经济考核。

。

施工项目部（章）：

项目经理：杨经经

日期：2022.7.9



复查意见：

已整改

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：杨经经

日期：2022.7.13



注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。

监 理 通 知 单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZ-005



致：宁波联兴能源科技有限公司施工项目部

主题：

关于现场直流电缆桥架及施工资料事宜

内容：

- 1、今日我方及业主方现场巡视发现，7#厂房某段直流线桥架规格过小直流线溢出，不符合图纸设计要求。
- 2、我方至今未收施工资料。

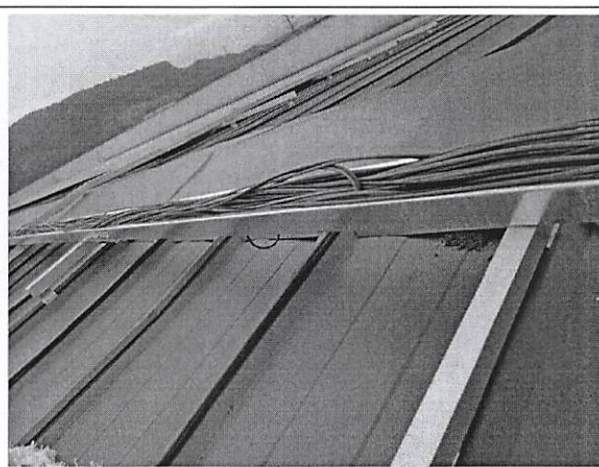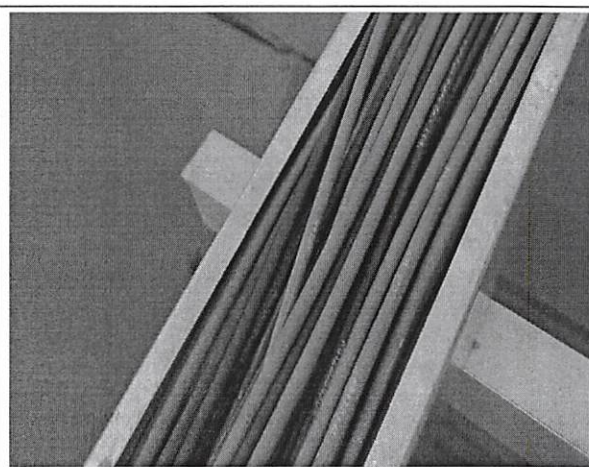

整改要求；

- 1、严格按照图纸要求，更换桥架。
- 2、要求你单位你单位尽快提交施工资料，监理人员撤场后，后期补充所有施工资料监理公司不再接收补签服务。

以上问题限你单位 24 小时内进行回复，如对本通知单有异议请于 24 小时内向监理部提出书面报告。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：杨松

日期：2022年07月23日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_1_份。

监理通知回复单

工程名称：无锡博大竹木业自发自用项目

编号：SHHY-NBLX-TZHF-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理机构）：

我方接到贵司的监理通知单 005，由于抢工期，暂未进行整改，后期并网后，竣工验收前进行消缺整改，如未进行整改，我方无条件接受经济考核；施工资料已安排人员进行编制，完成后进行报审。

。

施工项目部（章）：

项目经理：[Signature]

日期：2022.7.24



复查意见：

临场前未整改

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2022.8.14



注：本表一式三份，由施工单位填报，建设单位、项目监理机构、施工单位各一份。
