

# 监理工程师通知单

工程名称：南通博嵘金属科技自发自用项目

编号：SHFY-ZHJL-TZD-001

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工安全有关事宜。

内容：

- 一、施工现场无管理人员、专职安全管理人。
- 二、屋面采光带特别宽大，即无防护措施，也无警示措施，极易造成意外。
- 三、采光带必须都有专用的过道板

安全无小事，望你部尽快落实管理人员到位，采光带安全措施尽快落实，并在 03 月 18 日前回复。

项目监理机构（章）：

专业监理工程师：

日

期：

2022-03-16

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

# 监理工程师通知单

工程名称：南通铧嵘金属科技自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-002

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工有关事宜。

内容：我监理部在巡视中发现，你部在夹具施工中没有按图纸设计要求使用密封胶，而是用了防水涂料，不符设计要求，详见附件。



望你部接到通知单后认真整改，并在**03月25日**前回复。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日期：2022年03月23日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

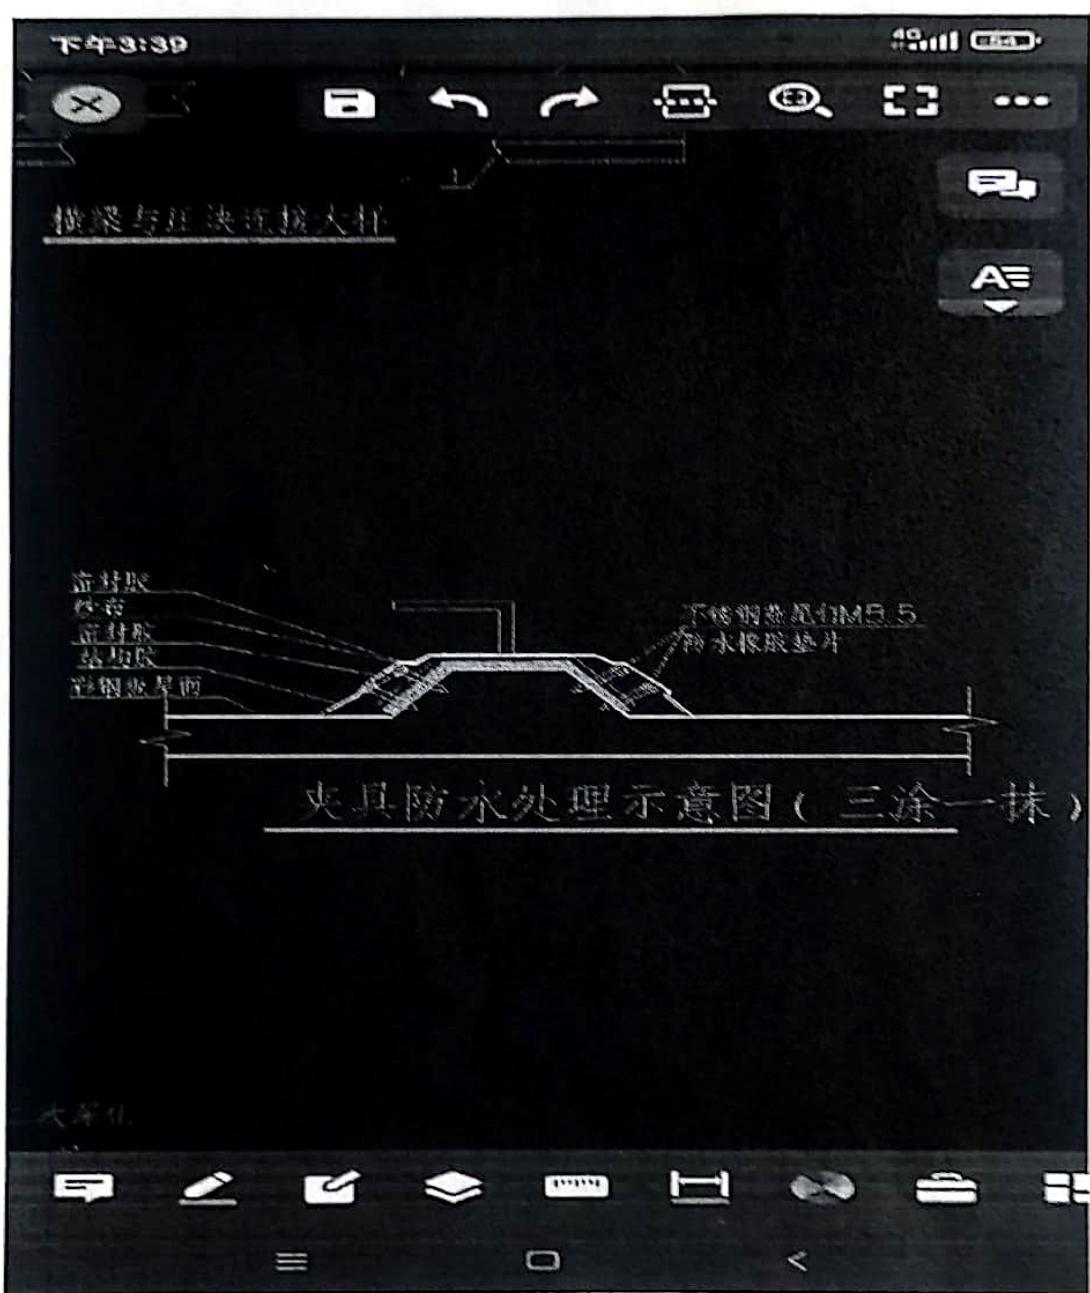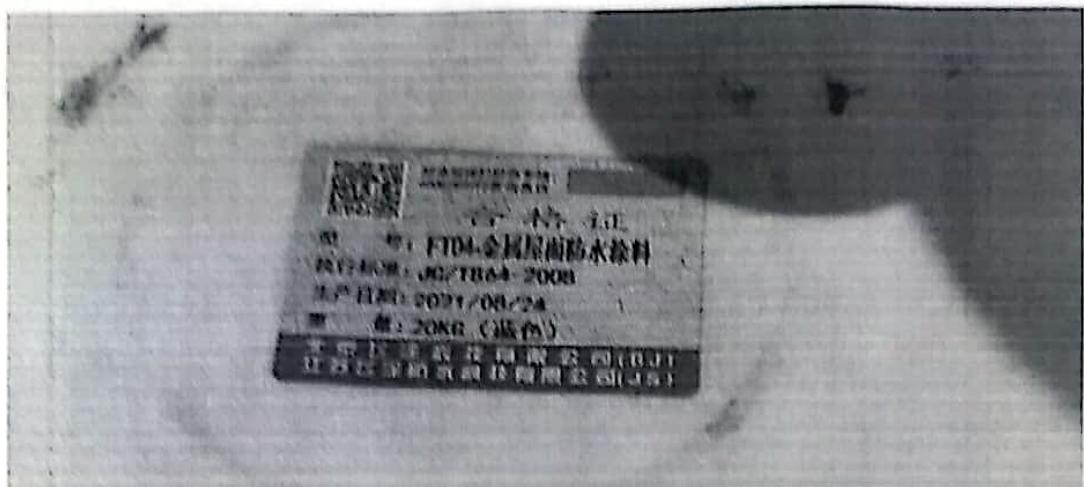

# 监理工程师通知单

工程名称：南通铧嵘金属科技自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-003

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工质量有关事宜。

内容：

本项目部在巡视中发现，桥架及走道支架未按图纸设计要求使用铝轨材料，不符合设计要求。

以上问题见附件，望你部尽快落实整改，请在 03 月 28 日前回复。



项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日

期：2022年03月26日

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

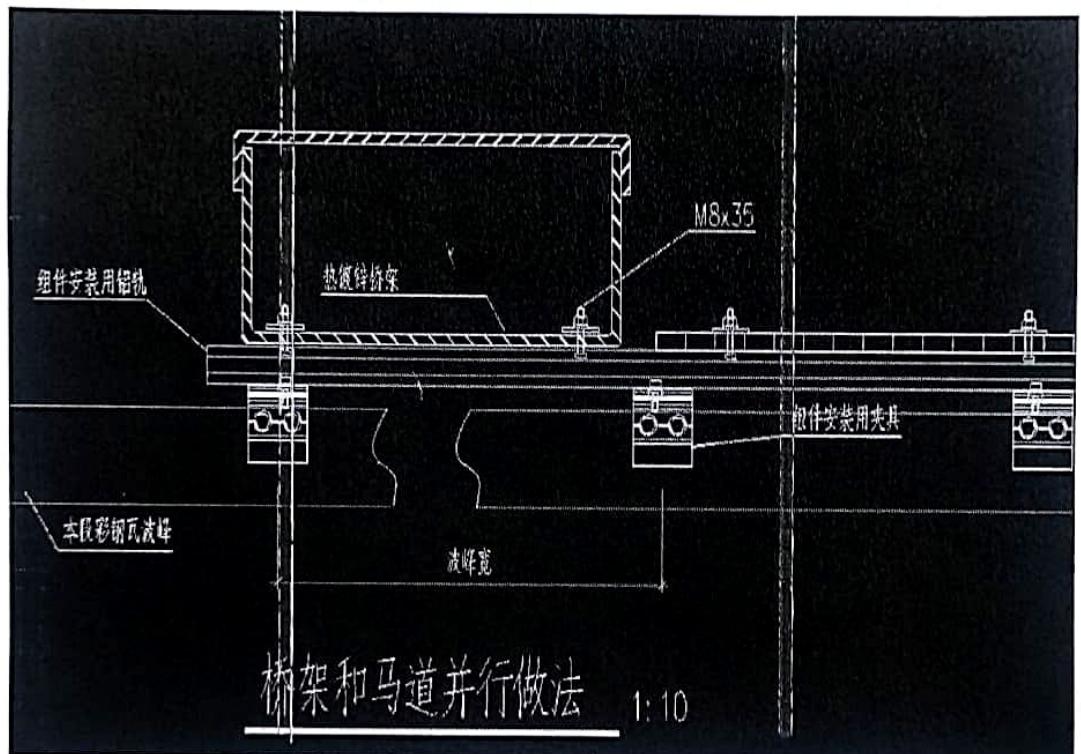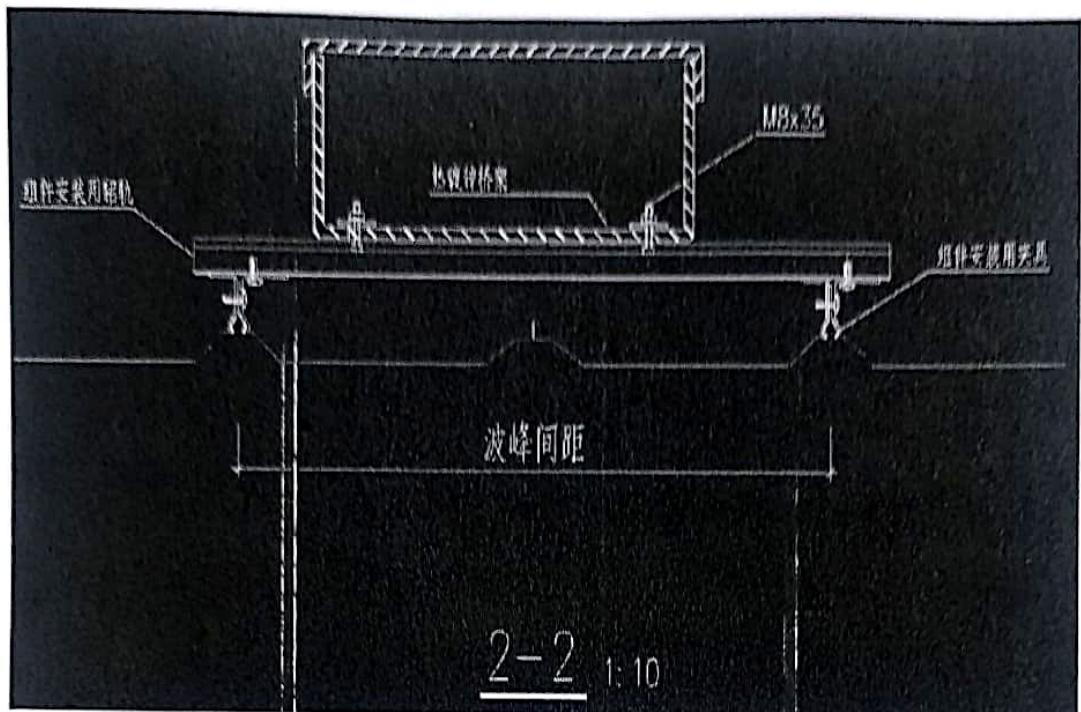

# 监理工程师通知单

工程名称：南通铧嵘金属科技自发自用项目

编号：SHHY-ZHJL-TZD-004

致：宁波联兴能源科技有限公司（项目部）

主题：

关于光伏施工质量有关事宜。

内容：

本项目部在巡视中发现，清洗系统管道未按设计材料清单要求使用金属水管材料，组串套管图纸要求是金属波纹管，而非塑料管和塑料复合管，逆变器雨蓬不符合设计要求。

以上问题望你部尽快落实整改，请在**04月5日**前回复。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：

日期：2022.04.02

填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
