

监理工程师通知单

工程名称：余姚市姚江科技投资开发有限公司（一期）615.6KWP 分布式光伏发电项目
编号：CZZH-YJKJYQ-TZ-007

致：浙江阳明电力建设有限公司：（施工项目部）

主题：交流电缆敷设安全质量事宜

内容：我监理项目部人员对现场施工巡查时，发现二号楼和五号楼交流电流在敷设过程中没有做好保护措施，导致交流电缆多处磨损，存在安全质量隐患，为后期电站安全运维，请贵单位针对电缆绝缘皮严重破损及局部电缆铠装破损编制整改方案，报审监理单位及建设单位，方案经审批通过后，方可对该电缆进行整改后报监理验收后方可进行隐蔽。若整改方案无法通过，我监理项目部建议采取更换电缆方案。

现我监理项目部要求你方施工单位对该工序部位施工暂停施工，待整改方案经监理单位和建设单位审批同意后，方可进行施工。

附：问题图片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改落实到位，并于2日进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022年06月22日


填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

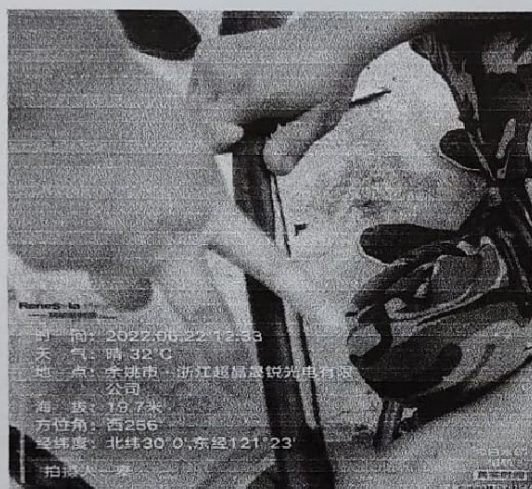

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备
