

监理工程师通知单

工程名称：余姚市家佳电器 200KWP 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-YYJJJQ-TZ-001

致：宁夏锐博电力工程有限公司浙江分公司：（施工项目部）

主题：进场材料质量事宜

内容：经我监理项目部人员对进场材料（预制水泥墩）检查时，发现预制水泥墩尺寸不符合图纸设计要求（前排水泥墩 300*300*300 mm，中排水泥墩 600*300*300 mm，后排水泥墩 600*300*300 mm）；强度等级不符合图纸设计要求（C30）。贵单位施工项目部在未经我监理项目部的同意下，私自将不合格材料（预制水泥墩）使用于该项目施工部位。

现我监理项目部要求你方施工单位项目部对该工序部位暂停施工，待不合格材料（预制水泥墩）更换符合图纸设计要求后，方可进行施工；或经建设单位同意该批次材料（预制水泥墩）使用后，方可施工。

附：问题照片

针对以上问题请贵单位施工项目部接到通知后，即刻进行整改，并于 2 日内进行回复，如逾期未进行整改的，后果自负。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[签名]

日期：2022




填报说明：本表一式__份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备

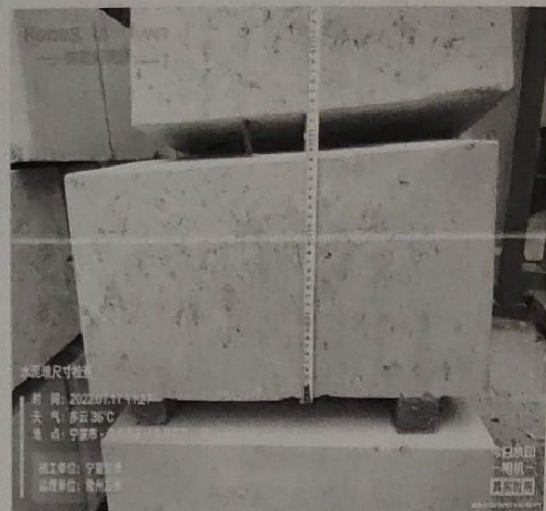

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备
