

## 监理通知单

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编号：ZHJL-HFTW-TZD-2025-001


致：浙江阳明电力建设有限公司（施工单位项目部）

事由：关于升压站室外防雷接地环网焊接存在质量问题的相关事宜

内容：监理工程师在施工现场巡视检查时发现，室外防雷接地环网施工存在以下质量问题：

- 扁钢焊接搭接倍数不合格，部分扁钢与扁钢之间的搭接长度小于扁钢宽度的 2 倍，且未做到至少三面施焊，不符合《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》（GB 50601-2010）第 4.1.2 条的相关规定及《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB 50169）的相关规定；
- 扁钢焊口的焊渣及飞溅未处理，防腐不合格，不符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（DLT 5852-2022）相关规定的要求；

以上问题严重影响防雷接地系统的质量和安全性，可能导致接地电阻不达标，无法有效发挥防雷作用，存在较大的安全隐患，现要求你单位在接到本通知后 2 日内，针对上述问题进行全面整改。整改完成后，及时通知我方进行复查，若逾期未整改或整改仍不合格，我方将依据相关规定和合同条款进行严肃处理。

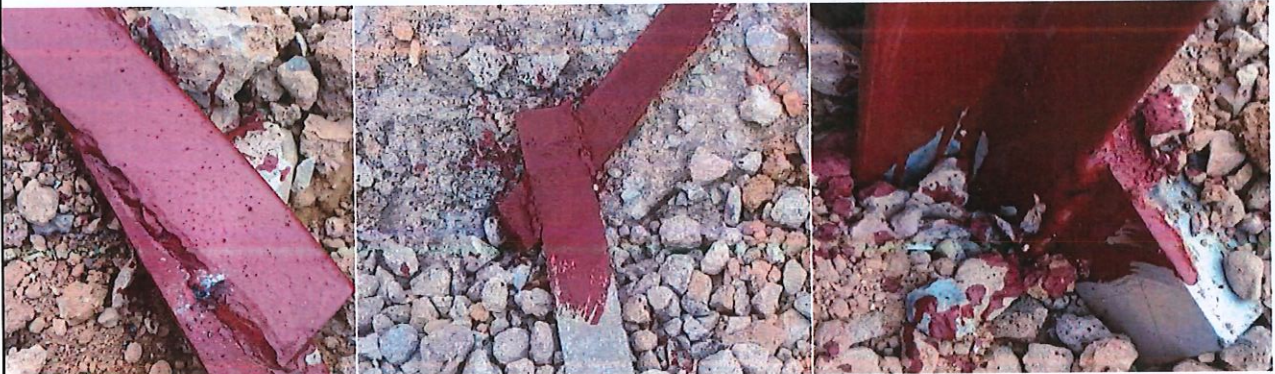

监理项目部（章）

专业监理工程师：\_\_\_\_\_

日

期：2025 年 03 月 11 日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部、监理项目部各存 1 份。
