

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-026

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于二期南大留、马坊、国庄施工质量安全事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理于 2024 年 1 月 10 日巡查发现:

1、现场巡视发现你单位施工的二期光伏区南大留段, 接地环网焊接完成后未报验我监理单位验收, 擅自回填。后续相关资料及验收我单位不予确认。

2、现场巡视发现二期马坊施工段发现桩头破损未按要求更换新桩基础, 使用砂浆修复。影响标高及整体结构性及美观, 现要求总包单位更换新基础。

3、现场巡视二期国庄围栏施工现场发现, 围栏基础深度与图纸不符, 混凝土未做冻湿保护。要求总包单位返工处理。

附件: 现场问题照片 3 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:

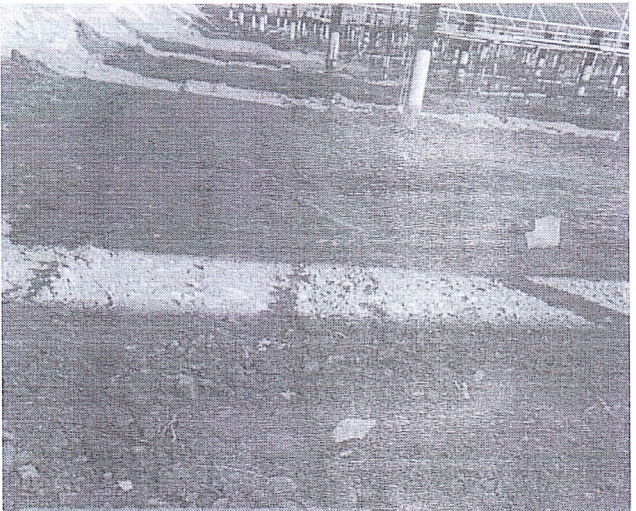
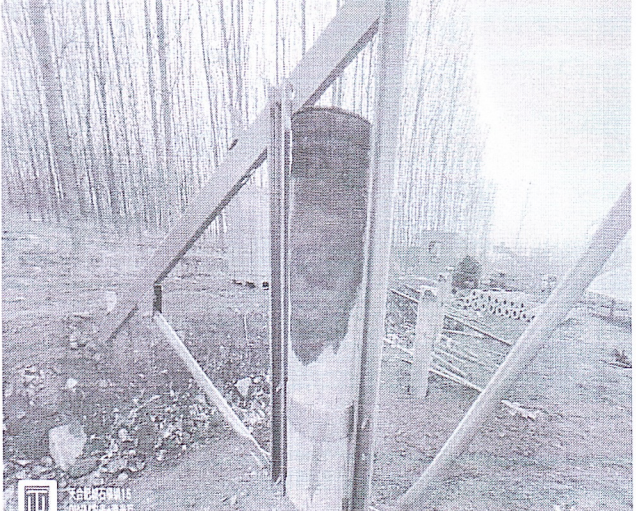
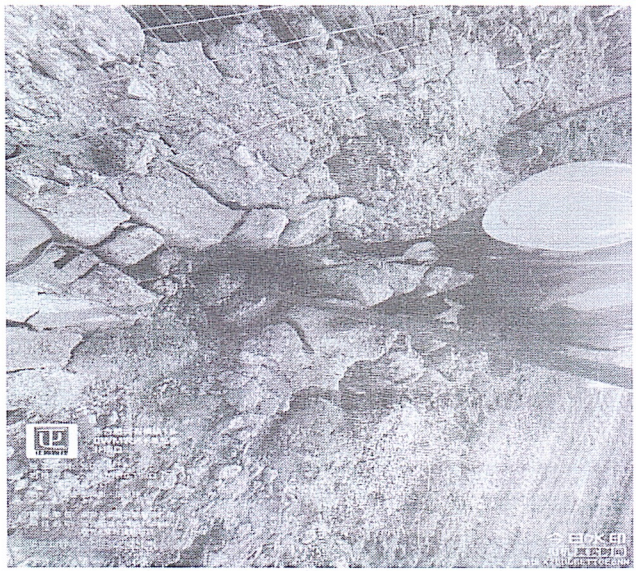
日

期: 2024 年 1 月 10 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片

 天合肥城石横镇 150MW农光+渔光互 补项目 施工区域: 光伏区二期南大留区域 施工内容: 接地网未报验已回填 拍摄时间: 2024.01.10 星期三 天气: 晴 -3°C 地点: 肥城市·004县道 今日水印 相机真实时间 880 CATLW3M2H4ALGH	 天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目 施工单位: 天合光伏 拍摄时间: 2024.01.10 星期三 天气: 晴 -3°C 地点: 肥城市·004县道 建设单位: 天合新能源有限公司 监理单位: 山东天合新能源有限公司 项目负责人: 王经理 联系电话: 13953000000 今日水印 相机真实时间 880 CATLW3M2H4ALGH
二期南大留接地环网未报验	二期马坊桩头不符合要求
 天合肥城石横镇150MW农光+渔光互补项目 施工单位: 天合光伏 拍摄时间: 2024.01.10 星期三 天气: 晴 -3°C 地点: 肥城市·004县道 建设单位: 天合新能源有限公司 监理单位: 山东天合新能源有限公司 项目负责人: 王经理 联系电话: 13953000000 今日水印 相机真实时间 880 CATLW3M2H4ALGH	
二期国庄围栏安装混凝土基础不符合要求	
