

监 理 通 知 单

工程名称: 天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) 编号: JL-A07-027

致: 常州天合智慧能源工程有限公司天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目 (二期 70 兆瓦) (EPC 总包项目部)

事由: 关于二期南大留、马坊、国庄施工质量安全事宜;

内容: 你单位承建的天合肥城石横镇 150 兆瓦农光+渔光互补项目, 监理于 2024 年 1 月 11 日巡查发现:

- 1、现场巡视发现你单位施工的二期光伏区马坊段, 桩头抱箍安装与图纸不符。要求返工处理。
- 2、现场巡视发现二期马坊施工段发现桩头未除锈, 前期不除锈后期抱箍安装完成后除锈困难。图纸要求除锈后做银灰色防锈底漆和面漆各一道, 干膜后度不小于 200 微米。除锈后报验我监理单位后刷底漆, 底漆刷完报验再刷面漆。

附件: 现场问题照片 2 张

对以上问题要求总包单位 72 小时内整改回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师:


日

期: 2024 年 1 月 11 日



注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

问题照片

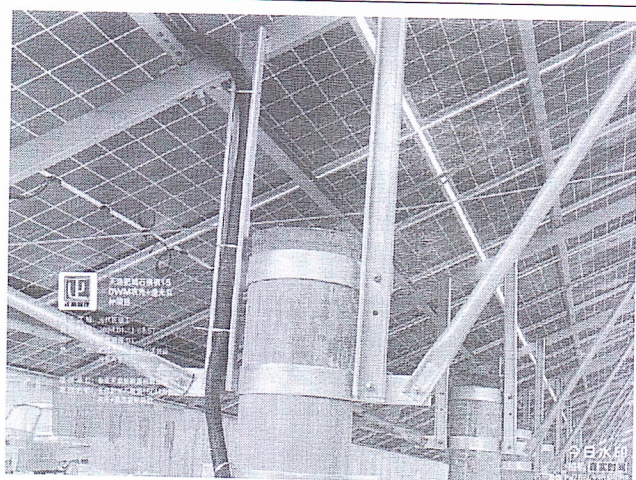

二期马坊桩头未除锈



二期马坊抱箍安装不符合要求
