

监理通知单

工程名称：广州市天润沐阳新能源有限公司 6.097MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TR-TZD-002

主送：福建永福电力设计股份有限公司

抄送：广州市天润沐阳新能源有限公司

内容：关于施工材料及资料相关事宜

经监理人员现场检查发现以下问题：

- 1、接地扁铁、底座、连接件镀锌层数值不符合要求，影响工程质量。
- 2、支架存在锈蚀、泛白、变形不符合要求，影响工程质量。
- 3、监理通知单 001 号文件下发至今未见回复。
- 4、开工数日未见施工蓝图、报审资料、施工进度等，严重影响工程进度。

问题照片详见附页

鉴于上述情况要求你单位对现场及时整改。1、不符合要求的材料不允许用于本项目，要求进行返厂处理。2、要求对下发监理通知单进行及时回复。3、要求出具施工蓝图及报审资料。根据上述所有问题更加为了项目能顺利开展，望你单位及时整改，待整改完成后报监理项目部检查验收合格后方可进入下道工序。如拒不整改、听之任之，我方将实施强制措施下发工程暂停令，所造成的损失由贵单位承担。

望贵单位重视！限两日内回复。

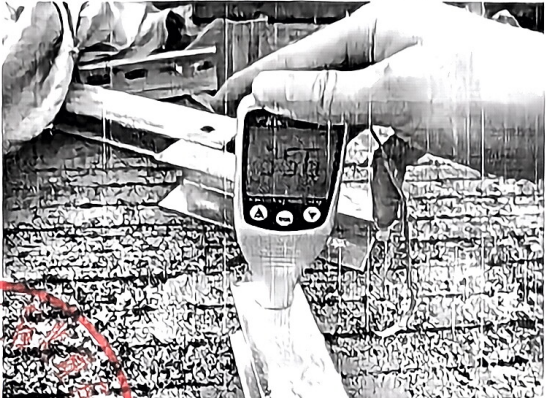
监理项目部（章）

总/专业监理工程师：王超

日期：2022年5月14日

本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

附页：问题照片

	
底座镀锌层不符合要求	连接件镀锌层不符合要求
	
接地扁铁泛白、镀锌层不符合要求	
