

监理通知单

工程名称：海南联生/联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLS/LR-JS-TZD-09

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联生新能源有限公司

海南联瑞新能源有限公司

主题：关于 2023.9.09~9.10 对琼中电站确户检查情况

内容：

2023 年 9 月 9 日至 9 月 10 日由国电项目部、监理项目部及总包项目部相关人员对各地区部分电站进行了确户检查，发现以下问题：

一、琼中确户检查 37 户，已安装逆变器、并网箱，1*4²直流线敷设 31 户，电气未施工 6 户，检查结果存在以下问题：

- 1、送出线固定不合格。
- 2、部分电站组件存在遮挡。
- 3、缺少接地点。
- 4、逆变器、配电箱接地不合格。
- 5、逆变器、配电箱固定不合格。
- 6、个别电站存在组件混装情况，需拆除不同型号组件。
- 7、缺少标识标牌。
- 8、缺少灭火器。
- 9、组件接地不合格。
- 10、组件插头未绑扎。
- 11、直流线部分未穿管。
- 12、部分电站并网箱开关较小。
- 13、个别电站螺栓未紧固。
- 14、线管未封堵。

以上问题总包项目部须举一反三对全部电站进行检查，并整改消缺，限期在电站并网前完成，望总包项目部重视并落实到位。

后附部分问题相片及确户检查记录

一、树木遮荫

二、农户炮楼对组件存在遮挡




三、线管固定不合格




四、线管未封堵




五、进线部分未穿管

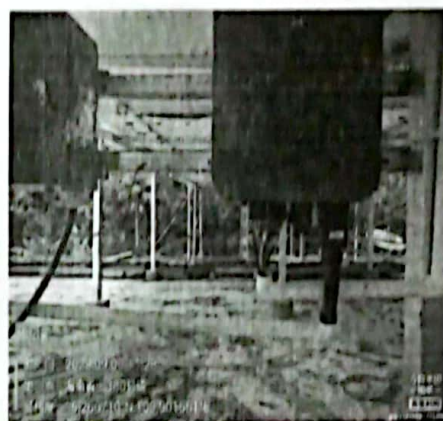

六、螺栓未紧固

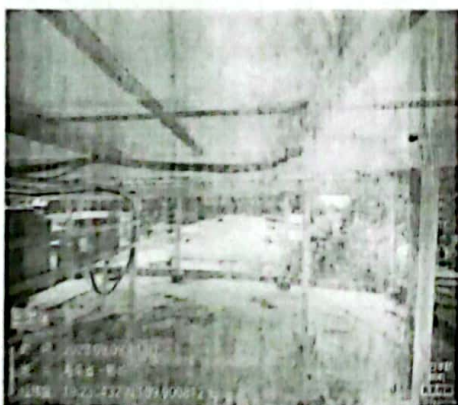

七、电缆固定不合格，墙面有磨损

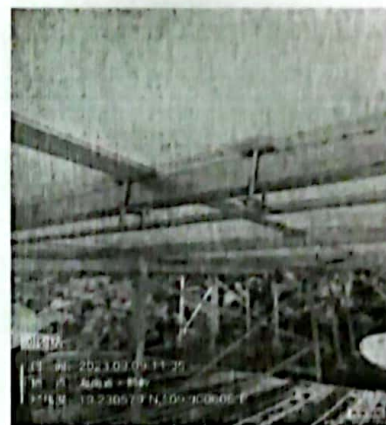

八、逆变器接地不合格



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。
