

监理通知单

工程名称：海南联生/联瑞分布式光伏发电项目

编号：HNLS/LR-JS-TZD-06

致：宁波联兴新能源科技有限公司

抄送：海南联生新能源有限公司


海南联瑞新能源有限公司

主题：关于 2023.7.23~7.27 对各地区部分电站安全检查情况


内容：

2023 年 7 月 23 日至 7 月 28 日由国电项目部、监理项目部及总包项目部相关人员对各地区部分电站进行了安全大检查，发现以下问题：

一、钟春阳：临高县调楼镇群道村委会新龙村北一巷 1 号，（联瑞）天合 550W 组件 40 块
1、无上屋面设施，对后期运维带了困难。

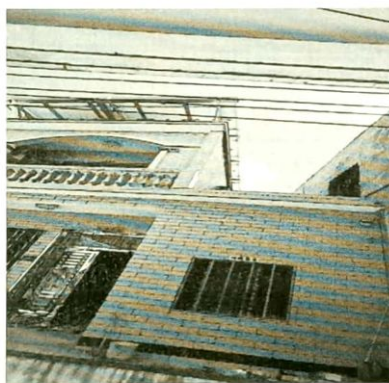

二、钟日东：临高县调楼镇群道村委会新龙村西一巷 65 号（联瑞）尚德组件 550W，48 块。
1、电气设备与支架固定不符合要求。
2、输出导线不能多股缠绕在瓷瓶上。
3、支架焊渣未处理，防腐不到位。

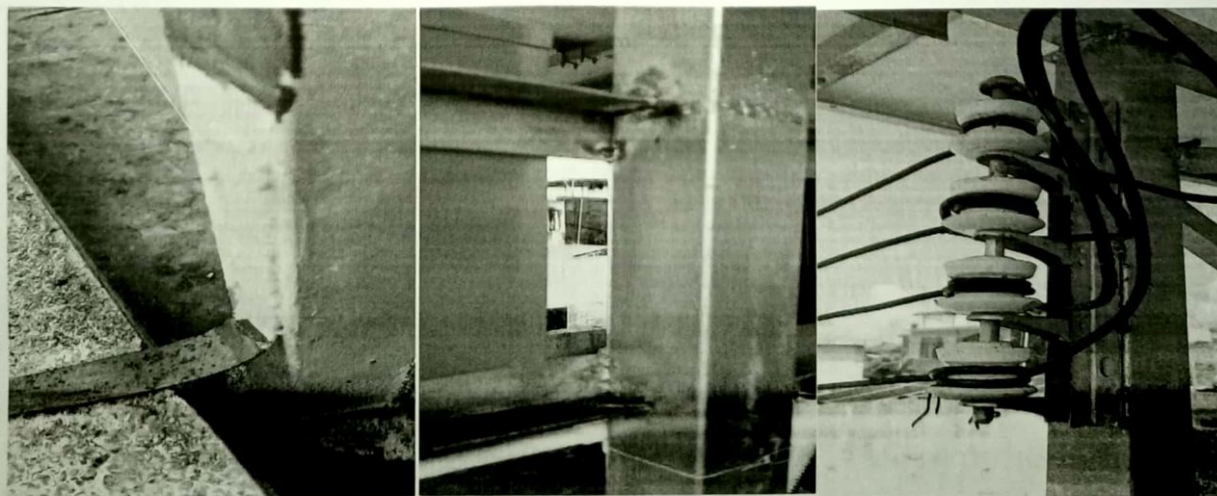


三、钟冠球：临高县调楼镇群道村委会寮道村东巷2号，（联瑞）尚德组件550W，55块。

- 1、设备接地一条接地线未与支架固定。
- 2、出线与瓷瓶绑扎不符合要求。
- 3、电气设备支架安装不水平，螺丝与支架固定不符合要求。



四、王盛奎：临高县调楼镇抱才村北路四巷62号，（联生）天合605W组件38块。

- 1、出线电缆未穿管，直接与支架棱角接触，存在安全隐患。
- 2、出线电缆未挂牌，1*4光伏线未见编码管。
- 3、电缆支架未与支架焊接，用自攻丝比符合要求。
- 4、输出电缆在水泥杆上缠绕多圈（会产生涡流）需整改。

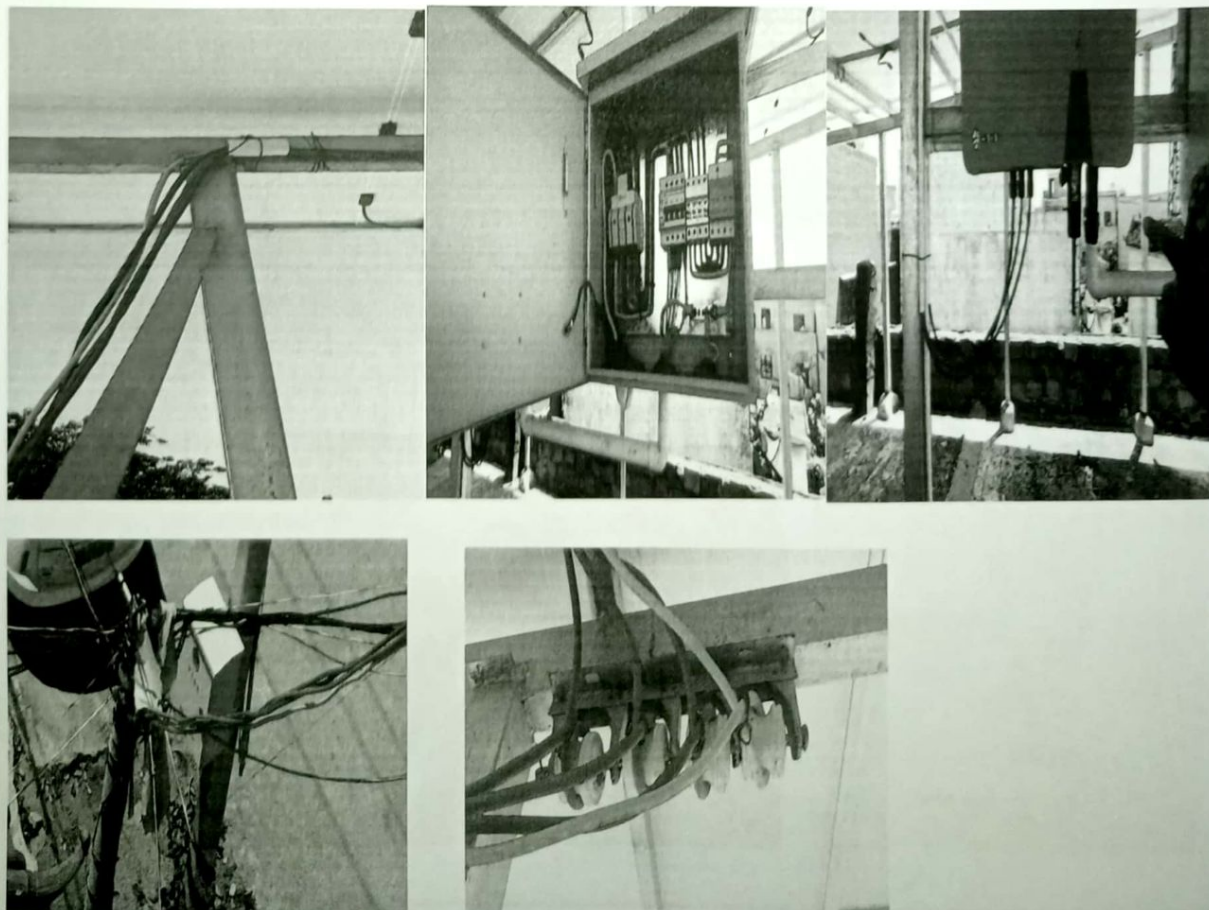


五、方不弯：临高县调楼镇抱才村南七路：（联生）天合组件 605W，32 块。

- 1、接地未做，电气设备与支架接地不规范。
- 2、电缆管用尼龙扎带绑扎（不符合要求。）
- 3、组件压块螺丝生锈。



六、王吉强：临高县波莲镇美山村支架基础施工。


- 1、电焊机未接地，用电线混圈在一起，不符合要求。
- 2、施工人员佩戴的安全帽不合格（非标）。

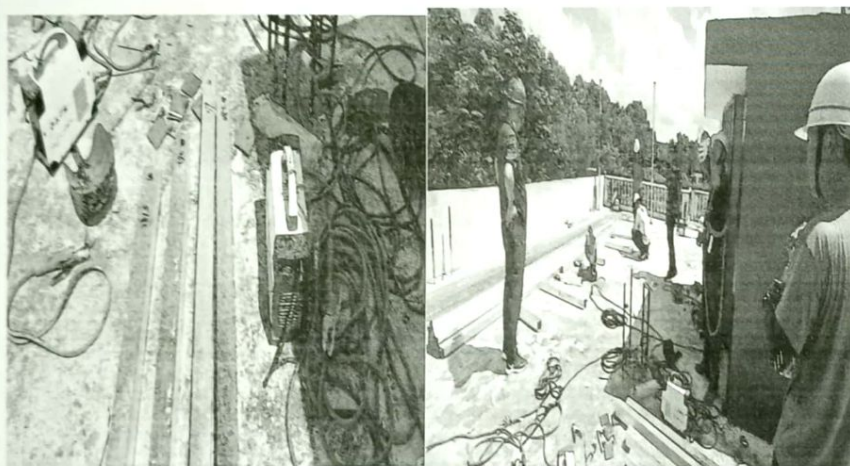

七、卞维锐：东方市小岭村：（联生）550W 尚德组件 45 块。

- 1、组件接地线未与支架连接。
- 2、接地扁铁生锈。
- 3、组件压扣压偏。
- 4、组件光伏线在组件卡扣处，未固定（存在安全隐患）。



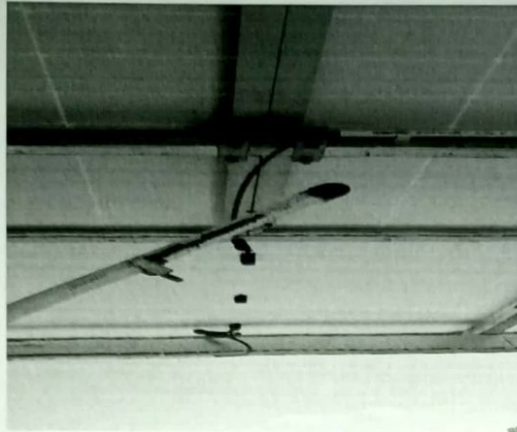

以上问题总包项目部须举一反三对全部电站进行检查，并整改消缺，限期 2023 年 8 月 15 日前完成，对无法完成的请作书面说明，望总包项目部重视并落实到位。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2023年07月



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



扫描全能王 创建
