

监理工程师通知单

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

编号：CZZH-CJ-TZ-001

致：山东电工电气集团有限公司 项目部

抄送：浙江爱越新能源有限公司 项目部

主题：关于同山镇同兴村光伏电站存在的缺陷事宜

内容：2023 年 2 月 9 日上午，监理项目部参加同山镇同兴村电站（已具备并网条件）供电局并网前检查，发现以下缺陷：

- 1、屋面组件安装上下两排方阵，安装不整齐偏差较大。
- 2、屋面接地环网引下线焊接搭接面积不符合规范要求，黄绿漆粉刷不符合要求。
- 3、个别屋面直流电缆下墙未使用桥架，采用 PVC 管，抱箍卡扣不是不锈钢材料。
- 4、设备接地线走线混乱，未进行固定。
- 5、逆变器雨棚未进行施工。

供电局要求：

- 1、并网柜内元器件排布需按要求进行调整，方便安装电表及电流互感器。
- 2、并网柜需采用双接地（箱体接地、浪涌接地单独接地）。
- 3、光伏屋面实际安装容量，不得超过备案容量。

针对以上问题，请贵单位收到通知后，10 日内按期限内组织施工班组对以上缺陷进行消缺整改。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：


本表一式 5 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

(1)




(2)



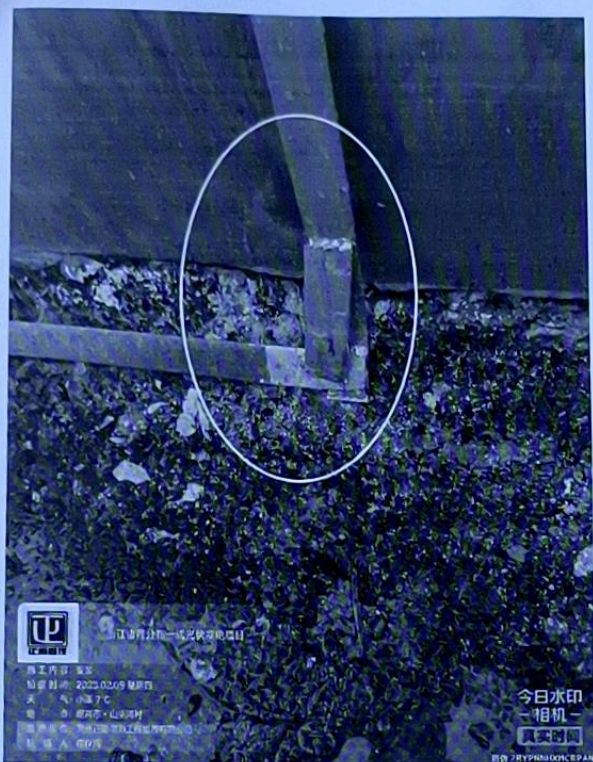

(3)

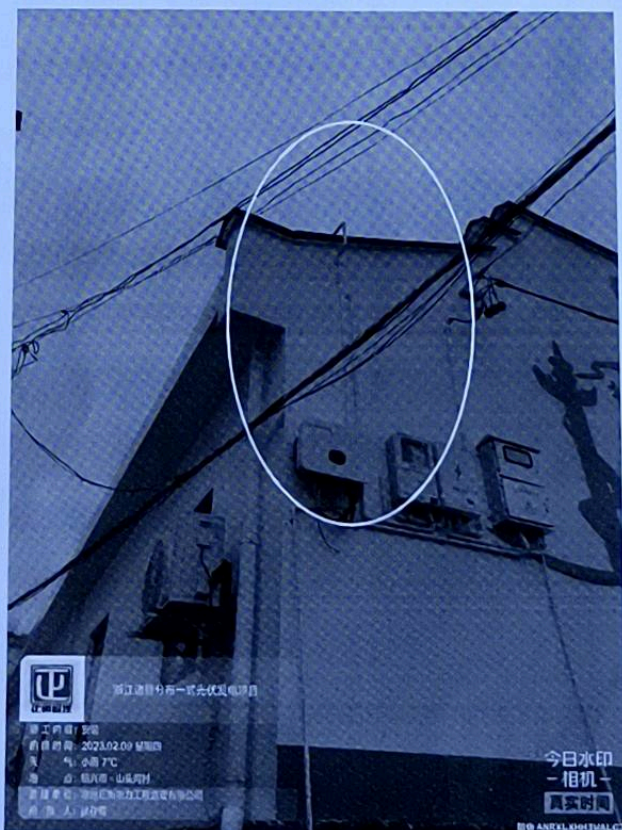

(5)





浙江温州乐清一德电气有限公司

地址: 乐清市
日期: 2023-02-09 星期四
时间: 中午 7:00
地点: 乐清市乐清市乐清市乐清市乐清市
备注: 乐清市乐清市乐清市乐清市乐清市
备注: 乐清市乐清市乐清市乐清市乐清市

今日水印
相机

水印相机
