

监 理 通 知 单

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

编号：JLTZD-YNSB-001

致： 安徽跨江电力有限公司 施工项目部

事由： 关于施工现场施工质量的问题

内容： 现场巡视发现如下施工质量问题：

- 1、中山村村委房顶支架各别螺丝生锈，螺丝未紧固；
- 2、支架斜拉撑有对接现象；
- 3、光伏电缆敷设凌乱关键部位未绑扎固定；
- 4、各别电缆裸漏位置未穿管；
- 5、组件与组件组件与支架未做接地；
- 6、逆变器箱体接地线及接地引下线不满足图纸设计要求；


附件： 监理通知单问题清单

监理项目部（章）


总/专业监理工程师： 贾建

日期： 2023 年 04 月 30 日


注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

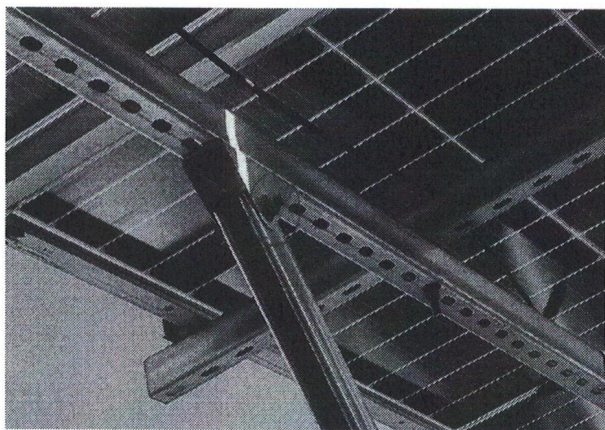


垫片生锈

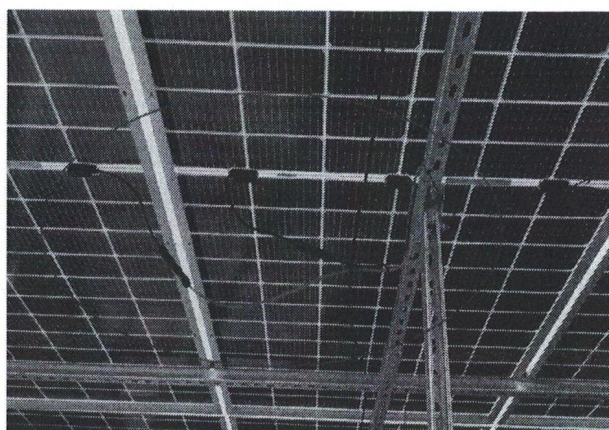

光伏电缆凌乱未绑扎固定

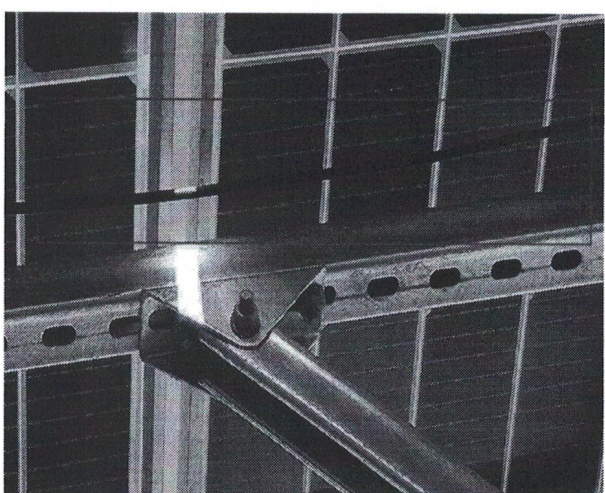

光伏电缆未穿管

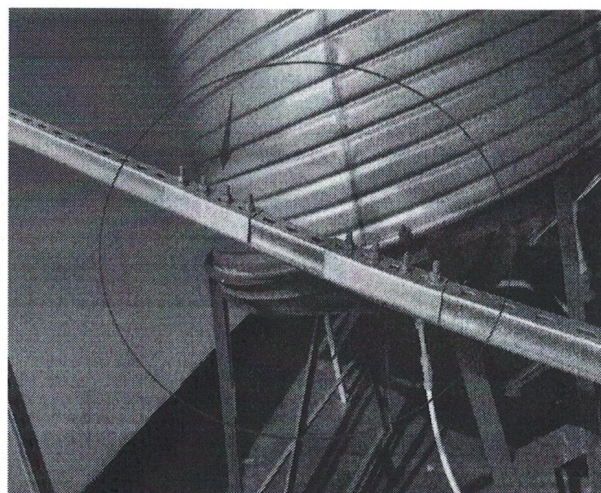

斜拉撑有接头



接地极不规范



箱体接地不规范
