

监理通知回复单

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司 0.38 万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：JLHF-ZHSW-001

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-ZHSW-001(通) 的监理通知后，已按要求完成了工作，现报上，请予以复查。

- 详细内容：1、屋面采光带已全部铺设防护网及警示彩旗。
2、现场施工人员已按要求使用双钩安全带。
3、屋面临边防护施工时已按要求安装安全钢带对人员进行防护。
4、每日站班会安全交底内容已按要求对施工人员进行安全教育。

附件：



监理项目部复查意见：

经审查，已按要求整改完成。




注 本表一式____份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存____份。



扫描全能王 创建



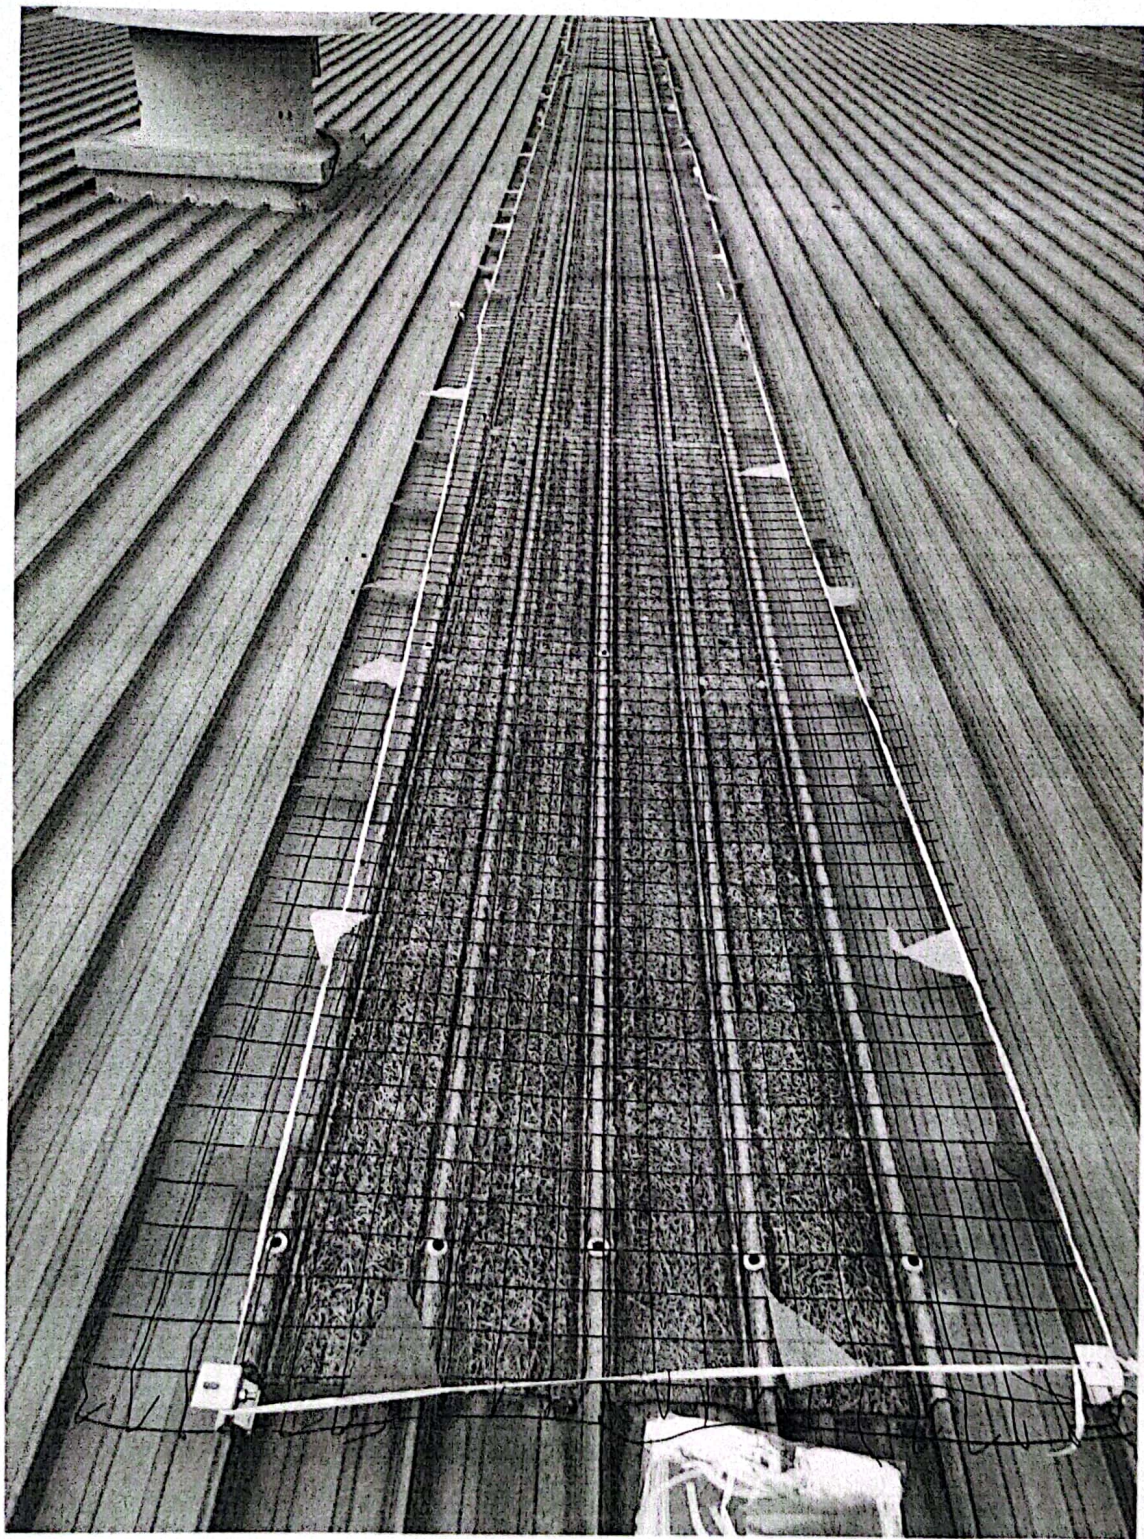



每日安全交底单

编号: AQJD-ZHSW-

工程名称	上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目	工程编号	
日期	2023年5月12日	工作地点	上海中华商务联合印刷有限公司
工作负责人	王明	工作任务	临边防护、防水施工
检查工作班成员个人防护用品是否齐全（手指口述）		☒ 是 ☐ 否	

安全技术交底内容（在作业安全风险控制卡中选取序号）

序号	作业类型（或作业步骤）	可能存在的危害或风险	风险预防和控制措施	执行情况（√）
1	☒ 高处作业	高处坠落	1、登高作业前不得饮酒，并测量血压状况良好；2、屋顶作业无女儿墙或女儿墙相对高度低于800的必须做好临边防护措施；3、屋而与天沟临边处拉好红百警示带；4、上下爬笼必须使用防坠器、安全带，且一次只能一人上下；5、严禁使用不合格的安全绳、安全带、防坠器；6、安全带应挂在结实牢固的构件上或安全绳上，安全带要高挂低用；7、高处作业需要移动或攀爬时，双钩交替挂在牢固的构件上；8、屋顶彩钢板周围做有效硬隔离，严禁踩踏、跨越采光板。	✓
		机械伤害	1、保持清醒，注意周边环境不要边走路边打手机，边看工作票、图纸、作业指导书等。上下楼梯拿重物尽量手扶栏杆。防护装备齐全，正确穿戴工作鞋服、安全帽、反光背心。	
		起重伤害	1、搬运时，须由专人监护、指挥。搬运时，注意柜体四周都要受力均匀，防止倾倒。必要时，请专业起重人员协助；	

技术交底（根据工作实际情况细化）	(1) 交代临时电源使用要求 使用电源盘检查外观无破损并做好防护措施，且在有效期内，漏电保护器检查动作可靠 (2) 交代工作现场周围环境情况（包括建造结构、施工情况并坑孔洞、高处和交叉作业、危化品等危险源情况等）做好防坠落、防起重伤害措施，正确使用安全带 (3) 交代设计、施工方面的特殊要求 严格按照图纸施工 (4) 交代地下设施情况（包括水、电、气、汽、油、通信等布置情况）确认地下管件布置线
------------------	--



扫描全能王 创建

路，挖机开挖前人工开挖出剖面确认管线位置 (5) 其他： <u>做好环境保护</u>					
应急处置		(1) 交代现场发生人身安全事件的应急处置 立即停工，汇报上级领导，启动急救措施； (2) 交代现场发生设备安全事件的应急处置 立即停工，汇报上级领导，组织抢救工作； (3) 交代发生其他安全事件，施工现场应急处置 立即停工，汇报上级领导，保护作业现场； 联系人：魏巍 电话：15716176663			
补充或变更安全措施（根据实际情况填写，若无，请划掉）					
离场人员姓名	离场时间	工作负责人签名	新增人员姓名	入场时间	工作负责人签名
已清楚工作内容、工作风险，了解安全措施、注意事项和应急处置。 工作班成员签名： <u>李龙 罗时强 杨震 罗时强</u>					
交底抽问： <u>是否饮酒上岗，现场新编制试验检查，无饮酒</u> 抽问内容： <u>动火作业，防水作业需水，动火工作票是否已开具。已开具</u> 评价： <u>合格</u> （合格/不合格） 被抽问人签名： <u>罗时强</u>					

