

监理工程师通知单


工程名称：盛旺汽车零部件（昆山）有限公司 5.99MW 屋顶分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SW-TZD-008

主 送：苏州亚睿光伏科技有限公司

抄 送：中鑫上电（苏州）能源科技有限公司

内 容：B 栋组件支架不符合设计文件要求的整改通知

2023 年 9 月 11 日，监理巡视检查你部施工的 B 栋组件支架安装，发现你部安装的导轨内间距不一，图纸要求为 45.2cm，而现场抽测得最小值为 35.5cm，最大值为 56.0cm 等，并抽查多块组件处导轨间距，均存在同样问题，抽查安装质量不合格，要求全部按设计图纸整改。

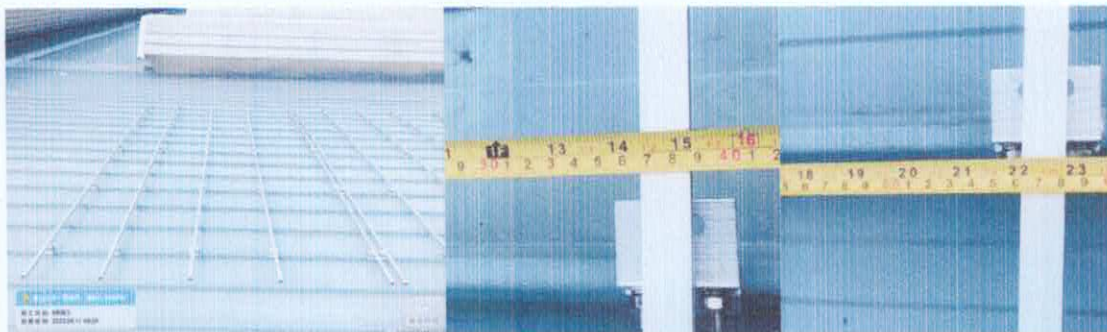

现要求你部对以上问题完成整改，举一反三，做好质量管理工作。未按要求整改完成的，将给予相应考核。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后附照片回复本通知单

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日 期：

