

## 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

### 监理工程师通知单


编号: ZHJL-JLTZ-PL-014

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

主题: 质量

内容: 经监理、业主在西沟地块光伏场区巡视, 发现 1~3#地块仍存在如下质量问题 (且以前已出现过类似质量问题):

- 1、该区域未引孔达到设计深度, 擅自把 2700 桩长截短。
- 2、引孔未能达到设计深度原因, 未通知监理、总包相关人员现场见证, 亦未见以书面形式报给业主、监理、总包, 就擅自砼浇筑。

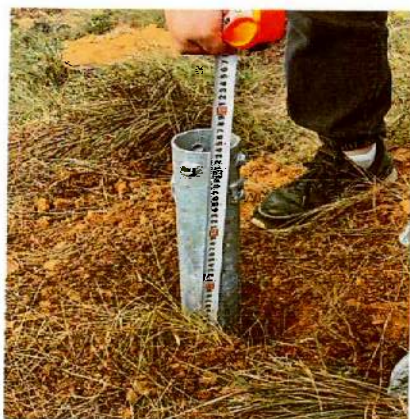

要求砼立即停止浇筑待整改完成报验监理并验收合格后方可施工。限 5 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构（章）

专业监理工程师： 张永军

总监理工程师： 吕文祥

日 期： 2023/10/12



填报说明：本表一式 2 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
