

平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-21

致: 上海电力安装第一工程有限公司



主题: 关于西沟区域 1#2#3#方阵光伏支架安装质量问题;


内容: 2023 年 11 月 19 日, 监理检查西沟区域光伏支架安装, 经检查发现问题如下:

1. 部分立柱垂直度偏差较大。
2. 多组斜梁安装端部不齐。
3. 个别斜梁角度偏差超过规范要求正负 1 度。
4. 个别螺栓安装不牢固。

上述问题, 要求贵单位对施工质量, 引起高度重视, 加大自检力度, 在安装檩条前, 必须将该问题在 2 日内整改完成, 否则不得进入下道工序施工。

见下图:

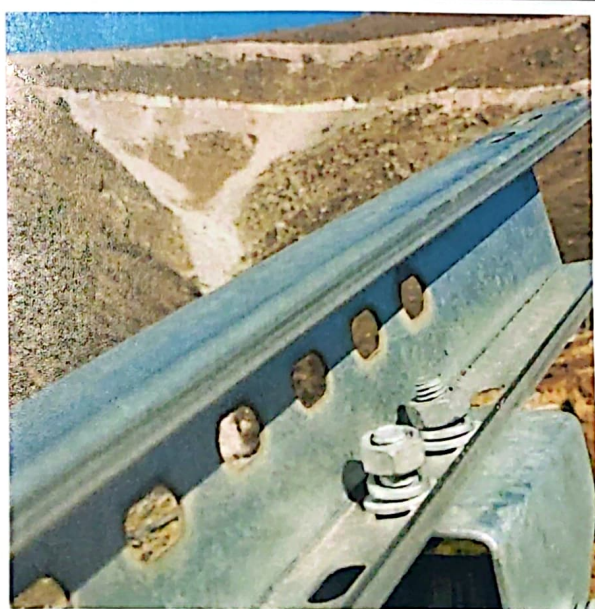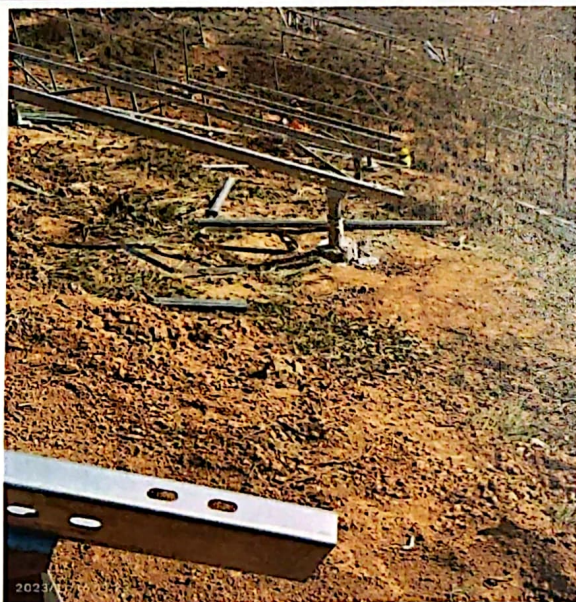

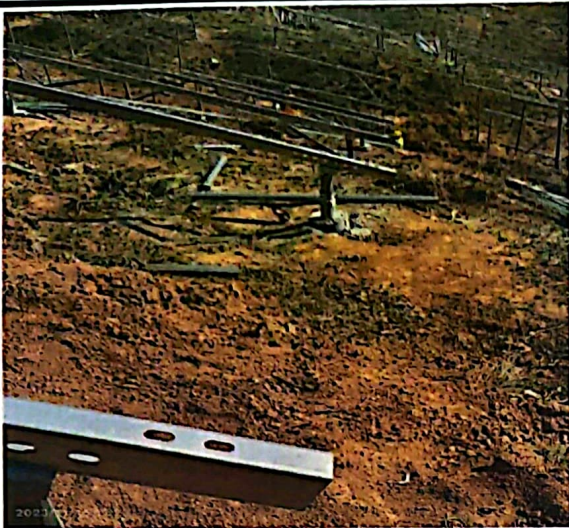

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。



项目监理机构：(章)县100MW

专业监理工程师： 李辉

总监理工程师： 高立松

日 期： 2023.11.21

填报说明：本表一式 二 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。
