


平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: ZHJL-JLTZ-PL-024

致: 上海电力安装第一工程有限公司平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目 (单位)

东郑光伏场区 17#方陈东坡区域支架未经监理验收就擅自进行组件安装,现要求你们暂停该区域组件安装,通过监理验收合格后方可组件安装。(见下图)

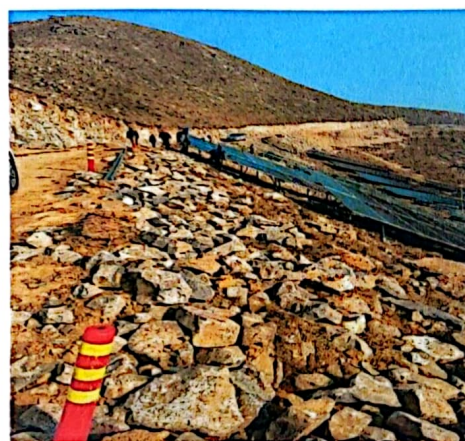

限 2 天内整改完成并回复监理项目部。

项目监理机构 (章)

专业监理工程师: 李江

总监理工程师: 高文斌

日期: 2023/12/28

填报说明: 本表一式 2 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。
